



PT PLN (PERSERO) UIP KALBAGBAR
Jl. Letjend Suprpto No. 50 G, Pontianak
Kalimantan Barat

Project Implementation Strengthening West Kalimantan Power Grid

Social Monitoring



Semi Annual Report July — December 2019

ADB Loan No: 3015·INO
AFD Loan No: CID 1024 01 B

Submitted by:
PT PLN (Persero)

January 2020

Abbreviations

ADB	Asian Development Bank
AFD	Agence Francaise de Développement
AP	Affected Person
BPHP	<i>Balai Pengelolaan Hutan Produksi</i> (Production Forest Management Center)
BPDAS	<i>Balai Pengelola Daerah Aliran Air</i> (Watershed Management Center)
BPKP	<i>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</i> (Financial and Development Supervisory Board)
BPN	<i>Badan Pertanahan Nasional</i> (National Land Agency)
DIR DASHL	<i>Direktorat Derah Aliran Sungai dan Hutan Lindung</i> (Directorate of Watershed and Protected Forest)
EMA	External Monitoring Agency
FGD	Focus Group Discussions
HH	Household
IDR, Rp.	Indonesian Rupiah
IOL	Inventor- Of-Losses
IMA	Internal Monitoring Agency
IP	Indigenous People
IR	Involuntary Resettlement
IRRP	Income Restoration and Rehabilitation Program
LAC	Land Acquisition Committee
MUSPIKA	<i>Musyawarah Pimpinan Kecamatan</i> (Board of Sub-district Government Leaders)
OPGW	Optical Ground wire
OAC	Operational Acceptance Certificate
PBHTP	<i>Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i> (Cost for the Acquisition of the right Land and/or Buildings)
PEA	Project Executing Agency
PIC	Project Implementation Consultant
PLN	<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i> (State Owned Electricity Enterprise)
PPLH	Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
RCCP	Resettlement Customary Communities Plan
RCCDP	Resettlement Customary Communities Development Plan
ROW	Right-Of-Way
SKAI	<i>Surat Keputusan Anggaran Investasi</i> (Investement Budget Decree)
SKOM	<i>Satuan Komunikasi</i> (Communication Unit)
SS	Substation
T, T.	Tower
TL	Transmission Line
TOR	Terms of Reference
UPK	<i>Unit Pembangunan Konstruksi</i> (Construction Development Unit)
UIP	<i>Unit Induk Pembangkitan</i> (Central/ Generating Unit)
UPP	<i>Unit Pelaksana Proyek</i> (Project Implementation Unit)

Weights and Measures

ha	hectare
kg	kilogram
km	kilometer
kV	kilovolt
m	meter
m ²	square meter

NOTE

This social monitoring report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Table of Contents

Abbreviations	ii
Table of Contents.....	v
Summary	ix
1. Introduction.....	1
1.1 Introduction of Project and Basic Data	1
1.2 Project Scope	1
1.3 Project Location	2
1.4 Project Administration	4
2. Resettlement, Community Customary and Social Issues	5
2.1 General Description	5
2.2 Contractors construction activities for transmission lines and substations	6
3. RCCDP and RCCP Implementation Progress.....	10
3.1 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL and Bengkayang Substation	10
3.2 150 kV Bengkayang-Ngabang-Tayan TL and Ngabang – Tayan Substations	15
3.3 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL and Sanggau - Sekadau Substations	22
3.4 Funds Availability and Sourcing and Limitations to RCCP Implementation	33
3.5 Inclusion number of Affected People and their Asset	34
4. Awareness Services of PIC.....	36
5. Social Issue and Mitigation	40
6. Electricity distribution program under Grant measures	53
7. Indigenous People/Custom Community in Project Location	56
8. Actions and Strategies Developed to Improve the Project Social	58

APPENDICES

- Appendix 1 Project Organization Charts
- Appendix 2 Submission Letter of Revised IMA
- Appendix 3 Vulnerable Affected People List in the Corridor of the 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL
- Appendix 4 Coordination Meeting related to CSR Package 1: 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL
- Appendix 5 CSR Bengkayang Report
- Appendix 6 Coordination Meeting related to IRRP of Payment Gap in 275 kV Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line
- Appendix 7 Vulnerable and Severely APs in the Corridor of 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL
- Appendix 8 Forrest Land Use Permit for Packages 1 – 4
- Appendix 9 Monitoring of IPPKH
- Appendix 10 Land Certification Update for Packages 1 – 7
- Appendix 11 Time Schedule of Land Certification in Packages 3, 6 and 7
- Appendix 12 List of Vulnerable and severely AP in the Corridor of 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line
- Appendix 13 Socialization Acknowledgment related to Land Acquisition in Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line
- Appendix 14 Leaflet Distribution of Packages 6 and 7
- Appendix 15 Leaflet of 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line
- Appendix 16 Decree Letter of Bupati Sanggau about Location Assignment Permission for 150 kV Sanggau Substation
- Appendix 17 Decree Letter of Bupati Sekadau about Location Assignment Permission for 150 kV Sekadau Substation
- Appendix 18 Decree Letter of Bupati Sanggau for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau
- Appendix 19 Permit from Territory Hall of Forest Area for Packages 5 – 7
- Appendix 20 Documentation of Grievance Handling in Tayan – Sanggau - Sekadau
- Appendix 21 CSR Tayan – Sanggau – Sekadau Coordination Meeting
- Appendix 22 Acknowledgement of Catfish Farming
- Appendix 23 Inventory of Loses in packages 1 – 7
- Appendix 24 Ngudas ceremony Documentations

List of Map

Map 1 Map of West Kalimantan Power Grid Strengthening Project

List of Figures

Figure 1 Project Grievance and Redress Mechanism

Figure 2 Affected Land Tayan – Sanggau Sekadau Chart

Figure 3 Tayan – Sanggau Sekadau APs Compensation Satisfaction Chart

Figure 4 Tayan – Sanggau Sekadau APs Compensation Use

List of Tables

Table 1 Summary of subprojects – Description by Region and Corresponding Social Safeguard Document

Table 2 The Total Number of Worker for Packages 5, 6 and 7

Table 3 CSR Beneficiaries List in Bengkayang – Jagoibabang TL

Table 4 Counseling by Social Services to CSR Beneficiaries in Package 1

Table 5 Detail Program of for CSR related to Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line

Table 6 Beneficiaries list of Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line CSR segregate by gender

Table 7 Measurement/ indicators of Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line

Table 8 List of ROW Socialization in 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL

Table 9 Status of Required Actions and Commitments Implementation based on Forestry Area Permit

Table 10 CSR Monitoring Progress ROW for 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL

Table 11 CSR Program Beneficiaries for Bengkayang – Ngabang – Tayan TL

Table 12 Severely Affected People on Sanggau – Sekadau Substations

Table 13 Severely and Vulnerable APs in Tayan – Sanggau – Sekadau

Table 14 Socializations of Land Acquisition for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line

Table 15 List of ROW Socialization in 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau

Table 16 Affected Asset Acquired for Sanggau and Sekadau Substation

Table 17 Summary of Affected Land for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL up to December 2019

Table 18 Summary of ROW for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL up to December 2019

Table 19 Social Issues to be settled in Sanggau – Sekadau TL (Package 7)

Table 20 detail of beneficiaries of Catfish Farming CSR Program

Table 21 Measurement/ indicators of the Catfish Farming CSR program

Table 22 The Cost of Resettlement for the Tayan-Sanggau-Sekadau up to December 2019

Table 23 Summary of Affected People and Their Asset

Table 24 List of Social Issues found at Site and Mitigation

Table 25 List of Social Issues Action and Status

Table 26 Project Policy Principles

Table 27 Entitlement Matrix

Table 28 Data Grant 3054-INO: Strengthening West Kalimantan Power Grid Project

Table 29 Key Timelines Associated with Social Safeguards Imperatives for all Packages

Summary

The 2nd semester of 2019 Social monitoring report shows the progress of land acquisition, social and vulnerability issues for package 1 to 7 conducted by the PLN West Kalimantan Power Grid Strengthening Project for the period of July to December 2019. Since December 2019, package 1 to 4 already finished. Package 5, 6 and 7 are still in the construction phase. The completion of ongoing packages has been extended and expected to be finished on December 2019.

UIP Kalbagtim has implemented the IRRP in 275 kV Bengkayang-Jagoibabang TL related to the changing of payment criteria for ROW. The IRRP has been started on 12 April 2019, by conducting agricultural, livestock and handy craft and food processing education and training for the CSR beneficiaries. The program has been completed and the stand alone report is available.

UIP Kalbagbar delivered compensation payments and ROW clearance in Package 3. The IRRP were implemented for Packages 3 and 4. The Capital Investment Coordinating Board had issued the permit for the forestry area of Bengkayang – Jagoibabang and Bengkayang – Ngabang – Tayan Transmission Line on 16 January 2017. The remaining action needed to fulfill the requirement, for instance, to carry out reclamation and re-vegetation in the forest area; to maintain the border area; to secure the forest protected area; to coordinate environmental activities and forest utilization and also to empower communities around the permitted area. The overall fulfillment progress achieved up to 40% on January 2020.

Land ownership of Bengkayang – Jagoibabang has not been proceeded yet due to the re-organizational change within PLN. For Bengkayang – Ngabang - Tayan transmission, a total of 4 (1.4%) land certificates were issued, which of 21 (7.5%) are still in the measurement process. The remaining 254 tower sites (91%) were not processed yet.

Land acquisition was completed for all sections in Tayan – Sekadau – Sanggau, but 1. The remaining tower T.24 has been pending and waiting for the execution letter issued by the local court.

Up to this period, 28 (22.40%) of land certificates have been issued in Tayan – Sanggau and 13 (13.40%) is still being processed by National Land Agency (BPN) in Sekadau District. The rest of 84 (67.20%) certificates have not been processed yet. In Sanggau District, there are 9 of 235 (3.83%) locations in the process. The rest of the 266 (96.17%) certificates were not processed yet.

The progress of ROW clearance has reached 99.57% for Package 6 targeted to be complete by December 2019 and 95.97% for Package 7 targeted to be complete by January 2020. Several obstacles were encountered during this process. Therefore, the team needs additional time to complete the work, which is scheduled up to December 2019.

IRRP for Tayan – Sanggau – Sekadau first batches was already delivered and monitored. Therefore, for the next batch, IRRP will be implemented in the form of catfish farming. The program has been conducted simultaneously from September to October 2019.

Cultural ceremony (Ngudas) before construction commencement had been carried out by the contractor for each affected village. It was participated by customary leaders, AHs, communities, and village staff. The entire requirement in social safeguard needs to be implemented as stated in Aide Memoire of Loan Review Mission 18 October to 1 November 2019 (intermittent).

1. Introduction

1.1 Introduction of Project and Basic Data

The Government of the Republic of Indonesia has signed loan agreements with the Asian Development Bank (ADB) and the Agence Francaise de Développement (AFD) in the amount of US\$ 49.5 million each to enable PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to execute the construction of 82 km for 275 kV transmission line from the border with Sarawak in East Malaysia to Bengkayang in West Kalimantan, Indonesia, 275/150 kV substation at Bengkayang, 145 km for 150 kV transmission line from Bengkayang to Ngabang and Tayan, 150/20 kV substation at Ngabang and extension of 150/120 kV Tayan substation. Construction works for the 125 km of 275 kV Interconnector were completed on the Sarawak side in October 2015, and for the first circuit of West Kalimantan side was on 30 December 2015; the second circuit was completed on 23 March 2016. The first circuit of the 275 kV Interconnector and Bengkayang substation was energized on 20 January 2016, and the second circuit was energized on 19 May 2016. Since the beginning of the power imports, 50 to 100 MW of electricity is produced by hydropower plants in neighboring Sarawak at a much lower cost than the one generated by PLN's diesel and oil-fired power plants in West Kalimantan. The import of electricity is scheduled to increase during peak load periods up to 230 MW. The signed power exchange agreement allows power trade between West Kalimantan and Sarawak for 20 years.

Due to the remaining loan, it was decided to add 3 more packages of work including construction of 150/20 kV substations in Sanggau and Sekadau, 150 kV Tayan – Sanggau transmission lines and 150 kV Sanggau – Sekadau transmission lines. The 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau has been built as an extension of West Kalimantan Power Grid Strengthening Project (275 kV Jagoibabang – Bengkayang transmission line and 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan transmission line).

PT PLN (Persero) has assigned PT PLN (Persero) PUSMANPRO to carry out the monitoring of resettlement and community development with regard to compliance to the Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) for the 275 kV transmission line and associated substation. PUSMANPRO was also assigned to execute Resettlement Customary Communities Plan (RCCP) for the 150 kV transmission line and associated substation.

The present report shows the progress of land acquisition, social and vulnerability issues during the construction for the period from 1 July 2019 to 31 December 2019.

1.2 Project Scope

The project comprises design, supply, and installation, testing, and commissioning of the following works and associated Substations in West Kalimantan Strengthening Project. The project is divided into seven packages that can be seen in Table 1.

Table 1 Summary of subprojects – Description by Region and Corresponding Social Safeguard Document

Package No	Project Name	Length/ Width	District	Type of Works	Safeguard Document
1	275 kV TL Bengkayang to Jagoibabang	201 towers, 81.374 km	Bengkayang	Construction double transmission line between Bengkayang and Sarawak, East Malaysia	Updated RCCDP August 2013
2	275/150 kV Bengkayang SS		Bengkayang	Construction of the substation	Updated RCCDP August 2013
3	150 kV TL Bengkayang- Ngabang- Tayan	407 towers, 142.462 km	Bengkayang Landak	Construction of towers, foundation, and erection tower	Updated RCCP March 2014
4	150 kV Ngabang and Ext. Tayan SS		Landak	Construction of transmission line	Updated RCCP March 2014
5	Tayan ext, Sanggau and Sekadau SS	2.2 ha 2.4 ha	Sanggau Sekadau	Construction of substation	Updated RCCP September 2018
6	150 kV TL TL Tayan-Sanggau	235 towers 77.688 km	Sanggau	Construction of transmission line	Updated RCCP September 2018
7	150 kV TL TL Sanggau-Sekadau	125 towers	Sanggau Sekadau	Construction of transmission line	Updated RCCP September 2018

1.3 Project Location

The project is located on the Indonesian part of Borneo Island in West Kalimantan covering four districts, i.e. Bengkayang, Landak, Sanggau, and Sekadau. The West Kalimantan Power Grid Strengthening Project is presented in Map 1.

Map 1. Map of West Kalimantan Power Grid Strengthening Project



The location of the project sites of the all packages

Source: PLN

1.4 Project Administration

The re-organization of PLN resulted in changes of PLN's project administration. The implementation of the project now is managed by PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP Kalbagbar). It is located in the offices of PLN in Pontianak (formerly UIP X in Balikpapan) and Unit Pelaksana Proyek Kiting KALBAGBAR 3 (UPP KBB 3) at PLN's site office in Singkawang (formerly UPK 5 in Bengkayang). This unit is providing the construction for package 1 (Bengkayang – Jagoibabang TL), package 2 (Bengkayang Substation), package 3 (Bengkayang – Ngabang – Tayan TL), and package 4 (Ngabang and Extension Tayan Substations).

Due to the remaining loan, it was decided to use it by adding 3 more packages of work including construction. The project implementation was managed by UIP Kalbagbar and Unit Pelaksana Proyek Kalbagbar 2 (UPP KBB 2). It is located in Sintang. UIP provided monitoring of land acquisition progress and construction for package 5 to 7 (Tayan-Sanggau–Sekadau transmission line and Sanggau - Sekadau Substations).The organization charts of PLN UIP KBB, UPP KBB 2 and UPP KBB 3 are shown in Appendix 1. PLN is supported by the Project Implementation Consultant (PIC) whose organization chart is also shown in Appendix 1.

Social and vulnerability issues was carried out by the PIC's Social and Resettlement Specialist, in cooperation with PLN and the contractors to ensure that accurate data were provided, and that social issues were properly resolved under consideration of local customs.

2. Resettlement, Community Customary and Social Issues

2.1 General Description

For the period July to December 2019, this report described the social aspects of the implementation progress of the West Kalimantan Power Grid Strengthening Project. This report includes: a) an update of land acquisition implementation by PT PLN (Persero) UPP KBB 2 based on the approved updated RCCP document of 150 kV Transmission Line Project; b) a compilation of Social Issues emerged from the land acquisition and resettlement implementation as well as the ones developed during civil works implementation and how those have been mitigated; c) progress of Capacity Building services provided by PT PLN (Persero) Pusmanpro to PLN and contractors; and d) action plan to further improved project implementation and monitoring to meet the project policy and compliance with RCCDP and RCCP.

PT PLN (Persero) as the Project Executing Agency is responsible for the implementation of the land acquisition and resettlement plan, i.e. Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) for 275 kV Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line and Resettlement Transmission Line, and 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line. The associated substations are also covered in the RCCDP and RCCP.

PLN has established an internal land acquisition committee (LAC) under PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP Kalbagbar) and Unit Pelaksana Proyek Kitring KALBAGBAR 2 (UPP KBB 2) to acquire land for tower sites of the Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line and associated substations. This internal land acquisition committee has been tasked to conduct inventory of losses for the Right-of-Way (ROW) of the 150 kV transmission line corridors, i.e. to identify trees and assets affected by the construction works, to socialize the affected asset and the procedures of grievance, and to compensate landowners for loss of land, trees, plants and assets.

The potential impact of the transmission lines construction concerns temporary access roads, permanent land acquisition, dispute lands and restricted use of land, and clearance of trees within the ROW corridor. The construction of the transmission line also has positive impacts on the landowners and communities located near the project area such as:

- 1) Affected households receive cash compensation payments which can be used for reinvestment and daily needs;
- 2) Job opportunities for the local people during land clearing and civil works as well as in the period of construction depending on the individual's capabilities;
- 3) Opportunity for local entrepreneurs to supply building materials and other services during construction and post-construction e.g. maintenance.

Implementation of the Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) for the 275 kV Bengkayang - Jagoibabang Transmission Line and Resettlement Customary Communities Plan (RCCP) for the 150 kV Bengkayang - Ngabang - Tayan Transmission Line including the associated substations requires monitoring. PLN UIP KALBAGTIM (formerly as UIP X) has awarded a contract for monitoring the implementation of RCCDP and RCCP to the independent monitoring agency (IMA), PT. Data Persada Consultant. The IMA provides external (independent) monitoring reports to PLN UIP Kalbagbar and PLN Head Office/PT PLN (Persero) to follow up any actions required to minimize the negative impacts of the RCCDP and RCCP implementation. The draft of the IMA report was issued in April 2015 and the Final Report was

submitted to PLN in September 2015.

At the beginning of 2017, IMA has started to conduct second monitoring that focused on area along the corridor of ROW for 275 kV and 150 kV. The final report had been approved and posted on the ADB website in April 2017.

Then, IMA has completed the monitoring of affected land of 150 kV Transmission line Tayan-Sanggau-Sekadau and Sanggau and Sekadau substation (1st phase). The report had been submitted to ADB with several revisions needed to be carried out. ADB recommended the improvement as of the presentation from PPLH Untan to PLN and ADB on 18 April 2019 in PLN head quarter. The revised Independent Monitoring Agency (IMA) document stage 1 for the Tayan – Sanggau – Sekadau 150 kV SUTT Project has been submitted to ADB by letter no. 5634/KEU.05.02/010205/2019 dated 13 November 2019. The submission letter is on appendix 2.

UIP Kalbagbar prepared for IMA 2nd phase (ROW). The consultant has been deployed on 24 December 2019 and ready to mobilize in January 2020. The methods used will be determined before mobilization. In this IMA 2nd phase, PLN will clearly emphasize on the initial preparation and methods of the consultant. IMA 2nd phase targeted to be complete on March 2020

PIC's Social Specialist assisted the project to meet ADB's Involuntary Resettlement (IR) policy requirements in delivering land acquisition and resettlement of the West Kalimantan Power Grid Strengthening Project. The PIC's Social Specialist worked together with PLN UPP KBB 2 and the contractors to strengthen the project implementation process and solved social issues caused by the construction works.

Several activities were conducted from July - December 2019. Those activities included social issues identification and mitigation strategy, as well as general orientation on local wisdom and customary institutions relevant to project implementation. And also Socialization relates to the procedures of land acquisition and compensation.

2.2 Contractors construction activities for transmission lines and substations

The scope of transmission lines work comprises excavation, construction of foundations for the tower bases, tower erection, and stringing of conductors and OPGW. The construction for substations included land clearing, cut and fill, construction of foundations for HV apparatus, installation and testing of the HV apparatus.

PT. Bukaka Teknik Utama was the contractor for the 275 kV Transmission Line from Bengkayang to Jagoibabang (Package 1). CG Consortium was the contractor for the construction of the 275/150 kV Bengkayang substation (Package 2). The consortium of KEC and Mitsubishi Corporation were contractors for construction of 150 kV Bengkayang - Ngabang - Tayan TL (Package 3) and 150/20 kV Tayan extension and Ngabang substation (Package 4). The construction of Sanggau and Sekadau Substation (Package 5) was undertaken by PT. Siemens Indonesia Consortium. The consortium of PT Krakatau Engineering and PT Citramas Heavy Industries was the contractor for the construction of 150 kV Tayan-Sanggau TL (Package 6) and 150 kV Sanggau-Sekadau TL (Package 7).

The contractors already recruited both local and non-local workers from other areas of Indonesia for construction implementation. Local workers were recruited from nearby villages and/or hamlets traversed by the transmission lines. The workers recruitment usually involved local leaders and/or village/hamlet heads to propose and select suitable workers for the earth and civil works and to transport the materials to the tower locations.

The composition of local and non-local workers who were recruited on the construction phase in Package 5, 6, and 7 are presented on the table 2. The number of the worker on each month was counted averagely.

Table 2 The Total Number of Worker for Packages 5, 6 and 7

MONTHS	TOTAL	LOCAL		NON-LOCAL		REMARKS (ORIGIN)
		Amount	%	Amount	%	
PACKAGE 5: SANGGAU SUBSTATION						
JANUARY	38	38	100	0	0	-
FEBRUARY	40	40	100	0	0	-
MARCH	43	43	100	0	0	-
APRIL	43	43	100	0	0	-
MAY	56	56	100	0	0	-
JUNE	13	13	100	0	0	-
JULY	45	45	100	0	0	-
AUGUST	35	35	100	0	0	-
SEPTEMBER	38	38	100	0	0	-
OCTOBER	46	26	56	20	44	JAVA
NOVEMBER	46	26	56	20	44	JAVA
DECEMBER	46	26	56	20	44	JAVA
PACKAGE 5: SEKADAU SUBSTATION						
JANUARY	32	18	55	14	45	JAVA
FEBRUARY	37	23	52	14	48	JAVA
MARCH	43	29	51	14	49	JAVA
APRIL	36	22	67	14	33	JAVA
MAY	41	41	100	0	0	-
JUNE	40	40	100	0	0	-
JULY	48	48	100	0	0	-
AUGUST	52	52	100	0	0	-
SEPTEMBER	46	37	80	9	20	SUMATERA, SULAWESI & JAVA
OCTOBER	39	24	61	15	39	SUMATERA, SULAWESI & JAVA
NOVEMBER	44	24	54	20	46	SUMATERA, SULAWESI & JAVA
DECEMBER	46	15	32	31	68	SUMATERA, SULAWESI & JAVA
PACKAGE 5: TAYAN EXTENSION SUBSTATION						
JANUARY	14	8	57	7	43	-
FEBRUARY	18	8	44	10	56	-
MARCH	21	8	38	12	62	-
APRIL	30	12	40	18	60	-
MAY	31	12	39	19	61	-
JUNE	16	8	50	8	50	-
JULY	14	7	50	7	50	-
AUGUST	9	9	100	0	0	-
SEPTEMBER	5	5	100	0	0	-
OCTOBER	0	0	0	0	0	-

MONTHS	TOTAL	LOCAL		NON-LOCAL		REMARKS (ORIGIN)
		Amount	%	Amount	%	
NOVEMBER	0	0	0	0	0	-
DECEMBER	0	0	0	0	0	-
PACKAGE 6: TAYAN – SANGGAU TRANSMISSION LINE						
JANUARY	119	62	52	57	48	JAVA
FEBRUARY	97	65	67	32	33	JAVA
MARCH	84	43	51	41	49	JAVA & SULAWESI
APRIL	88	28	32	60	68	JAVA & SULAWESI
MAY	94	68	72	26	28	JAVA & SULAWESI
JUNE	58	46	79	12	21	JAVA & SULAWESI
JULY	97	74	76	23	24	JAVA & SULAWESI
AUGUST	74	58	78	16	22	JAVA & SULAWESI
SEPTEMBER	48	16	34	32	66	JAVA & SULAWESI
OCTOBER	219	116	53	103	47	JAVA & SULAWESI
NOVEMBER	179	119	67	60	33	JAVA & SULAWESI
DECEMBER	237	125	53	112	47	JAVA & SULAWESI
PACKAGE 7: SANGGAU - SEKADAU TRANSMISSION LINE						
JANUARY	60	47	78	24	22	JAVA
FEBRUARY	60	55	92	12	8	JAVA
MARCH	84	77	92	10	8	JAVA
APRIL	11	11	100	0	0	-
MAY	22	22	100	0	0	-
JUNE	45	41	92	4	8	JAVA
JULY	60	56	93	4	7	JAVA
AUGUST	60	56	93	4	7	JAVA
SEPTEMBER	35	35	100	0	0	-
OCTOBER	30	30	100	0	0	JAVA & SULAWESI
NOVEMBER	88	40	45	48	55	JAVA & SULAWESI
DECEMBER	88	40	45	48	55	JAVA & SULAWESI

From the composition above, the Project Implementation Unit collaborated with the contractors in this project accommodate the local workers from the surrounding project area.

Specifically, in the construction phase, PLN also monitored the impact of the project on the society, especially related to the job opportunity. PLN in collaboration with contractors provide job opportunities in the project and to ensure that at least their standard of living would not be worse off due to the loss of their assets and livelihood by the project. The construction of the project absorbed unskilled workers and the contractor were able to provide employment opportunities to local communities and vulnerable groups. The contractors, with the support of resettlement specialist consultants, collaborated with the village office or village leaders identified the type of project-related jobs with no special skills and potential applicants, included affected vulnerable groups.

52 of 133 people of vulnerable and severely groups had a great opportunity to be directly involved in construction activities, to become unskilled labor. Another was categorized as women or elderly household headed, so they are not able to work on the construction project.

The potential people who joined in the construction project were invited by the local government. They were from surrounding villages. In fact, not all vulnerable and severely groups were able to join project. Some of them already have jobs, e.g., farmers and local government or school servants.

Moreover, people around the project area were also joining the project even they were not categories as vulnerable or severely group. The society around the project area also received a positive economic impact by opening food stalls and ready to serve some foods to the workers.

People around the project area used the remaining vegetative materials from land clearing activity as firewood, or construction materials for his owned house. For someone whose house rented by contractors, they received compensation and additional income. This related project meant to empower the local human resources that result positive impacts on society.

3. RCCDP and RCCP Implementation Progress

PLN had updated the Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) for 275 kV Transmission Line of the Strengthening West Kalimantan Power Grid Project in August 2013. The updated RCCDP covered 81.374 km of 275 kV Transmission Line from 275/150 kV Bengkayang Substation to the border with Sarawak at Jagoibabang. This updated RCCDP for the 275 kV transmission line also included due diligence for the land purchased by PLN prior to the ADB approval of the RCCDP. The total number of transmission line towers of the 275 kV Bengkayang- Jagoibabang transmission line were 201 towers. It was reported that the land acquisition for the remaining tower sites of the 275 kV Bengkayang - Jagoibabang Transmission Line was consistent with the updated RCCDP.

PLN also had updated the Resettlement and Customary Communities Plan (RCCP) for 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan transmission line and Ngabang – Tayan Substations in March 2014.

In August 2016 PLN submitted the Resettlement and Customary Communities Plan (RCCP) for Tayan – Sanggau – Sekadau. This RCCP covered 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line also related substations, i.e. 150/20kV Sanggau and Sekadau Substations. Afterward, RCCP 2016 had updated in September 2018. This document covered 360 tower plots from Tayan, Sanggau and Sekadau substation.

PLN already submitted the updated Resettlement and Customary Communities Plan (RCCP) following the recent condition for Tayan – Sanggau – Sekadau. This document focused on the latest condition of affected people and their assets along with the Tayan, Sanggau and Sekadau transmissions and substations.

3.1 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL and Bengkayang Substation

i) Number entitled parties/Aps by category of impacts components including the number of vulnerable groups and severely affected household/person

The Detailed Measurement Survey for the 201 towers identified that 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL alignment and Bengkayang Substation stretched along the area which owned by 97 AHs (388 APs) who affected by towers. There were 393 AHs (around 1,572 APs) experienced in restricted use area due to the transmission line Right of Way. Verification result from predecessor PIC (Tractable) at Package 1 (Jagoibabang – Bengkayang) found that 6 people identified as vulnerable APs, and 2 people identified as severely APs in Package 2 (Bengkayang substation). Two out of six vulnerable APs were very old and unable to work anymore, and the other APs work as pepper and corn farmer as main income. Detail list of Vulnerable APs in corridor 275 kV shown in Appendix 3.

ii) Consultations and disclosure

PLN has consulted with ADB regarding the involuntary resettlement program to accommodate payment gaps of ROW in 275 kV Bengkayang – Jagoibabang transmission line in a meeting dated 26 November 2018, with the conclusion was the CSR program could be combined with the productive economic program. Following the meeting, on 23 January 2019, UIP Kalbagtim and UIP Kalbagbar and also the local government conduct a meeting to discuss the technical implementation survey as the CSR necessity in each village.

Then, survey was already conducted on 24 – 31 January 2019 with several optional of business type, such: Poultry (white chicken husbandry), corn farm, agricultural equipment, goat farm, cassava processing, bamboo handy craft and rattan/bidai handy craft. Furthermore, PLN conduct coordination meeting with ADB on 28 February 2019 and it was agreed that ADB concurred with the program proposed to ensure the participation of women and ROW affected people includes the assistances of it. (Appendix 4 shows all coordination meeting and attendance list). Afterwards, in 26 March 2019 PLN was conducted coordination meeting with the local government on preparation of CSR distribution to joint business group in Bengkayang District.

iii) Status of compensation payment including payment land use restriction in the ROW and progress of land acquisition implementation

275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL involves a total of 145.974 m² for tower base. And for Bengkayang Substation has acquired land of 66.775 m². And a total of 2,037,500 m² of land acquired for ROW including 1080 m² structure and 126.911 trees. In total 201 towers have been acquired by PLN for the implementation of the Bengkayang – Jagoibabang transmission line. Land acquisition was completed on 30 September 2015. The area for 150/20 kV Bengkayang Substations has been gradually developed as a dwelling area. The substation was moved about 6,5 km south of the original space, makes the transmission line as long as 81.374 km in total.

iv) Actual land acquisition issues during this period

The land acquisition for all tower plots and substation has been completed.

v) Grievances received and handling

There was no grievance raised by the communities around the project areas related to land acquisition and construction in this monitoring period. However, in general, the grievance raised by peoples related to land clearance, data on lost trees and land, as well as land compensation. PLN has settled these issues in collaboration with local government.

vi) Institutional arrangement and capacity building

There was no capacity building conducted during this monitoring period.

vii) Income Restoration

Income Restoration and Rehabilitation Program for packages 1 and 2 were implemented on 5 October 2017, in Sanggau Leddo Sub District's hall. The program was in the form of distribution of pepper seedlings, fertilizer, agricultural equipment, and agricultural training for vulnerable and affected people. A total of 10 AHs participated in this program and 1 AH refuse to receive help in the form of pepper seeds due to the physical condition that was no longer possible, so the grant diverted with a 900 VA power connection (as per beneficiary request) as seen in the table below.

Table 3 CSR Beneficiaries List in Bengkayang – Jagoibabang TL

No.	Name	Village	Remark
1.	Akon	Risau, Jagoi Village	
2.	Noyih Noek	Jagoi Village	
3.	Jondeh	Jagoi Village	

No.	Name	Village	Remark
4.	Nyaub	Bange Village	
5.	Benyamin Y.B.	Bange Village	On behalf of Surai (AP)
6.	Dayat	Bange Village	
7.	Paskalia	Bange Village	
8.	Heri	Lamolda Village	
9.	Apin	Lamolda Village	
10.	David Napi	Mayak Village	On behalf of Batu (AP)
11.	Amoi	Lamolda Village	Refuse to receive IRRP in the form of pepper seeds due to the physical condition that is no longer possible, so the grant diverted with a 900 VA power connection (as per beneficiary request).

Proposal budget submission for CSR program implementation related to the payment compensation gap in Package 1 had been signed by SKOM in Letter No.0802/STh.02.02/SKOM/2018 on 28 February 2018 regarding TJSL/CSR Program-Budget of UIP Kalbagtim in 2018.

PLN Kalbagtim had made the payment gap of the land use restriction in the ROW of Package 1 by providing IRRP through CSR in SDN 013 Romo. However, according to ADB Mission in September 2018, the school renovation program has not fully addressed the gap. ADB requests another program to cover the ADB requirement that is to enhance, or at least restores the livelihoods of all displaced persons, in real terms to pre-project levels; and to improve the standards of living of the displaced poor and other vulnerable groups.

As the result of comprehensive coordination meeting and the survey related to the productive economic program, which had been conducted as stated in 3.1 ii), The CSR program for package 1 has approved by PLN Corporate Communication and CSR based on letter No. 0899/STH.02.02/DIVCOM/2019 dated 11 March 2019.

The provision of counseling by the social services to beneficiaries of CSR and also to the mentoring groups had been conducted on 12 April 2019. This program was attended by about 60 AHs (29 Male and 31 Female) as listed below:

Table 4 Counseling by Social Services to CSR Beneficiaries in Package 1

No	Name	Village	Male	Female
1	Margaretha Apeng	Belimbing		Female
2	Robiana	Belimbing		Female
3	Yustra Lotot	Belimbing	Male	
4	Pak Tuang	Belimbing	Male	
5	Iju Melda	Belimbing		Female
6	Suhardi	Belimbing	Male	
7	Nurlaili	Magmagan		Female
8	Anastasia Irin	Magmagan		Female
9	Noviliana Sari	Magmagan		Female
10	Elia	Pejampi		Female
11	Roslinda	Jagoi		Female
12	Mekiyanti	Jagoi		Female
13	Yakub Humbing	Bange	Male	
14	Rachmad	Bange	Male	
15	Herman	Bange	Male	
16	Firdaus Anggang	Bange	Male	
17	Suyanto	Jesape	Male	
18	Usman	Seluas	Male	

No	Name	Village	Male	Female
19	Farida	Tiga Berkat		Female
20	Anyun	Lesabela	Male	
21	Matsan	Lamonda	Male	
22	Bang Tamin Teno	Lamonda	Male	
23	Budi Setiono	Magmagan	Male	
24	Yulianto	Magmagan	Male	
25	Daya Pina Yuni	Sahan		Female
26	Nurhayati	Sahan		Female
27	Darmiyanti	Sahan		Female
28	Kristina F.	Sahan		Female
29	Lusiana Hion	Sahan		Female
30	Itawati	Jagoi		Female
31	Fransiskus Priyatno	Sango	Male	
32	Siti Yasmirah	Gua		Female
33	Eti Handayani	Gua		Female
34	Lilis - Suwanto	Ledo		Female
35	Bayu Ibrahim	Seluas	Male	
36	Juling		Male	
37	Warjo		Male	
38	Mardi	Sango	Male	
39	Kristina Kartiana	Sango Raas		Female
40	Ginas			Female
41	Sili	Mayak	Male	
42	Nopita Sari	Mayak		Female
43	Enda	Mayak	Male	
44	Mustapa	Mayak	Male	
45	Sri sujinem	Gua		Female
46	Suhardi	Jagoibabang	Male	
47	Ellis	Jagoibabang		Female
48	Jaidah	Semayas		Female
49	Emiliana Mai	Semayas		Female
50	Wahyuni	Gua		Female
51	Boniyah	Gua		Female
52	Tius David Yusman	Jesape	Male	
53	Riyanto	Seluas	Male	
54	Mathi	Seluas	Male	
55	Ekamis	Sango Raas	Male	
56	Pani	Lumar	Male	
57	Tias	Lumar		Female
58	Ilara	Lumar		Female
59	Yustina	Lumar		Female
60	Rahul		Male	
	TOTAL		29	31

Furthermore, a series of meeting conducted by PLN, including coordination meeting with ADB on 28 February 2019 and it was agreed that ADB concurred with the program proposed to ensure the participation of women and ROW affected people. The program includes productive economic empowerment in various sectors (please see appendix 4 for the acknowledgement). Several programs that had already conducted in April - November 2019 are as follow:

1. The livestock sector in Magmagan Karya, Tiga Berkat, Belimbing, Sahan and Seluas villages Bengkayang District, poultry was the largest portion in this CSR program. The chickens are entering the first harvest period of the nursery. PLN will provide a particular place for the groups to do their marketing under PLN's supervision. Besides, there were various selling prices in each village. By October 2019, in Belimbing and Seluas have made profit from the program. Here after, all of the earning profit will be managed by the group as capital. As for the goat farm

in Bange and Sango villages goat breeds were delivered. Recently counseling session was held respectively. These programs are still monitored by PLN.

2. The agricultural sector in Lamolda, Lesabela and Jesape villages, the distribution of farm equipment and corn seeds for corn farm was delivered in 16 July 2019. Recently 2nd counseling was conducted in 7 October 2019. And currently activity is waiting for additional seeds and fertilizer.
3. Handicraft Sector in Mayak and Jagoi Villages was entering the production phase for bamboo craft, for cassava processing in Gua Village was preparing land for the cassava. The counseling session was conducted on 15 and 16 August 2019 respectively.

The Program detail is presented in table 5 and the beneficiaries list segregate by gender is in table 6 respectively.

Table 5 Detail Program for CSR related to Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line

Sector	No	Programs	Beneficiaries Group	Village	Sub District
Live Stock	1	Poultry	Berkah	Magmagan Karya	Lumar
	2	Poultry	Lamangrek	Tiga Berkat	Lumar
	3	Poultry	Manso Buah	Belimbing	Lumar
	4	Poultry	Karupe'e	Sahan	Seluas
	5	Poultry	PKH Mana Karya	Seluas	Seluas
	6	Goat Farming	Maju Sejahtera	Bange	Sanggau Ledo
	7	Goat Farming	Badeh Sejahtera	Sango	Sanggau Ledo
Agriculture	8	Corn Farming	Maju Bersama	Lamolda	Lumar
	9	Corn Farming	PKH Bunga Anggrek	Lesabela	Ledo
	10	Agricultural Machineries	Karya Baru	Jesape	Ledo
Handicraft	11	Cassava Processing	Maju Bersama	Gua	Sanggau Ledo
	12	Bamboo Craft	Silpa	Mayak	Seluas
	13	Bidai Craft	Baluk Barista	Jagoi	Jagoi Babang

Table 6 Beneficiaries list of Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line CSR segregate by gender

No	Village	Programs	List of Beneficiaries		
			Group	Man	Woman
1	Magmagan Karya	Poultry	Berkah	2	8
2	Tiga Berkat	Poultry	Lamangrek	-	10
3	Belimbing	Poultry	Manso Buah	-	10

No	Village	Programs	List of Beneficiaries		
			Group	Man	Woman
4	Sahan	Poultry	Karupe'e	20	20
5	Seluas	Poultry	PKH Mana Karya	8	1
6	Bange	Goat Farming	Maju Sejahtera	12	1
7	Sango	Goat Farming	Badeh Sejahtera	9	-
8	Lamolda	Corn Farming	Maju Bersama	15	9
9	Lesabela	Corn Farming	PKH Bunga Anggrek	-	26
10	Jesape	Agricultural Machineries	Karya Baru	16	9
11	Gua	Cassava Processing	Maju Bersama	-	6
12	Mayak	Bamboo Craft	Silpa	-	10
13	Jagoi	Bidai Craft	Baluk Barista	6	24
Amount				88	134
TOTAL AMOUNT				222	

In general, the measurement/ indicators of the Bengkayang CSR program could be rated by self-assessment as presented in table 7.

Table 7 Measurement/ indicators of Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line CSR

NO	Indicator(s)	5 excellent	4 good	3 average	2 poor	1 Very poor
1	Participation of the society	V				
2	Program management agencies		V			
3	Internal monitoring		V			
4	program compatibility in the implementation with work plan			V		

There are 222 beneficiaries in total of this program. Handing over of the accommodation to all beneficiaries symbolically was on 26 September 2019. The program has implemented well. And the stand alone report is presented in appendix 5.

3.2 150 kV Bengkayang-Ngabang-Tayan TL and Ngabang – Tayan Substations

i) Number entitled parties/Aps by category of impacts components including the number of vulnerable groups and severely affected household/person

The result of a short interview in March 2016 by previous PIC (Tractebel) to severely and vulnerable affected people in 150 kV Bengkayang – Ngabang - Tayan are 25 persons confirmed identified as vulnerable affected people and 1 person confirmed identified as severely affected people by Bengkayang substations. This number of vulnerable and severely affected people also mentioned in the minutes of meeting dated on 19 January 2017 (Please see Appendix 6) and there were no changes

related to this number during this monitoring period. Detail list of Vulnerable and Severely Affected people in the corridor of 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan is shown in Appendix 7.

ii) Consultations and disclosure

Complaints from the landowners sometimes come up from the landowner that one or several of his trees have not been compensated yet. Such an issue may cause obstacles and delays the project activities as the landowner insists on clarification by PLN. To avoid such disputes during construction, the PLN Land Acquisition Team continuously goes for rapprochement to landowners. Otherwise, landowners demand prices much higher than the price offered by PLN for plants.

Several public consultations in the form of socialization for land acquisition have been conducted to affected people also the vulnerable group during 20 January 2016, to 1 March 2016, for the ROW corridor of 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan Transmission Line has been conducted on 6 September 2016 to 28 July 2017.

In the socialization, information to be disclosed includes the scope of land acquisition, compensation and rehabilitation policy and measures that will be taken to restore the living standards of affected people to at least the pre-project level. The affected people including the vulnerable group actively participated during the consultation and socialization program. PLN also accommodates any question and suggestion raised by the affected people related to their entitlements.

There is no more socialization conducted in this monitoring period since the payment for land restricted by ROW is completed at the end of August 2017 and the project has been operated following the issuance of the Operational Acceptance Certificate (OAC). Section 1 was issued on 28 May 2018, and section 3 was issued on 5 October 2018.

Socialization held in several villages in Landak, Bengkayang and Sanggau District conducted by UPP KBB 3 Singkawang. Socializations were attended by PLN UIP Kalbagbar, PLN UPP KBB 3, the public appraisal company KJPP, MUSPIKA, Head of Dewan Adat Dayak (DAD), Army, Police and affected people. In this socialization, Head of Dewan Adat Dayak asked the villagers not to obstruct the construction work and any concern to the Adat problem should be avoided. PLN explained to all affected people the compensation for land and plants within the ROW corridor of the 150 kV transmission line based on Regulation no. 381/2013 of Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic Indonesia about compensation for land, building and plant under the free space of high voltage transmission line. PLN has paid 15% of the appraised land value as compensation for land located within the ROW corridor as the land still belongs to the people but the use is restricted.

Table 8 List of ROW Socialization in 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL

No.	District	Village	Date
1.	Landak	Antan Rayan	6 September 2016
2.	Bengkayang	Dharma Bakti	21 October 2016
3.	Landak	Ansang	2 November 2016
4.	Landak	Mungguk	16 November 2016
5.	Bengkayang	Bani Amas	6 December 2016

No.	District	Village	Date
6.	Landak	Jelimpo	31 March 2017
7.	Sanggau	Tae	21 April 2017
8.	Sanggau	Padi Kaye	19 April 2017
9.	Sanggau	Cempedak	28 July 2017

Disclosure of the RCCP for Bengkayang – Ngabang – Tayan also made in the form of distribution of leaflets containing the summary of RCCP. The leaflets have been posted on strategic places and at village office boards and also directly given to affected person on 27 – 29 March 2018.

iii) Status of compensation payment including payment land use restriction in the ROW and progress of land acquisition implementation

Land Acquisition

Land acquisition for packages 3 and 4 was undertaken by PLN UPP KBB 3 Singkawang in collaboration with the local governments. The procedures for land acquisition are as follows:

- 1) Consultations with relevant stakeholders to inform on the purposes of the project development, potential impacts and land acquisition activities.
- 2) Identify of landowners and inventory of property and vegetation.
- 3) Announcement of inventory results (14 working days after)
- 4) Land valuation based on Public Appraisal Service (Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP).
- 5) Socializations with APs, announcement of compensation
- 6) Transfer of compensation amount to landowner.
- 7) Release of land title from the APs to PLN.

In a total of 90 km alignment stretching from Bengkayang substation to Ngabang Substation. And 55 km along from Ngabang Substation to Tayan Substation. A total of 103,500 m² (10.4 ha) of land was permanently required for the project, including 9,875 m² for Ngabang Substation (land acquisition was not required for Tayan Substation), and about 93,500 m² (9.4 ha) for the tower base. In addition, there was 2,900,000 m² (290 ha) of land has been affected for the alignment of the right of way.

Land acquisition for Ngabang and Tayan substations has been completed. The payment has been done in December 2017.

150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan transmission line comprises of 280 tower sites for the Bengkayang – Ngabang section and 128 tower sites for Ngabang– Tayan section as updated by administrative consolidation, i.e. 407 towers in total.

PLN has completely released the land for 408 towers in the 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL by the end of December 2016. Several tower sites located in the forestry area.

The acquired permit for the forestry area for Bengkayang – Jagoibabang and Bengkayang – Ngabang – Tayan has been issued on 16 January 2017, by Capital Investment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal-BPKM) No:6/1/IPPKH/PMDN/2017 as seen in Appendix 8. Implementation of required actions and commitments set in the permit is shown in Table 9 and the supporting data can

be seen in Appendix 9.

Table 9 Status of Required Actions and Commitments Implementation based on Forestry Area Permit*

No	Requirements	Workplans	Presenta ge	Remarks
1	Designing plans & implementation of reclamation and re-vegetation in forest area	2020 – second semester	0%	
2	Watershed Planting rehabilitation	2018 to 2023	50%	<p>*Implementation of works based on Contract: 11.PJ/KON.02.02/UIP.KALBAGBAR/2019 dated 26 December 2019</p> <p>*Budgeting of reforestation watershed planting rehabilitation approved. Currently, the procurement of implementing watershed rehabilitation planning consultant</p> <p>*The issuance of reforestation location (Number: SK.1885/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/3/2019 dated 18 March 2019</p> <p>*Acknowledgement of location result by : BA.22/KTA/R2PKH/DAS.1/2/2019, dated on 18 February 2019</p> <p>*Location Survey of watershed planting rehabilitation at Batu Ampar (27-28 December 2018</p> <p>*2018: phase of procurement of implementing watershed rehabilitation planning consultant</p> <p>*Verification of watershed planting rehabilitation candidates by letter No: S.414/KTA/RP2PKH/DAS.1/11/2018, dated on 12 November 2018</p> <p>*Indicative Map of watershed planting rehabilitation from BPDAS and HL dated on 7 June 2017</p>
3	PNBP Payment as regulation applied	annually, before the due date	100%	<p>2017: 20 March 2017</p> <p>2018: 15 January 2018</p> <p>2019: 14 January 2019</p> <p>2020: 15 January 2020</p>
4	Implements the Tree Inventory as work plan	on September 2017	100%	Finish - the report has been submitted to provincial forestry agency & production forest management center/BPHP (date of September 8, 2017)
5	Implements the PSDH &/DR Payment as regulation applied	2018 to 2023	100%	Finish - implemented 100% on 28 May 2018
6	Payment Compensation (If it is a rehabilitation forest)	-	100%	Not Applicable. Not a rehabilitation forest
7	replace the investment costs of forest management / utilization to the manager / holder of forest product utilization permit according to the provisions of the legislation	2020- second semester	0%	<p>*Pay back the permit cost which is issued by</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Nitiyasa Idola 2. PT Sinar Kalbar Raya <p>Since PLN traversing corporation's area</p> <p>*Based information from production forest management center/BPHP, those two corporation has not identified yet, due to inactive</p>
8	Maintenance of IPPKH border area	2021- second semester	0%	
9	Forest protection IPPKH area in	2021 - second semester	0%	in the form of:

No	Requirements	Workplans	Presenta ge	Remarks
	accordance with the provisions of the legislation			* warning sign related to forestry protection * watch tower/security house /tower/other infrastructures * get around with forestry policeman
10	securing conservation forest areas and protected forests in the case of borrowed use areas of forest areas bordering conservation forest areas and protected forests in accordance with laws and regulations	2021 - second semester	0%	* put the name of forestry group * take the additional watch tower information * watch around together
11	provide easements for environmental officers from head quarter or branch when conducting monitoring and evaluation in the field	2020- second semester	0%	* put the name of institution that headed * communicate the purpose of activity * mention the frequencies of activity
12	Coordinates the environmental activities & forest utilization to IPPKH permit holder or manager of forestry	2020- second semester	0%	
13	Empowering communities around the permit area	2020- second semester (in the form of CSR)	10%	Proposal of 2020 CSR submission to the head quarter by letter number: 3088/STH.02.02/550000/2019, dated on 3 October 2019
14	Make periodic reports every 6 months	implemented in each semester	100%	already posted in website

* Fulfillment progress up to January 2020: 40%

Right of Way

Compensation payment for the affected asset within the ROW corridor has been implemented following the rate valued or recommended by the independent appraisers. The procedure of compensation for plants within the corridor of ROW, i.e.:

- 1) Consultations with relevant stakeholders to inform on the purposes of the project development, potential impacts and Right of Way activities.
- 2) Identify the tree owner
- 3) Announcement of inventory results (14 working days after)
- 4) Plants valuation based on Public Appraisal Service (Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP).
- 5) Socializations with APs, announcement of compensation
- 6) Transfer of compensation amount to the tree owner.
- 7) Clearing the released ROW

Compensation payment for Package 3, Section 1 Bengkayang – Ngabang transmission line has been completed in 2016, for section 2 Ngabang - Tayan transmission line has been completed in August 2017. Total amount payment of all sections was Rp.110.096.233.344.

Table 10 Monitoring Progress ROW for 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL

No	Section	KJPP	Number Tower/ Span	ROW Length	Compensation Amount	Implementation Progress
1	Section 1 150 kV Bengkayang- Ngabang TL	KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba	279 Tower/ 278 Span	95,6 km	Rp 69,124,002,971	Socialization (September 2016) Inventory (March 2016) Assessment & compensation assignment (September 2016) Payment:

No	Section	KJPP	Number Tower/ Span	ROW Length	Compensation Amount	Implementation Progress
						- Land/ Rp 10,608,316,800 - Building/ Rp 3330,990,001 - Trees/ Rp 58,184,696,170 - Payment Progress (100%)
2	Section 2 150 kV Tayan- Ngabang TL	KJPP Dwi Haryantono Agustinus Tamba	128 Tower/ 127 Span	46,8 km	Rp 40,972,230,363	Socialization (November 2016) Inventory (June 2016) Assessment & compensation assignment (November 2016) Payment: - Land / Rp 5.442.465.000 - Building / Rp 3.315.000 - Trees / Rp 35.526.450.363 - Payment Progress (100%)

Land Ownership

Land ownership for Bengkayang – Ngabang - Tayan transmission line is still in process. Up to December 2019, the National Land Agency (BPN) in Bengkayang issued a total of 4 (1.4%) land certificates. 21 (7.5%) are still in the measurement process by BPN in Bengkayang and Landak District, in the amount of 10 and 11 locations respectively. The remaining 254 tower sites (91%) were not processed yet.

For the substation, the land acquired at both locations already finished as a total of 66.175 m² for Bengkayang Substation and 9.875 m² for Ngabang Substation. The land certification of Bengkayang Substation is still proceeding in BPN Bengkayang by UIP Kalbagbar, but it would be handed over to UIP Kalbagtim. The progress for Ngabang substation during this monitoring period was verification process of Balik Nama registration document in BPN Landak (already registered on 26 February 2020). PLN will continually monitor the processes. Detail of land ownership updates can be seen in Appendix 10.

The issuance of this land ownership certificate requires several stages, so that the completion of all tower site certificates for Bengkayang – Ngabang – Tayan transmission line is estimated to be up to 2022 as detailed in Appendix 11.

iv) Grievances received and handling

Concerning to disputed land parcels, PLN UPP KBB 3 in Singkawang also conducted a series of meetings with MUSPIKA and local district government. Documents required to solve such disputes are:

- 1) A Minutes of Meeting involving owner(s) of disputed land, MUSPIKA and head of Adat.
- 2) Signed Statement Letter of Dispute from Owner of disputed land
- 3) Document no 1) and 2) will be sent to PLN UPP 2 in Sintang and PLN UPP 3 in Singkawang if agreements have been reached between the owners of disputed land, and compensation payment can be processed.
- 4) If there is no agreement, the case of the disputed parcels can be brought to Bupati (head of district government) and the Governor of West Kalimantan.

5) If the case of disputed parcels cannot be resolved, PLN may take the case to the local court for adjudication. These phases also apply for other grievance issues.

These phases also apply for other grievance issues. The mechanism can be seen in Figure 1.

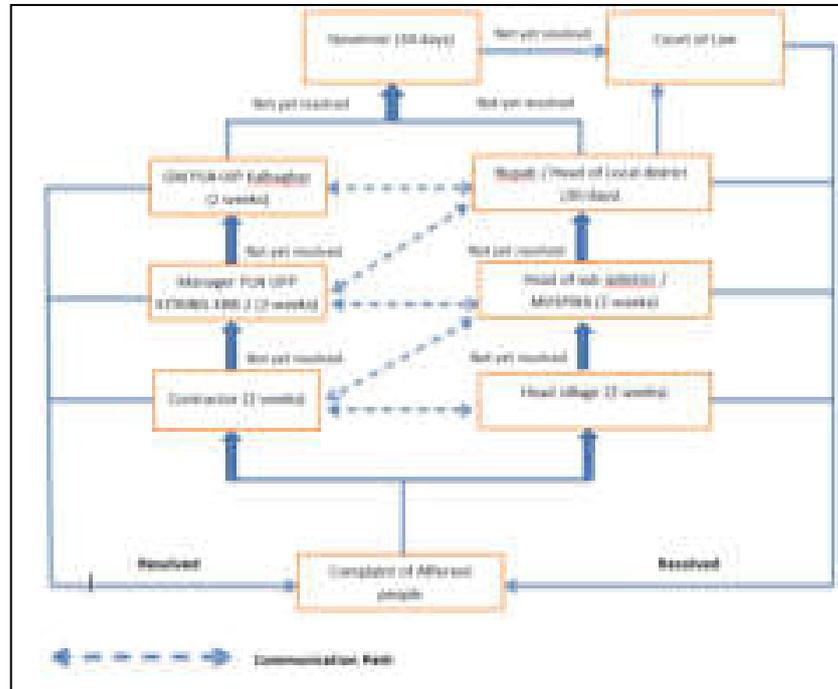


Figure 1 Project Grievances and Redress Mechanism

During this monitoring period, there was no another complaint raised from the society on this proposed project.

v) Institutional arrangement and capacity building

There was no capacity building conducted in during this monitoring period.

vi) Income Restoration

Income restoration has been implemented for APs who have lost their productive base, business, jobs or other income sources, regardless of whether they have lost their house. Based on RCCP, people who lost more than 10% of their total productive land/assets are APs who were identified as severely affected. APs that are categorized as vulnerable include elderly headed households, disabled, landless, Indigenous People (IP), women-headed households but not considered poor and severely affected. Income restoration and rehabilitation program will be provided for severely APs by PLN in close consultation with APs.

During this monitoring period, all the vulnerable and severely affected people have already received the program. The program was delivered in two phases. The first phase was conducted on 22 December 2017, at the Office Hall of Temiang Mali Village with 11 APs participants. The second phase was conducted on 25 January 2018. The Manager of UPP KBB 3 has handed over Corporate Social Responsibility funds as the result of the Income Restoration and Rehabilitation Program in the amount of Rp 110.240.000,- to the affected people in Bengkayang – Ngabang –

Tayan in the form of distribution of pepper seedlings, fertilizer, farm equipment, and agricultural training. A total of 25 affected households participated in this program, i.e. 18 people (72%) are men and 7 (18%) are women.

In the implementation of public consultation, the women involved in the activities were relatively smaller than men. This was caused by the local culture where men dominantly take a public role such as attending a public meeting regarding the project plan. However, PLN has encouraged women to participate in every consultation. The consultation was held at a local village office in an atmosphere free of intimidation, and being witnessed by the head of each village. These projects also gave some benefits to the affected people around the project area.

The list of CSR beneficiaries can be seen in the Table 11, as follows:

Table 11 CSR Program Beneficiaries for Bengkayang – Ngabang – Tayan TL

No.	Name	Village	Gender
<i>First Phase, on 22 December 2017 at Temiang mali Village's Office Hall</i>			
1	Noren	Cempedak	Man
2	Sarum	Cempedak	Woman
3	Sarsa	Makawing	Man
4	Annius Bebe	Makawing	Man
5	Anwar	Makawing	Man
6	Anggek	Temiang Mali	Woman
7	L. Hadir	Temiang Mali	Man
8	Anyi	Temiang Mali	Man
9	Buncang	Temiang Mali	Man
10	Darius Acos	Tae	Man
11	Eneng	Padi Kaye	Woman
<i>Second Phase, on 25 January 2018 at Jelimpo Sub-district's Hall</i>			
1	Iyus	Tembawang	Man
2	Diru	Tembawang	Woman
3	Julianan Ancek	Tembawang	Woman
4	Jolo	Tembawang	Man
5	Tengkel	Raeng	Man
6	Apek parman	Raeng	Man
7	Aby	Raeng	Man
8	Anun	Raeng	Man
9	Acok	Tebedak	Woman
10	Murtinah	Tebedak	Woman
11	Ngaeng	Tebedak	Man
12	Atta	Tebedak	Man
13	Anjong	Tebedak	Man
14	Antonius Atang	Tebedak	Man

3.3 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL and Sanggau - Sekadau Substations

i) Number entitled parties/Aps by category of impacts components including the number of vulnerable groups and severely affected household/person

Based on RCCP and RCCDP, APs identified as severely affected are those people

who lose more than 10% of their total productive land/assets, and APs who are categorized as vulnerable include elderly headed households, disabled, landless, Indigenous People (IP), women-headed households but not considered poor and severely affected. UU No.13 Year 1998 about the welfare of the elderly states that the elderly is a person who has reached 60 years and above.

A survey to affected people due to land acquisition for tower plots has been implemented by PIC in coordination with UPP KBB 3. The result of a short interview to affected people in 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line and Sanggau and Sekadau substation identified 122 people as vulnerable affected people and 11 people as severely affected people.

There are 5 people as affected people due to land acquisition for Sanggau and Sekadau substations. All of them are indicated as severely affected people as they lose more than 10% of their land, shown in Table 12.

Table 12 Severely Affected People on Sanggau – Sekadau Substations

No.	Name of AHs	Address	SHM	Affected land (m ²)	Total land (m ²)	Percentage of affected land	Vulnerability /severely
Sekadau SS							
1.	Abang Mokmen	Mungguk Village, Sub District Sekadau Hilir, District Sekadau	SHM No.00385	13.203	13.203	100%	Severely
2.	Hj. Setiban	Mungguk Village, Sub District Sekadau Hilir, District Sekadau	SHM No.00387	9.271	13.397	69.20%	Severely
Sanggau SS							
1.	Yulia Ani	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	SHM No.808	10.610	11.795	89.95%	Severely
2.	Alisius	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	SHM No.815	8.280	12.188	67.94%	Severely
3.	Solisman	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	SHM No.791	3.414	13.468	25.35%	Severely

A total number of 122 APs were indicated as vulnerable affected people, and 11 APs were identified as severely affected people which one of them lost 100% of their land. Based on data, 2 of them have been counted as severely affected people. Severely and vulnerable affected people are summarized in the table below:

Table 13 Severely and Vulnerable APs in Tayan – Sanggau – Sekadau

No.	Village	Vulnerable	Severely
Transmission Line			
Sanggau District			
Tayan Hilir Sub District			
1.	Kawat Village	1	-
2.	Cempedak Village	12	-
3.	Tebang Benoa Village	5	-
Balai Sub District			
4.	Makkawing	3	-
5.	Temiang Mali	2	-
6.	Hilir	1	-
7.	Kebadu	10	1
8.	Senyabang	9	-
9.	Temiang Taba	5	-
Tayan Hulu Sub District			
10.	Menyabo	3	-
11.	Sosok	3	-
12.	Binjai	9	-
13.	Parindu Sub District	-	-
14.	Suka Gerundi	6	-
15.	Palem Jaya	-	-
16.	Pusat Damai	6	-
17.	Sebara	4	-
Kapuas Sub District			
18.	Lape	4	-
19.	Sei Mawang	2	1
20.	Bunut	4	1
21.	Beringin	5	-
22.	Tanjung Kapuas	1	-
23.	Penyeladi	5	3
24.	Mukok District	4	-
25.	Semuntai		
Sekadau District			
Sekadau Hilir Sub District			
26.	Sungai Kuyit	5	-
27.	Peniti	6	-
28.	Ensalang	1	-
29.	Sei Ringin (Re-route)	2	-
30.	Mungguk	4	-
	Total Transmission Line	122	6
Substations			
	Total Substations		5
	Total	122	11

Detail list of vulnerable and severely Affected people in corridor of 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau shown in Appendix 12.

ii) Consultations and disclosure

Land acquisition for 150 kV Tayan – Sanggau - Sekadau transmission line had been executed and had been released in several sub-districts. Several stages were conducted in the process of land acquisition, including socialization to APs.

In general socialization, PLN explained a lot of information, i.e.: (i) transmission lines related to the length of the lane and the number of towers, (ii) the villages to be traversed by transmission lines, (iii) free space of vertical and horizontal area for transmission line, (iv) land acquisition for tower base and its compensation, (v) clearance of trees or crops and its compensation, (vi) the induction magnetic and electric field based on WHO, SNI and Department of Health standards for the transmission line, (vii) results of magnetic and electric fields measurements for transmission line, and completed by questions and answer sessions.

Socializations for land acquisition compensation in Sanggau District have been conducted several times in 2015. It had been conducted in Sekadau District in 2017. The list of socialization for land acquisition can be seen in Table 14.

Table 14 Socializations of Land Acquisition for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line

No.	District	Sub - District	Date	Number of Participants
1.	Sanggau	Tayan Hilir	12 October 2015	Men: 23 Women:4
2.	Sanggau	Balai	13 October 2015	Men: 56 Women:7
3.	Sanggau	Tayan Hulu	15 October 2015	Men: 76 Women:4
4.	Sanggau	Parindu	16 October 2015	Men: 36 Women: 5
5.	Sanggau	Kapuas	20- 21 October 2015	Men: 57 Women:9
6.	Sanggau	Mukok	22 October 2015	Men: 32 Women: 6
7	Sekadau	Sekadau	23 October 2015	Men :28 Women: 3
8.	Sekadau	Sekadau Hilir	11 April 2017	Men: 15 Women: 2

Primarily, the ROW-related socialization for affected people had been implemented after the appraiser (KJPP) assessment was completed. It had been started in November 2018.

Socializations were held in several villages in Sanggau and Sekadau District as listed in Table 12. Socializations were attended by PLN UIP Kalbagbar, PLN UPP KBB 2 Sintang, the public appraisal company KJPP, Village and Sub-district Head, Army, Police, Intelligence services, Dewan Adat Dayak (DAD), ROW inventory team, Bank representative and affected people. During socialization, PLN explained to all affected people about the compensation for land and plants within the ROW corridor of the 150 kV transmission line based on Regulation No. 27/2018 of Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic Indonesia. The compensation covered for land, building and plant under the free space of high voltage transmission line. PLN paid 15% of the appraised land value as compensation for land located within the ROW corridor. The land still belongs to the owner but its use is restricted. The plant was paid as the appraised plant value. The payment was transferred to the affected people by PLN through the appointed bank.

For this period, land acquisition compensation for Sanggau-Sekadau Sub districts had already been executed. There is one remaining tower plot (T. 24), which is mediated in the local court and waiting for decision to execute. Socialization was attended by PLN UPP KBB 2 (formerly UPK RING KAL 1), village official's representative, military apparatus, police officers, and community representatives. Sample acknowledgment of the ROW-related socialization is shown in Appendix 13.

Table 15 List of ROW Socialization in 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau

No.	District	Village, Sub - District	Date	Number of Participants
1	Sanggau	Sebarra	13 November 2018	
2	Sanggau	Suka Gerundi	14 November 2018	
3	Sanggau	Palem Jaya	16 November 2018	
4	Sanggau	Sungai Mawang	23 November 2018	
5	Sanggau	Lape	27 November 2018	
6	Sekadau	Ensalang,	28 November 2018	
7	Sekadau	Sungai Kunyit	30 November 2018	
8	Sanggau	Hilir	23 January 2019	Men: 20
				Women: 7
9	Sanggau	Temiang Mali	24 January 2019	Men: 43
				Women: 5
10	Sanggau	Tebang Benoa	30 January 2019	Men: 58
				Women: 9
11	Sanggau	Makkawing	31 January 2019	Men: 39
				Women: 6
12	Sanggau	Kebadu	13 March 2019	Men: 91
				Women: 15
13	Sanggau	Cempedak	14 March 2019	Men: 76
				Women: 33
14	Sanggau	Kawat	14 March 2019	Men : 2
				Women: 0
15	Sekadau	Bunut	20 March 2019	Men: 45
				Women: 9
16	Sanggau	Tanjung Kapuas	22 March 2019	Men: 18
				Women: 0
17	Sanggau	Mungguk	26 March 2019	Men: 29
				Women: 8
18	Sanggau	Sungai Ringin	27 March 2019	Men: 32
			28 March 2019	Women:4
19	Sanggau	Penyeladi	28 March 2019	Men: 57
				Women: 9
20	Sanggau	Semuntai	29 March 2019	Men: 37
				Women: 5

In this socialization, PLN provided consultation, question and answer sessions with the affected people along the tower construction alignment. The discussion was held in a good equal atmosphere.

There is no custom rule mentioning that the owner of the land has to be a man. However, the name of the husband is mostly used for the ownership of the land. The same matter applies to the most official land certificates that are routinely issued by the husband's name only. Therefore, women participation in consultation and socialization relatively low. However, PLN encouraged women to participate by inviting both husband and wife in this matter.

Disclosure of the RCCP for Tayan – Sanggau - Sekadau TL was conducted by distributing leaflets containing the summary of RCCP. The leaflets had been posted to strategic places, pasted on the village office boards, and also directly given to affected people in May 2019. Documentation of leaflet distribution and copy of the leaflet is shown in Appendix 14 and Appendix 15, respectively.

iii) Status of compensation payment including payment land use restriction in the ROW and progress of land acquisition implementation

Sanggau – Sekadau Substation

The main project resettlement principle is to avoid and if that is not possible, to minimize resettlement impacts, and restore the livelihood of all APs at least to their pre-project condition. Compensation for lost land and non-land assets will follow the principle of the replacement cost.

Land acquisition for Sekadau substation (2.4ha) and Sanggau substation (2.3ha) had been completed in January and April 2017, respectively. Location assignment permissions for 150 kV Sekadau substations based on Bupati Sekadau decree No.671.32/133/UMUM/2016 dated on 1 March 2016. For 150 kV Sanggau substation, it was executed based on Bupati Sanggau decree No.19 Tahun 2015 dated on 16 January 2015, shown in Appendix 16 and Appendix 17 respectively. Affected asset acquired for substation includes land and trees/crops summarized in Table 16.

Table 16 Affected Asset Acquired for Sanggau and Sekadau Substation

No.	Name of AHs	Address	Affected land (m ²)	Trees/Crops	Total compensation (Rp)
1.	Abang Mokmen	Mungguk Village, Sub District Sekadau Hilir, District Sekadau	13.203	Rubber, Leban Meranti, Jengkol, Cempedak, Durian, Mentawak, Rambutan, Pelantan Setopong, Entawak Mango, Kepuak, Palm, Pinang	5.754.264.000
2.	Hj. Setiban	Mungguk Village, Sub District Sekadau Hilir, District Sekadau	9.271	Rubber, Cempedak, Mentawak, Durian Bamboo, Pelasik Jengkol, Kelengkeng Rambutan, Local wood, Halaban, Asam Bawang, Petai, Mango	3.513.820.100
Total Sekadau SS			22.474		9.268.048.100
1.	Yulia Ani	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	10.610	Rubber, Cerucuk, Durian, Star Fruit, Medang, Kampas, Leban, Ubah, Bamboo, Mentawak, Rambutan, Pinang, Sawit, Asam Kalimantan, Cempedak, Petai,	1.580.250.200

No.	Name of AHs	Address	Affected land (m ²)	Trees/Crops	Total compensation (Rp)
				HGaharu, Salak, Chocolate, Nyantoh, Asam Kendis, kayu Malam, Tengawang, Pekawai, Mahang, Jambu Hutan, Pulai	
2.	Alisius	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	8.280	Rubber, Tengawang, mahang, Nyantoh, Cempedak, Pulai, Durian, Leban, Kapuak, Cerucuk, Bamboo, Rambutan, Sawit, Medang, Sagu, Kelengkeng, Petai, Peluntan, Embaong, Tekan, Local Wood	1.287.769.110
3.	Solisman	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	3.414	Rubber, Cerucuk, Leban	507.020.000
Total Sanggau SS			22.304		3.375.039.310
Total 2 Substations			44.778		12.643.087.410

Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line

Permissions of Location assignment for 150 kV Tayan – Sanggau- Sekadau were based on Bupati Sanggau decree No.250 Tahun 2014, and Bupati Sekadau decree No.671.32/133/UMUM/2016 dated 1 March 2016, as shown in Appendix 18.

There is no tower traversing forestry area in both packages. The requested permit was issued by Territory Hall of Forest Area (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III), letter No.S396/BPKH.III.2/2015 dated 13 May 2015, which can be seen in Appendix 19.

In Tayan – Sanggau transmission line (Package 6), the number of towers changed from 223 to 235 towers due to the change of Sanggau substation locations. The contract amendment to Package 6 was required for 12 additional towers. Land of 235 towers (100%) was acquired in November 2017.

In Sanggau-Sekadau transmission line (Package 7), the number of towers changed from 135 to 125 towers due to the change of Sanggau and Sekadau substation locations. There are 18 towers must be rerouted. Land for 124 to 125 towers (99.20%) has been acquired, and the remaining 2 towers which shifted (1.6%) had been obtained and compensated in March 2019. Then, 1 tower was pending in T. 24. It is still on the process in Local court.

As of December 2019, affected Assets Acquired for Tayan - Sanggau - Sekadau Transmission Line traversing farmland was classified into private and institution ownership, as summarized in Table 14. The ROW-related to payment for affected people had been implemented after the appraiser (KJPP) assessment was completed.

It had been compensated in the total amount of Rp. 8.480.383.200. As for the ROW of transmission line in both packages 6 and 7, the APs have been compensated by PLN gradually since December 2018 up to 24 May 2019, and it is still ongoing up to now. Several APs were not paid yet. The total compensation amount was Rp 81,432,382,775 up to December 2019, as summarized in Table 18.

Compensation payment for affected assets both for affected land and right of way

implemented following the rate valued or recommended by the independent appraisers.

Table 17 Summary of Affected Land for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL up to December 2019

Section	Number of Tower	Actual Acquired	Owner	Occupation of Land	Width (m2)	Compensation
Tayan – Sanggau	235	225	Private	Farmland	56,464	4.954.855.500
		8	Institution	Farmland	2,086	
		2	Customary land	Farmland	625	
Sanggau - Sekadau	125	119	Private	Farmland	29,800	3.658.648.500
		4	Institution	Farmland	1300	
Total	360	358			89,925	8.613.504.000

Table 18 Summary of ROW for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL up to December 2019

Section	Number of Span	Compensation	Remark
Tayan Sanggau	225/235	Rp 55,251,351,325	Several spans which not yet 100% acquired not included in the total amount of acquired land, but for that matter, most of the plot span already paid.
Sanggau Sekadau	114/125	Rp 26,181,031,450	
Total	339/360	Rp 81,432,382,775	

Land Ownership

Land ownership for Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line is still in process. Up to this December 2019, certificates for 28 of 125 locations (22.40%) have been issued, and 27 certificates of 125 sites (21.60%) are still being processed by National Land Agency (BPN) in Sekadau District. The rest of 84 (56.00) certificates have not been processed yet. While in Sanggau District they are 5 of 235 (2.13) certificates were issued and 9 of 235 certificates (3.84%) were in progress, and the rest as 221 (94.04%) certificates have not being processed yet.

For Sanggau substation until this monitoring period the progress is the issuance process of SK Hak from Kanwil Kalbar and Sekadau Substation HGB certificate is already issued, the land certification process is still on going in each district. Detail of land ownership updates can be seen in Appendix 10.

The issuance of this land ownership certificate requires several stages. Therefore, the completion of all tower site certificates for Tayan - Sanggau - Sekadau transmission line is estimated to be up to 2022 as detailed in Appendix 11.

iv) Actual Land Acquisition Issues during This Period

Several stages in the land acquisition process have been implemented. Otherwise, there is the remaining obstacle. The several issues during the last period related to the land acquisition of package 7, Sanggau – Sekadau transmission have been

resolved by PLN, remaining issue up to this period will get more attention from PLN as seen in the table below.

Table 19 Social Issues to be settled in Sanggau – Sekadau TL (Package 7)

No	Tower No.	Village	Name	Issue	Status	Remark
1.	T.24	Bunut	Sosimus	The land cannot be released, mediated by the local court.	Open	In the local court process, targeted on December 2019

v) Grievances received and handling

As described in chapter 3.2 point iv) relating to grievances and handling, several issues occurring in the environment were resolved by following the scheme contained in Figure 1.

In package 5, there was no grievance came up from the society. The location was already set up far from the community and the access road (asphalted road) was also in a good condition. There was no grievance in Sekadau Substation since the location of Sekadau New Substation was already set up far from the society. In Sanggau Substation, the objection was showed up from the community in February 2019 regarding dust control around the project area. The contractor already covered these issues by showering water in the project area periodically. They were also scraping debris that felt during transporting soil material in the Sanggau substation manually,

During this monitoring period, other social issues occurred on the construction phase in Tayan – Sanggau - Sekadau transmission line, especially for the access road, which was hard to pass. For example, the access road in T.158, which was located in Palem Jaya village, is still in the form of a dirt road that is difficult to traverse for the vehicle and material transports. The access road can be accessed by foot or light vehicles, but not for heavy vehicles. The road condition is worse during the rainy season. Thus, the society around the access road asks the contractor to fix that access road, and the contractor began to repair the access road. The contractor commits to repair the road. The repaired access road will facilities the society activities and also makes the material transport for the tower construction easier. The documentation of social issues of Tayan – Sanggau – Sekadau TL are presented in Appendix 20.

vi) Institutional arrangement and capacity building


There was no Capacity building related to the project during this 2nd semester of 2019.

vii) Income Restoration

Income restoration and rehabilitation program have been provided for severely and vulnerable APs by PLN in close consultation with APs. A proposal of IRRP for Packages 5, 6, and 7 (towers) was submitted by UIP Kalbagbar to SKOM in September 2017 and has been approved on March 26, 2018. The first batch of IRRP was implemented in September 2018 in the form of chicken husbandry and training. A

number of 23 vulnerable affected people have participated in this training program, which was held on 18 September 2018, in the local government office of Sekadau. PLN UIP Kalbagbar added up 4 poor households surrounded the project location. It was suggested by the local government. A total number of 27 participants joined this training program.

There will be three batches of IRRP. The first two batches will be conducted in 2019, and the 3rd batch will be held in 2020. After the IRRP training program held on September 18, 2018, PLN also conducted a short interview with the entire program beneficiaries. The diagram below shows that all of them (100%) are satisfied with the restoration program. The impact on income survey showed that 83% of participants felt that their income increases, 17% of participants have a constant income. None of the participants thought that their income was decreasing.

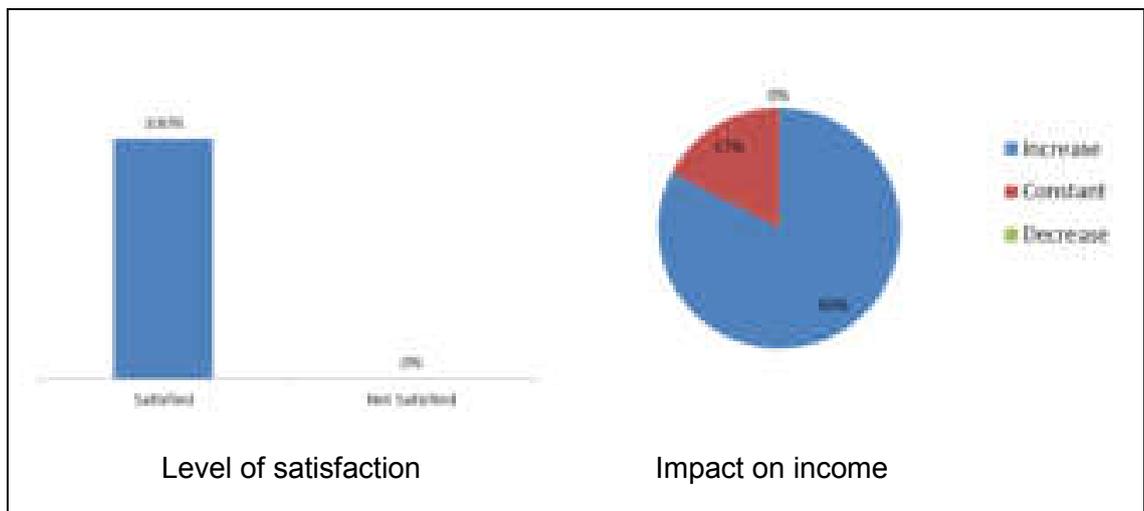

Further monitoring of IRRP batch 1 implementation was needed to ensure the sustainability and success of the program occurred.

The first monitoring was already conducted by Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan of Sekadau District on 26 September 2018, which was also followed by giving vaccines to chickens. The first monitoring result identified that all chickens given to the vulnerable group are in a good condition.

The second monitoring was conducted on 24 – 26 October 2018, which was also continued by vaccination to the chickens. It was executed by Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan of Sekadau District. The second monitoring result identified that there was about 17.5% of chickens dead. Most of them (76%) attacked by pullorum (*salmonella pullorum* bacteria). The remaining chicken died due to chicken snout, fighting, getting caught and starving.

From the monitoring result, it was known that the chicken husbandry program was not successful due to several reasons, namely:

1. The availability of chicken seeds and the distribution process were not easy because the location of beneficiaries is far away. The risk of stress was getting higher during the distribution process.
2. The chicken was easily attacked by bacteria even though vaccination has been given. The owners have to take good care of the chickens.

Therefore, the next program will be implemented in the form of distribution of pepper seedlings, fertilizer, farm equipment, and agricultural training. This program will be held twice, due to geographical factors which are scheduled during April to November 2019 and in the year of 2020 respectively. UIP Kalbagabar had submitted a proposal of the program to Communication Corporate and CSR Division in Letter No.3980/STH.02.02/ UIP.KALBAGBAR/2018, dated 8 November 2018.

In December 2019, PLN UPP 2, local government and the affected people in Balai and Tayan Hilir sub-district conducted a discussion regarding income restoration program. This will be delivered in the form of pepper agricultural. The affected people and the local government requested a program change, i.e. to implement catfish farming. The minutes of meeting regarding this issue are shown in Appendix 21.

The catfish farming program, included the distribution of catfish seeds, and assistances from the related services department and PLN. This alteration was already submitted by UIP Kalbagabar to Communication Corporate and CSR Division and waiting for the decision to be implemented. The program has been conducted simultaneously from September to October 2019. The acknowledgement of catfish farming program is presented in appendix 22.

The program was divided into 2 occasions. First, the distribution of catfish farming was held during 25 September 2019 – 15 October 2019, and the training itself with in total of 35 beneficiaries that belong to vulnerable group in Sanggau – Sekadau Transmission line was held in Gedung Balai Penyuluhan Pertanian Balai subdistrict-Sanggau on 16 October 2019. The detail of beneficiaries is presented in table 20.

Table 20 detail of beneficiaries of Catfish Farming CSR Program

No	Name	District	Sub District	Gender	
				Man	Woman
1	Selipang	Sanggau	Balai	1	
2	Romanus Roma	Sanggau	Balai	1	
3	Antonius Andi	Sanggau	Balai	1	
4	Matus Pauji	Sanggau	Balai	1	
5	Kuncit	Sanggau	Balai	1	
6	Liun	Sanggau	Balai	1	
7	Agnes Iyam	Sanggau	Balai		1
8	Kristina Serimi	Sanggau	Balai		1
9	Marina Mina	Sanggau	Balai		1
10	Antonius Jati	Sanggau	Balai	1	
11	Antonius Minar Tulai	Sanggau	Balai	1	
12	Yohanes James	Sanggau	Balai	1	
13	Rupinus Tului	Sanggau	Balai	1	
14	Leonardus Apoi	Sanggau	Balai	1	
15	Evardus Kuncang	Sanggau	Balai	1	
16	Sabinus Kancung	Sanggau	Balai	1	
17	Petrus Amak	Sanggau	Balai	1	
18	Tono	Sanggau	Balai	1	
19	Herkulanus Luko	Sanggau	Balai	1	

No	Name	District	Sub District	Gender	
				Man	Woman
20	Kanisius Jaher	Sanggau	Balai	1	
21	Stefanus Kenen	Sanggau	Balai	1	
22	Sukimin	Sanggau	Balai	1	
23	Emilia Linda	Sanggau	Balai		1
24	Nikolas	Sanggau	Balai	1	
25	Romanus Kusa	Sanggau	Balai	1	
26	Petrus Acan	Sanggau	Balai	1	
27	Darto	Sanggau	Balai	1	
28	Gunik	Sanggau	Balai		1
29	Adrianus Yayuk	Sanggau	Balai	1	
30	Wisono	Sanggau	Balai	1	
31	Sukardi B	Sanggau	Balai	1	
32	Rudiyanto	Sanggau	Balai	1	
33	Sukiman	Sanggau	Balai	1	
Total				28	5

In general, the measurement/ indicators of the Catfish Farming CSR program could be rated by self-assessment as follow:

Table 21 Measurement/ indicators of the Catfish Farming CSR program

NO	Indicator(s)	5 excellent	4 good	3 average	2 poor	1 Very poor
1	Participation of the society		V			
2	Program management agencies	V				

3.4 Funds Availability and Sourcing and Limitations to RCCP Implementation

Funds for the implementation of the RCCP are part of the project budget. Costs of updated RCCP have been estimated based on SKAI (Surat Keputusan Anggaran Investasi) UIP Kalbagbar and RKA (Rencana Kerja Anggaran) CSR 2019 UIP Kalbagbar.

Estimation cost is intended to provide PLN a basis for calculating the cost of resettlement, particularly compensation for affected assets. Therefore, during the Implementation Stage of the land acquisition process as mandated by the new Land Acquisition Law of 2012 and PLN Decree No.289.K/D/2013, the PLN UIP Kalbagbar had been appointed a licensed property appraiser to do a detailed property appraisal of all affected assets (land and ROW). The results of the work of the property appraiser will be used by the PLN LAC in negotiating with AHs for the levels of compensation regarding their affected assets. Table 22 provides a breakdown of the resettlement costs.

Table 22 The Cost of Resettlement for the Tayan – Sanggau – Sekadau up to December 2019

Particulars/Items	Estimated Budget (Rp)	Actual Budget (Rp)
Cash compensation for total land to be acquired and affected trees for 2 new substation (44,778 m ²)	12,643,087,410	12,643,087,410

Particulars/Items	Estimated Budget (Rp)	Actual Budget (Rp)
Cash compensation for total land area to be acquired for tower base (89,925 m ²)	8,480,383,200	8,480,383,200
Cash compensation for trees:		
- Small (2349 trees) - Huge (1466 trees) - Productive (2534 trees)		
Cash compensation for total land area will be restricted by the transmission line ROW (2,482,975 m ²)	109.002.000.000*	55,753,399,600
Cash compensation for structures:		N/A
- House (permanent) - Farm shed (temporary)		
Compensation for tall trees restricted by transmission line ROW		N/A
Compensation for crops		N/A
Cost for 1 st Batch of IRP (Chicken Husbandry) and training on farming.	200,000,000	200,000,000
Cost for 2 nd and 3 rd Batch of IRP (Pepper seedling) and training on agricultural.	535,000,000**	N/A
Tayan Hilir – Catfish Farming Cost		274,500,000
Kecamatan Balai – Catfish Farming Cost		367,450,000
Sub-total (direct costs)	130,860,470,610	77,718,820,210
Cost contingencies (15% of direct costs) which includes Appraisal Team and IMA	19,530,468,407	
-Appraisal for substations (Sanggau & Sekadau)		254,386,000
-Appraisal for Sanggau Substations (new)		53,636,000
-Appraisal for Tayan – Sanggau T/L		402,787,000
-Appraisal for Sanggau – Sekadau T/L		254,386,000
-Appraisal for Tayan – Sanggau T/L (ROW)		1,404,000,000
-Appraisal for Sanggau – Sekadau TL (ROW)		756,000,000
-ROW Inventory		4,802,270,000
-IMA	450,000,000	
Operational costs (3 % of direct costs)	3,925,814,118	1,777,196,160
Grand Total	154,316,753,135	87,873,481,370

*SKAI (Surat Keputusan Anggaran Investasi) UIP Kalbagbar

**RKA (Reencana Kerja Anggaran) CSR 2019 UIP Kalbagbar

3.5 Inclusion number of Affected People and their Asset

As mentioned above, to require land acquisition and implement construction activities, this project was funded by ADB-AFD loans. This land acquisition affected the community along the grid. Some of them lose their small part of their land; others lose more than 10% of their land. Also, they lose the ownership of trees in many variations that may be small, large, and productive. Restrictions on land use under the ROW corridor were also experienced by the people living in that location.

In the amount of 7,106,443.41 m² has been acquainted as the construction of tower base and substation along the grid, which belongs to 2,509 Affected Households and 17 institutions. There were also structures impacted by the ROW in a total of 5,911.75 m². Also, there were 567,750 trees impacted. The detailed data on number of affected people and asset can be seen in Appendix 23.

Table 23 Summary of Affected People and Their Asset

Package		Affected Land	Number of tower	Total Land Affected (sq. m)	Total Structure Affected (sq. m)	Number of tree	Household Land Owner	Institution Land Owner
No	Location							
1	275 kV Bengkayang-Jagoibabang TL (81.3 km)	Tower Base	201	145,974.70		21,734	236	
		ROW		1,817,427.59	1,080.48	126,911	175	3
2	275 kV Bengkayang Substation	SS		66.775			5	
3	150 kV Bengkayang-Ngabang-Tayan TL (142.4 km)	Tower Base	393	112,148.80			411	6
		ROW		2,623,187.18	2,355.78	404,204	1,344	
4	150 kV Ngabang Substation	SS		9.875				
5	150 kV Sanggau Substation	SS		22,304.00		2,453	3	
	150 kV Sekadau Substation	SS		22,474.00		5,956	2	
6	150 kV Tayan-Sanggau TL (77.58 km)	Tower Base	235	59,715.63		4,918	227	6
		ROW		1,494,999.85	1,172.33			
7	150 kV Sanggau-Sekadau TL (46.7 km)	Tower Base	125	29,162.50		1,574	106	2
		ROW		778,972.52	1,303.16			
Total				7,106,443.41	5,911.75	567,750	2,509	17

4. Awareness Services of PIC

PT PLN (Persero), as stated in the Project Administration Manual, required to assign an external monitoring agency to monitor the RCCDP and RCCP implementation and to analyze compensation payment principles, severity and vulnerability impacts to affected persons following the completion of RCCDP and RCCP implementation. The monitoring report was used to identify whether the compensation payments provided by PLN meet ADB IR policy principles and suggest to PLN if there is corrective action needed.

Special attention for the affected people (including: women, poor, and others vulnerable group) was prioritized by PLN. All affected peoples including poor and vulnerable group, community leaders, and local government participated in the socialization/consultations on the plan of the project and land acquisition. The consultation was taken place in all affected districts. The participants of the consultations include: affected persons, PT PLN (Persero), District Government, public appraisal company KJPP, MUSPIKA, village heads, Head of Dayak Customary Council (Dewan Adat Dayak-DAD, Army and Police as part of regional development guard team. The people invited were well understood about socialization contents like discussion and consultation in an atmosphere free of intimidation to reach a deal towards the value of compensation for their assets, that if the people had any objections, they can address it directly to PT PLN (Persero) by following the grievance redress mechanism.

PT PLN (Persero) intended to guarantee and secure the involvement of women in all process including in taking decisions during the project implementation by conduct some action as bellow:

- a. During the inventory of compensation, men and women were involved in discussions.
- b. Husband and wife were asked to attend the process of compensation payment and other aids as a consequence of the project to the family assets.
- c. Women were invited to consultation meetings, during an evaluation to decide an income restoration.
- d. Women were given the same chance as men to take part in the project as unskilled workers such as land cleaners or cooks for construction workers with similar salary and facilities as received by men.
- e. In the resettlement programme, women were prioritized for vulnerable and severally families.

ADB approved independent Monitoring Agency report in April 2017 for 275 kV Bengkayang – Jagoibabang and 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan (Phase 2). Internal monitoring report for the first stage of 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau was submitted in November 2017. Recently, The revised Independent Monitoring Agency (IMA) document stage 1 for the Tayan – Sanggau – Sekadau 150 kV SUTT Project has been submitted to ADB by letter no. 5634/KEU.05.02/010205/2019 dated 13 November 2019.

PLN actively monitored the IMA implementation of RCCP/ RCCDP as the institutional arrangement stated in PAM October 2019 as follow:

Project implementation organizations Management Roles and Responsibilities

· **Executing agency:**

PT Persero Perusahaan Listrik Negara [State Electricity Corporation] (PLN)

Responsible for overall project implementation including submission of the Withdrawal Applications, retention of supporting documents, and any reporting requirements, including, the annual audit report and financial statements.

· **Project Management Unit (PMU)**

Report to the Board of Directors through the Director of Planning and Risk Management; Responsible for overall procurement, planning, project supervision, monitoring, accounting, and consolidated reporting; Coordination with the Sarawak counterpart; And Selection, contracting, and supervision of project implementation consultants.

· **Project Implementation Unit**

PIU: GM PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat

Day-to-day supervision of Project implementation, including undertaking monitoring and reporting requirements as well as resolving environmental and social safeguard issues with the support of the PMU.

The entire stake holder involved to monitor the implementation of RCCP and RCCP and RCCDP.

PIC Social Specialists assisted to initially analyze the compensation payment principles of the RCCP’s implementation of Tayan – Sanggau - Sekadau. An additional survey was applied to affected people due to land acquisition for tower base in Tayan – Sanggau Sekadau transmission line and Sanggau – Sekadau substations.

Based on the land acquisition data of 360 tower plots in Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line, 12 towers belonged to institutions, 2 towers belonged to customary land owner, and 346 towers were private land. The area of 89,925 m2 has been acquired for the proposed project of the Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line as seen in Figure 2.

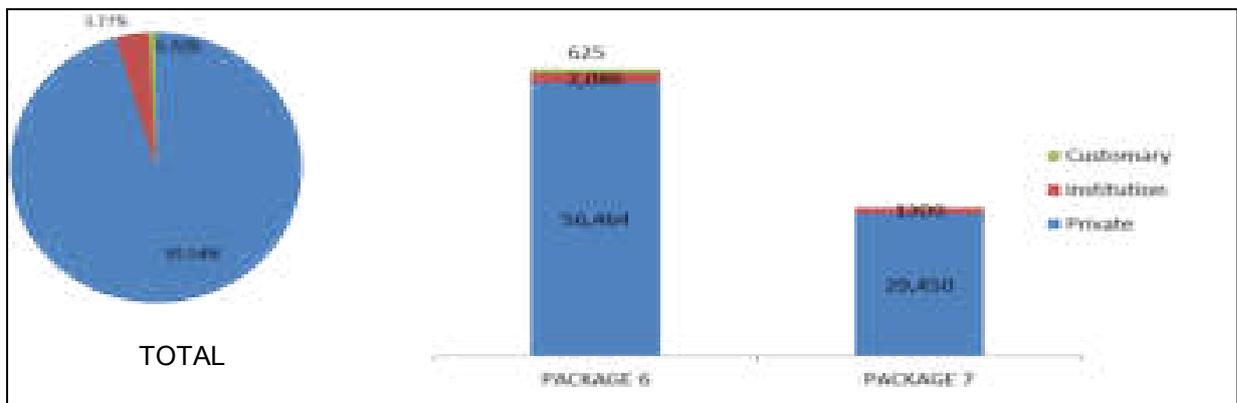


Figure 2 Affected Land Tayan – Sanggau – Sekadau Chart

Affected land Owner	PACKAGE 6			PACKAGE 7			TOTAL		
	Number tower	Width (m2)	Percentage	Number tower	Width (m2)	Percentage	Number tower	Width (m2)	Percentage
Private	225	56,464	95.42%	121	29,450	95.77%	346	85,914	95.54%
Institution	8	2,086	3.53%	4	1300	4.23%	12	3,386	3.77%
Customary	2	625	1.06%	-	-	0.00%	2	625	0.70%
Total	235	59,175	100.00%	125	30,750	100.00%	360	89,925	100.00%

PIC had conducted an additional survey within private landowner in coordination with UPP KBB 2, Sintang which was started in February up to May 2018. Total 282 of 340 APs (82.9%) had been interviewed.

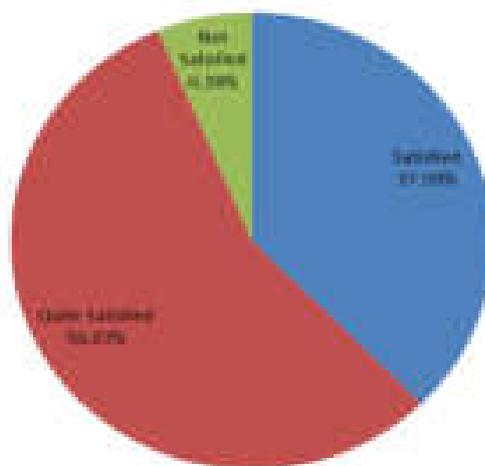


Figure 3 Tayan – Sanggau – Sekadau APs Compensation Satisfaction Chart

From the chart in Figure 3 above, it was found that more than half of affected people, i.e., 56.03% APs were satisfied with the compensation amount, 37.59% were quite satisfied and the rest of about 6.38% were not satisfied.

The level of respondent's satisfaction to the value of compensation was influenced by several factors, such as the number of family members, the income standard, the type of work, although most of them make a living as farmers and other factors.

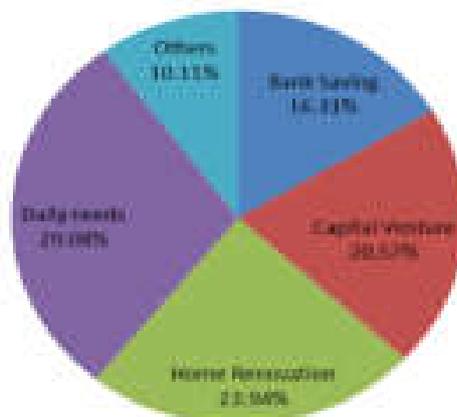


Figure 4 Tayan – Sanggau – Sekadau APs Compensation Use

Affected people used land compensation in various forms. Mostly used the compensation for daily needs, about 29.08%, followed by home renovation of 23.94%. As much as 20.57% APs used it for venture capital, to grow the business. About 16.31% APs used the compensation for saving. The remaining 10.11% APs used their compensation in other uses such as medical treatment, purchasing of goods, education and divided into their family.

The revised EMA report indicated In general, development of transmission lines of SUTT 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau and substations of Sekadau has contributed to the socio economic restoration of the affected households, including the vulnerable affected people such as women heading households.

IMA team has interviewed some affected vulnerable people and found that there have been improvement of the income and expenses of these peoples. One of the vulnerable affected peoples interviewee (Jati) stated that the compensation payment has been used for house repairs and the cost of rice mills. He said "...uangnya dipakai untuk rehab rumah dan ongkos penggilingan padi". Moreover, similar statement is also recorded from another vulnerable AP (Antonius) stating that the compensation money was used for house repairs. Sukimin who received compensation for his lost land, 20 m x 20 m, stated that he has spent the compensation money for house repairs and make a fishpond as a new income. He said: "...dipakai untuk membuat kolam ikan (nila, ikan mas) sebagai penghasilan baru."

Those expenditures reflect positive contributions of the compensation for the improvement of their social status and income including vulnerable-affected people.

5. Social Issue and Mitigation

Concerning PIC services, Social Specialist assisted PLN to conduct a series of consultations in the field. The first consultation meeting discussed about the project information disclosure. It meant to target the participation of generally impacted communities, affected households, and also to involve formal and informal leaders to the project activities.

The second consultation was more advanced, i.e. to address the needs of APs/landowners, witnessed by the government officials, police, and military officials. The socialization described the inventory of losses and how it was administered. Details of compensation policy for land, plants/crops, and other assets affected were also represented. The community was also informed about the PLN UPP KBB 2 internal land acquisition committee and the procedures for grievance related to the inventory of losses and the compensation to be paid.

Most of the social issues concerning land acquisition and clearing of the ROW corridor were about the landowners' claims, which were higher than the price offered for compensation. The majority of the land acquisition issues related to disputed parcels due to overlapping borders that impacted plant compensation, and that landowners did not agree with the price offered by PLN. The impact of rerouting towers also caused problems for land acquisition because LAC had discussed rapprochement with landowners for the original location. Therefore, a new process of land acquisition for the new location must be carried out.

Land acquisition issues caused problems during construction process since the landowners did not allow the contractor to work in the area before the problem was solved. PLN UPP KBB 2 continued conducting meetings with landowners, MUSPIKA, and head of Adat to resolve the land acquisition issues, and to get agreement from the landowners. The process to resolve the problems were crucial. In some cases, takes even a few months. A list of social issues found on site and their mitigation can be seen in Table 24.

Table 24 List of Social Issues found at Site and Mitigation

Transmission

No	Social Issue	Mitigation
1	Demand higher compensation	Negotiation conducted by PLN and coordinated with MUSPIKA
2	Disputed land	PLN coordinate with MUSPIKA and held meeting with dispute persons, facilitated by local leader.
3	Communities demand that their houses are connected to PLN distribution system	Include electrification of villages located near the 150 kV transmission line in list of villages to be electrified under grant measures.
4	Social conflict	Develop local empowerment opportunity during construction and develop local business by using local supplier for material for the construction of foundations.
5	Temporary loss as result of construction impact	Contractor compensates of temporary loss such as damage to structures, fallen trees and access road during the construction.
6	Customary tradition	Contractor financed the customary ceremony before cultivating land to start work construction, the ceremony called Paremahan tanah/Ngudas.

No	Social Issue	Mitigation
7	Shifting of tower location	PLN give the compensation money and coordinate with local government
8	Inappropriate valuation	PLN with appraiser check the actual condition and do revision of inventory
9	The access road was obstacle by owner	mediation with Contractor and Pusmanpro re-inform about compensation procedures
10	Assumption that PLN was not cooperated and open, traversing without permission to the owner	Mediation and the owner request that every action take place in his plot needs to be informed well.
11	The access road was damaged	The contractor coordinate with PLN repaired damaged roads

Substation

No	Social Issue	Mitigation
1	The dusty road around the access road to the substation	The contractor coordinate with PLN for watering the road using water reservoirs carried by dump trucks flows through a pipe that perforated
2	Dry mud on the substation access road	The contractor coordinate with PLN wiped the dry mud manually

Several issues have been mitigated and settled, and others are in progress of accomplishment as presented in table 25:

Table 25 List of Social Issues Action and Status

Transmission

No	Location	Issues	Action	Status
1.	T.199 (Iwan)	The access road being an obstacle by the owner since miss cutting inventory assets	Mediated by Contractor and PLN	Close
2.	T.138	The access road being an obstacle by the owner	Mediated by Contractor and PLN, re-inform about compensation procedures	Close
3.	Serinus (Bodok), T. 181- 182	The assumption that PLN was not cooperated and open, traversing without permission to the owner	Mediated by contractor and PLN. The owner request that every action take place in his plot needs to be informed well.	Close
4.	T.158	The access road damaged. The water tunnel has broken, because of material transport	The contractor has repaired damaged roads	Close
5.	T.181 & T.182	The access road damaged due to the rainy season so that the soil condition quickly changed to be moody	The contractor has repaired damaged roads	Close

No	Location	Issues	Action	Status
6.	T. 170 & T. 171	The access road to transport crop yields damaged	The contractor has repaired damaged roads	Close

Substation

No	Location	Issue	Action	Status
1.	Sanggau Substation	The dusty road around the access road to the substation	The program for watering the road using water reservoirs carried by dump trucks flows through a pipe that perforated. Watering duration 5-6 times a week	Close
2.	Sanggau Substation	Dry mud on the substation access road	contractor coordinate with PLN wiped the dry mud manually	Close

For the issues that in process of accomplishment please refer to table 16. The documentation of social issues in Tayan – Sanggau – Sekadau TL are presented in Appendix 20

PLN as Implementation Agency with the related stakeholder aimed to accommodate the entire grievance, despite of any challenges in the field. PLN provided a redress mechanism to cover any complaint from society. PLN had made every effort to minimize any grievance by following both the Indonesian Government Regulation and ADB policy. Also, the proposed project guided by the entitlement matrix of the project.

Table 26 presented the comparison of ADB's regulation in comparison with project policy and the actualization in the field. And Table 27 presented the entitlement matrix of the proposed project.

Table 26 Project Policy Principles

PRINCIPLES	INDONESIAN REGULATIONS: Law No 2/2012 and Implementing Regulations and other relevant law and regulations. PLN Decree 2016	ADB POLICY	PROJECT POLICY	ACTUAL
Level of compensation and bases of calculation: Depreciation of	Compensation will be provided based on valuation of independent appraiser for a parcel of land that includes i) land; ii) over ground and underground spaces; iii) building; iv) plants; v) objects related to land and/or; vi) other appraisable loss such loss of business, jobs, change	The rate of compensation will be calculated at full replacement cost that will be determined by an independent property appraiser experienced in assessing acquired assets. For involuntary resettlement, no deduction on taxes and administrative costs for affected lands, as well as	The principle of full replacement cost will be applied. In case of involuntary resettlement, capital gains tax and the costs of transferring ownership, including the cost of new land	Compensation for Sharecroppers is provided based on the losses at replacement cost. The principle of full replacement

PRINCIPLES	INDONESIAN REGULATIONS: Law No 2/2012 and Implementing Regulations and other relevant law and regulations. PLN Decree 2016	ADB POLICY	PROJECT POLICY	ACTUAL
affected structure value	<p>of profession, and moving costs. Tax incentive is provided to: a) person who supports the project; b) does not file a complaint related to project location determination and/or compensation. The law is silent on the issue of whether or not depreciation will be applied when calculating compensation for affected structures. While valuation standard set by Independent appraisers association (MAPPI, 2015) does not apply depreciation for physical condition of the affected building¹. For affected buildings, MAPPI applies <i>solatium</i> (emotional compensation) of 10% - 30% of the total compensation for physical loss.</p>	depreciation in the value of the affected structure will be applied.	<p>certificates, will not be deducted from the compensation of those who will lose lands. In case there will be deduction of tax for negotiated land acquisition, the deduction should be clearly consulted and agreed by the affected persons. Compensation at full replacement cost for affected structures will be determined based on the replacement cost of a new building without any depreciation².</p>	cost is applied. ROW and building compensation are communicated to the affected people and paid according to the valuation of an independent appraiser.
Compensation for sharecroppers	Compensation for sharecroppers or encroacher will be provided in by way of consultation to get agreement, maximum amount provided is 50% of the total value appraise by independent appraisal (Director PLN Decree No. 344 of 2016)	Compensation for affected non and non-land assets should be provided at replacement cost	Compensation for Sharecroppers be provided based on the losses at replacement cost.	Compensation for Sharecroppers are provided based on the losses at replacement cost. according to the valuation

¹Indonesia Valuation Standards 306 (SPI 306). Land Acquisition Assessment For Development for the Public Interest. Code of Ethics Indonesia Appraisers and Indonesia Standard, 2015, Jakarta, Gelora Karya Bharata, 2015.

² Compensation will be based on i) the market value; ii) transaction costs; iii) accrued interest; iv) transition costs and repairs; v) other applicable payments.

PRINCIPLES	INDONESIAN REGULATIONS: Law No 2/2012 and Implementing Regulations and other relevant law and regulations. PLN Decree 2016	ADB POLICY	PROJECT POLICY	ACTUAL
	<p>The Law No. 2/2012 and its elucidation clause 33 (f), Presidential Regulation No. 71/2012 stipulated that owners of trees/plans are entitled for compensation of affected trees/plants. Other appraisable loss (loss of business income, profession change) will be compensated according to appraiser's assessment.</p>			of an independent appraiser
High Risk of Impoverishment	<p>Not covered in the new Land Acquisition Law. However, the Law No. 11/2009 on Social Welfare and its implementing regulation Ministry of Social Welfare Decree No. 39/2012</p> <p>To cover or identify vulnerable / severely impacted people by the project as early as possible it can be covered in Social Impact Assessment of AMDAL as referred in Environmental Law no. 32/2009 and other relevant Government Regulation on Environmental Permits. .</p>	Particular attention must be given to the needs of poor APs and vulnerable AHs that face the risk of further marginalization and impoverishment.	Income restoration / livelihood rehabilitation measures or program will be provided to severely affected and vulnerable populations. Severely affected household and other vulnerable groups will be identified at land acquisition / resettlement planning stage. Livelihood improvement assistance will be provided to them through: Corporate Social Responsibilities (CSR) implemented by PLN UIP Kalimantan Bagian Barat or PLN Regional	Income restoration program was implemented based on the agreement between stakeholder, customary leader, and affected people (society around the project area).

PRINCIPLES	INDONESIAN REGULATIONS: Law No 2/2012 and Implementing Regulations and other relevant law and regulations. PLN Decree 2016	ADB POLICY	PROJECT POLICY	ACTUAL
			Office of West Kalimantan	
Public disclosure	Preparation by the acquiring institution of the land acquisition plan, the planning of land acquisition by the Office of the Governor, and the implementation of land acquisition by BPN will be carried out with the holding of public meetings and consultations, and the results of surveys and appraisal of affected assets will be disclosed to the public.	The draft and agreed LARP during the PPTA, and the draft and agreed updated LARP during project implementation will be disclosed to the APs/AHs and other stakeholders in accessible forms, languages and places. The same will be posted on the ADB website.	Pre-IOL and post-IOL consultations will be held with stakeholders and the entitled parties. The approved RCCP will be disclosed to the entitled parties and other stakeholders in accessible forms, languages and places. The same will be posted on the ADB website. Monitoring reports during Project implementation will likewise be posted on the ADB website.	Public disclosure has conducted by delivered the summarize of updated RCCP in the form of leaflet. It's also accessible in public places with the local language. This updated RCCP also posted on the PLN and ADB website.
Monitoring of Project Implementation	Government business procedures do require monitoring of the progress of land acquisition, and and its impact to entitled parties	ADB requires monitoring of LARP implementation by the executing agency for resettlement Category B projects, and by an independent external organization for resettlement Category B projects	Due to development of 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau Transmission Line is part of 150 kV Transmission Line Project Strengthening West Borneo Power Grid project, it was Category B for resettlement. External	PLN provide quarterly, semester, and annual report to monitor the resettlement implementation. The external monitoring has been provided for 1st phase and the second is still in

PRINCIPLES	INDONESIAN REGULATIONS: Law No 2/2012 and Implementing Regulations and other relevant law and regulations. PLN Decree 2016	ADB POLICY	PROJECT POLICY	ACTUAL
			monitoring of resettlement implementation is required. English versions of RCCP implementation M & E reports will be submitted to the ADB.	mobilization process.

Table 27 Entitlement Matrix

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
A. LAND LOSS						
1	Loss of land, including agricultural and residential land	Those who have formal legal rights (certificate) or those whose claim over the land is recognized as a full title including persons occupying the state land in good faith ⁴ .	<ul style="list-style-type: none"> Cash compensation at replacement cost and reflective of fair market value at the time of payment of compensation⁵; No deduction of any taxes and transactional cost. Land replacement with at least similar attributes to the acquired land in term of value, productivity, location, and titling⁶. Financial assistance for the renewal of land ownership documents (certificate and land documents recognized as full title) for the residual 	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal to conduct valuation of the assets.	Valuation of compensation conducted by a licensed independent property appraiser and it used for compensation payment by the Land Acquisition Implementing Team In case of the compensation rate established by the independent appraiser either for land or non-land assets (trees/crops. Timbers is not acceptable to the APs/AHs, PLN may determine compensation rate based on the cost of	PLN UIP Kalbagbar conducts acquisition of land and non-land assets based on independent appraiser valuation, assisted by all stakeholder and local government. Consultation and socialization clearly include, PLN also providing redress

³If the AHs doesn't agree with the amount of compensation which was appraised by the appraiser, PLN may set the value of the sale and purchase agreed by both parties based on the cost and benefit analysis with regard to good governance.

⁴It is in line with the Law No. 2/2012, Article 40, and its elucidation and the PP No. 71/2012, Article 17 – 25.

⁵See Law No. 2/2012, Article 36, PP No. 71/2012, Article 65. MAPPI's standard on Valuation for land acquisition

⁶for the development in the public interest.

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
			<p>area of the entitled persons' land⁷.</p> <ul style="list-style-type: none"> If the remaining affected land is no longer viable for specific use and utilization, the entitled party can ask for compensation for their entire land at replacement cost (UU No. 2 tahun 2012 Pasal 35).⁸ 		<p>benefit analysis For the negotiated land acquisition, in case there is deduction of tax as per government's requirements, the amount of the tax value and the deduction should be clearly consulted with and agreed by the APs.</p>	<p>mechanism for any grievance</p>
2	Loss of customary land	Customary communities (<i>masyarakat hukum adat</i> ⁹)	<ul style="list-style-type: none"> Cash compensation (at replacement cost) as per provisions compensation for loss of land above and ceremonial of land transfer 	<p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation LAC delivers compensation Independent Appraisal: conduct a valuation of the assets.</p>	<p>Consultation to get agreement of compensation has been conducted with customary members and customary leader witnessed by head of villages.</p>	<p>Intensive consultation with customary members and leader has been conducted to get agreement of compensation witnessed by head of villages and local government.</p>
B. LOSS OF STRUCTURE						
1	Loss of main structures (houses, offices, independent shops) and secondary structures (fences, driveways, extended eaves, sheds, etc.)	Owners of the affected structure, regardless of tenure	<ul style="list-style-type: none"> Compensation at full replacement cost that reflect prevailing market prices of materials and cost of labor for dismantling, transferring¹⁰ and rebuilding at the time of compensation payment. No depreciation should be applied For partially affected structures, the cost of repairing the residual unaffected portion of the structure in addition to the compensation at 	<p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conduct an valuation of the assets</p>	<p>Valuation is determined by an independent appraiser 3 months advance notice is given to the entitled party prior to the date on which they must demolish their entirely affected houses or shops. If more than 50% of the main structure is affected, the entire structure will be replaced at full replacement cost. If less than 50% of the main structure is</p>	<p>PLN UIP Kalbagbar conducts acquisition of land and non-land (including structures) assets based on independent appraiser valuation, assisted by all stakeholder and local government. Consultation</p>

⁷See MAPPI's valuation standard.

⁸Article 35 of Law No. 2 of 2012 and Article 67 of the PP 71/2012.

⁹ Customary or indigenous community is a community that is characterized by; i) the existence of group of people who are still bound by customary legal order as a whole community of an alliance with a particular customary law, who recognizes and implements the tradition in their daily life; ii) the existence of certain customary lands, which are the environment of the customary community and the area where they take their daily needs; and iii) the existence of common law regarding the maintenance of order, dominance, and applicable customary land use adhered by the members of the community. PP No. 71/2012, Article 22.

¹⁰Elucidation Article 33 UU No 2/2012

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
			<p>replacement cost for the affected portion of the same¹¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compensation for affected electric, telephone, and other services based on prevailing cost of disconnection and re-installation¹². • No depreciation of affected structure value. 		affected, but would endanger the stability of the residual area of the main structure, that is, structurally unstable, then the project will compensate at full replacement cost of equivalent structures.	and socialization clearly include, PLN also providing redress mechanism for any grievance
C. LOSS OF TREES/CROPS						
1	Loss of Crops and Trees:	Owners, regardless of land tenure status (with certificate or recognizable rights, informal dwellers, occupants).	<p>Annual crops: cash compensation will be paid based on prevailing market rates. Perennial crops: compensation at replacement cost taking into account their productivity and age. Timbers/trees: compensation at current market rate based on age, type of trees and diameter of trunk at breast height.</p>	<p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation of affected crops LAC delivers compensation</p> <p>Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.</p>	<p>Commercial crops: referring to income approach using Discounted Cash Flow (DCF) for 1 cycle Noncommercial crops: Will adopt market approach with standard reference prices issued by the local government. Valuation of non-productive plants will use cost approach; 30 to 60 days advance notice will be issued to owners before land clearing.</p>	PLN UIP Kalbagbar conducts acquisition of land and non-land assets based on independent appraiser valuation, assisted by all stakeholder and local government. Consultation and socialization clearly include, PLN also providing redress mechanism for any grievance.
D. Affected Asset under Transmission Lines						
1	Agriculture and or residential land	Land owners with legal title or Traditional title (<i>customary land</i>).	Compensation in the amount of 15% of the current land value for land area under the transmission line. Without any deduction of tax.	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation of restriction land PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.	The calculation of compensation for land use restriction in the ROW will be carried out by independent appraiser	PLN UIP Kalbagbar conducts acquisition of land and non-land assets based on independent appraiser valuation, assisted by all

¹¹Article 33 Law No. 2 Tahun 2012 and Indonesia Valuation Standards (SPI 306) 2013

¹²Article 33 of the Law No. 2/2012 and MAPPI's valuation standard 2013

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
						stakeholder and local government. Consultation and socialization clearly include, PLN also providing redress mechanism for any grievance
2	Main structures (houses, offices, independent shops) and secondary structures (fences, driveways, extended eaves, sheds, etc.)	Owners of the affected structure, regardless of tenure	Compensation in the amount of 15% of full replacement cost reflects prevailing market prices of materials and cost of labor for dismantling, transferring and rebuilding at the time of compensation payment of building area under the transmission line. No depreciation should be applied	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation of restriction structure PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.		PLN UIP Kalbagbar conducts acquisition of land and non-land assets based on independent appraiser valuation, assisted by all stakeholder and local government. Consultation and socialization clearly include, PLN also providing redress mechanism for any grievance.
3	Trees more than 5 m tall	Owners, regardless of land tenure status (with certificate or recognizable rights, informal dwellers, occupants	Annual crops: cash compensation will be paid based on prevailing market rates Timbers/trees: compensation at current market rate that will consider age, type of trees and diameter of trunk at breast height	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat will allocate funds for compensation of affected crops PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.	Commercial crops: referring to income approach using Discounted Cash Flow (DCF) for 1 cycle Noncommercial crops: Will adopt market approach with standard reference prices issued by the local government. Valuation of non-productive plants will use cost approach;	PLN UIP Kalbagbar conducts acquisition of land and non-land assets based on independent appraiser valuation, assisted by all stakeholder and local government. Consultation

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
						and socialization clearly include, PLN also providing redress mechanism for any grievance.
E. Temporary/Permanent Impacts of Land & Non-Land Assets during Construction						
1	Temporary or permanent impacts due to construction activities	For those who have formal legal rights (certificate) or those whose claim on land is recognized as a full right	For lease payments of the affected land by the contractor based on the applicable rental fees and agreements with landowners. For temporary impact on productive land, the AH may choose: (1) cost of the rental valued to be not less than the net income that will be generated from productive affected land; Compensation for non-land assets acquired (trees / plants, structure) permanently affected will be compensated at replacement cost Land will be restored to pre-project conditions or even better after the construction is completed	The contractors.	30-60 days prior notice given to the owner of the land before it is used temporarily by contractors. This provision should be stipulated in the contract / agreement with civil works contractors	No permanent
		Those who do not have legal rights and entitlements that can be recognized as full ownership	There is no land rental costs during the period of impact Land will be restored as it was before the project, or even better.	The Contractor		
F. Other Losses						
1	Loss of emotional attachment to assets (<i>solatium</i>)	Entitled party who loses emotional bond with the affected assets (land, structures, and plants)	Additional compensation of 10% - 30% of total compensation for physical assets affected.	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat will allocate funds for <i>solatium</i> fee PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.	Percentage of emotional loss compensation will be based on the independent appraisal assessment	PLN UIP Kalimantan conducts acquisition of land and non-land assets based on independent appraiser valuation, assisted by all

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
						stakeholder and local government. Consultation and socialization clearly include, PLN also providing redress mechanism for any grievance
2	Transaction Cost	The entitled party who lost land and non-land assets	Allowance to cover administration cost, renewal of land ownership (ownership name transfer) for residual land, land clearing ¹³	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation of affected crops PLN Land LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts appraisal on the appropriate transaction costs	Calculations are based on DMS and SES	PLN UIP Kalimantan conducts acquisition of land and non-land assets based on independent appraiser valuation, assisted by all stakeholder and local government. Consultation and socialization clearly include, PLN also providing redress mechanism for any grievance.
3	Loss of the resource base (high risk of impoverishment)	Entitled Party who lost of 10% or more of total assets or earning revenue sources; Entitled Party, poor and vulnerable ¹⁴ , regardless of the severity of the impact	Participate in Income restoration program (IRP) Priority for opportunities of project related employment, where qualified.	PLN corporate social responsibility (CSR) program PLN UIP Kalimantan Bagian Barat or PLN Regional Office of Wet Kalimantan integrated in non-structural components of the program. The Contractor: work related project	IRP already given for 1 st batch in Sept 2018 in the form of chicken husbandry and training of it. The 2 nd and 3 th batch will be given after the monitoring of the 1 st batch implementation,	PLN continuously monitor and conduct IRP periodically to ensure that at least, their standard of living will not be worse off due to the loss of their assets and livelihood by

¹³See Standard Penilaian MAPPI, SPI 306, 2013.

¹⁴ These are distinct groups of people who might suffer more or face the risk of being further marginalized due to the project and specifically include: i) households that are headed by women, ii) household heads with disabilities, (iii). Indigenous peoples and iv) elderly household heads.

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
						the project. IRP for Pack 1 has been given since April- November 2019. And for Pack 6 and 7, irrp has been conducted from September to October 2019 in the form of catfish farming.

PT PLN (Persero) has fully-paid all compensations for the affected land and non-land assets owned by the affected persons (APs) in accordance with the agreement between the affected people and PT PLN (Persero) following the mechanism set in the applied regulations and policies for the project. Compensation payment of lands, structures and crops conducted by PT PLN (Persero) as depicted from the initial surveys with the affected people based on appraiser valuation. The example of appraiser valuation is presented in appendix 25.

PT PLN (Persero) expects the compensation will increase socio economic status of the affected people. Therefore, PT PLN (Persero) commits to take responsibility to pay all taxes towards all affected lands.

Compensation process was conducted on the basis of fairness and equality, men as well as women and also vulnerable group have the same rights and were given the same opportunity to take part on all processes.

Socio economic status of the affected people in general increased as a result of positive and sustainable allocations of the compensation they made. In addition, it is depicted that the compensation was spent mainly to maintain their rights by purchasing new land and to develop new income, for example, starting a small grocery shop (warung), also to improve their social status such as refurbishing their house and purchasing motorcycle.

6. Electricity distribution program under Grant measures

The electricity distribution program under the Grant measures covered 18 villages and sub-villages in the three districts Bengkayang, Landak, and Sanggau. At present these sub-villages use generators managed by each head of the village. Only 5 of the listed 18 sub-villages were located in the project area of the Bengkayang – Ngabang – Tayan transmission line and none in the area belongs to the 275 kV transmission line. The other 13 villages were far away from the project sites, and most sub-villages were surrounded by Tembawang (adat forest).

The grant was actually provided for improving access to electricity through extension of the 20 kV and low-voltage network along the transmission line routes in order to support electricity connection to several selected non-electrified communities. Even though the cost of electricity installation was expensive for the community, about 50% of the households had made an effort to pay the cost of electricity installation in 2 or 3 installments. The remaining 50% of households did not request for electric installation yet, because they were not able to pay the installation cost. The community expected to get connected to PLN's supply system as the transmission line passes their village such as Napal, Amboyo, and Angan village. The Angan Village had 20 towers. They were located in Section Bengkayang – Ngabang, but there was still no electricity supply. Amboyo village had 23 towers (tower no. 208 to 230) and had no electric supply either. In June 2017, PIC visited to 3 communities in the project area which demanded electricity i.e., Amboyo Utara, Napal and Ansang (Ado). At present, these 3 villages have completed electrified.

The progresses of the used grant are:

1. Construction along 52.973 km MVTL and 46,760 km long LVTL with 21 units of distribution transformer has been completed in 11 villages within 3 sub-districts.
2. Payment has been made for the entire contract.
3. There are 1.588 households (as of October 2019) connected to MVTL and HVTL networks of grant funds, while for home-to-home network connection depends on each household to pay for the installation fee.

The details of grant beneficiaries are shown in the table below:

Table 28 Data Grant 3054-INO: Strengthening West Kalimantan Power Grid Project

NO.	LOCATION					NETWORKS (KMS)		SUBSTATION (KVA)			POPULATION	CONNECTED CUSTOMERS				REMAINING POTENTIAL CUSTOMERS
	UNIT	SUB VILLAGE	VILLAGE	SUB DISTRICT	REGENCY	MVTL	LVTL	25	50	100	(KK)	31-Oct-2018	13-Nov-2018	30-Jun-2019	16-Oct-2019	
1	UP3 SKW	Tengkurap	Poteng	Teriak	Bengkayang	0,62	3,85	-	1	-	169	81	97	108	108	61
2	UP3 SKW	Punti	Poteng	Teriak	Bengkayang											
3	UP3 SKW	Bana	Bana	Teriak	Bengkayang	1,84	2,20	-	1	-	109	52	77	106	106	3
4	UP3 PTK	Kemayo	Kampet	Banyuke Hulu	Landak	2,70	2,95	-	1	-	91	40	43	49	70	21
5	UP3 PTK	Baban	Kampet	Banyuke Hulu	Landak	-	1,60	-	1	-	52	17	19	24	24	28
6	UP3 PTK	Napal	Darit	Menyuke	Landak	-	1,55	-	1	-	23	25	24	30	30	-
7	UP3 PTK	Labur	Papung	Jelimpo	Landak	2,60	1,60	1	-	-	213	76	219	219	219	-
8	UP3 PTK	Mandor Kiru	Mandor Kiru	Jelimpo	Landak	7,85	2,60	-	1	-	280	171	182	182	188	92
9	UP3 SGU	Selandak	Tebang Benua	Batang Tarang	Sanggau	3,01	2,75	-	1	-	43	30	30	27	27	16
10	UP3 SGU	Semoncol	Mak Kawing	Batang Tarang	Sanggau	3,34	3,65	-	1	-	125	125	82	82	93	32
11	UP3 SGU	Sei.Adon, Terentang, Penyakat	Subah	Tayan Hilir	Sanggau	15,31	12,61	-	5	1	291	293	293	293	293	-
12	UP3 SGU	Melugai	Emberas	Tayan Hilir	Sanggau	8,39	7,32	-	3	-	144	151	153	153	153	-
13	UP3 SGU	Jeramun	Sejotang	Tayan Hilir	Sanggau	1,01	1,17	1	-	-	94	46	47	47	48	46
14	UP3 SGU	Batu Besi, Yongkok, Pulau Legoh	Sejotang	Tayan Hilir	Sanggau	6,31	2,91	1	1	-	211	211	216	226	229	-
Jumlah						52,97	46,76	3	17	1	1.845	1.318	1.482	1.546	1.588	299

Grant 0354-INO. The grant account was physically closed on 31 July 2017 with savings of \$335,202.37 and financially closed on 18 December 2017. As of December 2019, there were 1,588 households connected to ADB 52.973 km MV and 46.760 km LV lines. The grant beneficiaries were located in Bengkayang, Landak and Sanggau sub-districts. However, in Sanggau sub-district, the villages were not reversed by the 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau transmission line route. Thus, the grant beneficiaries were not the vulnerable and severely affected people who received the CSR program of the Tayan-Sanggau-Sekadau project.

Director-General of Electricity published new policy to impose a discounted rate for household connection for communities in the outer and isolated area of Indonesia. PLN was planning to implement 'Pemasaran Keliling/ Field Marketing' to increase the number of household connections.

According to the letter from ADB No.02/G.0354/17 dated 18 December 2017 regarding Grant 0354-INO: West Kalimantan Power Grid Strengthening Project - Grant Account closing stated that the grant had been closed.

7. Indigenous People/Custom Community in Project Location

Often a social problem is related to local tradition and culture which are hardly understood by other people (outsiders) who are engaged with the technical work. This type of issue sometimes is also considered as irrational by the contractors as it bothers their work. However, culture should be interpreted as a set of idea-behavior and behavioral outcome, which holistically has been institutionalized and believed by the people that support cultural values.

Tower construction is considered as interfering in nature and the balance of religious life, thus it should be accompanied by activities such as ritual or traditional ceremony. However, not all community groups supporting the culture and tradition are requesting ceremonies. Normally if there are traditional ceremony requests that potentially burden the project implementation progress, coordination with local government, MUSPIKA, and Dewan Adat Dayak (DAD) will be organized as a precaution to avoid exploitation of traditional rituals by non-qualified groups. PLN has convinced DAD about the importance and benefit of construction of the electricity network in the sub district of Seluas area at West Kalimantan. PLN also conducted socialization in each sub district along the construction area.

The implementation of Adat activity before the project started is important and the time for the Adat activity is decided by the customary leader and all cost are financed by the contractor. The construction works are often disrupted because cultural activities have to be performed in almost every banuaq (culture territories). By the lesson learnt of social cases which result from the implementation of Adat activity, contractors have already understood, follow the Adat/ customary rules and more careful to work at the area within Adat rules.

In the project area of the 150 kV transmission line the demand of adat ceremony is not as frequent as in the project area of the 275 kV transmission line. Demand for compensation for adat ceremony only occurred when Dewan Adat had to be involved in resolving social issues. Sometimes, the villagers who work to cut trees do not want to work before Adat ceremony was held.

Up to now, the Dayak indigenous of West Borneo still preserve their local traditions which are heritages of their ancestors. Almost in the entire life cycle they pass through a series of traditional rituals, either individually or as community. Traditional activities are more visible since reformation era; since then there is more flexibility and discretion in life related to ritual and spiritual traditions. In West Borneo it is characterized by the existence of the Dayakologi Institute, an institution that is managed by a number of academics and Dayak cultural figures with the aim to keep inventory, documenting, protecting and continuing the ancestor's tradition of cultural heritages. In fact, ritual ceremony that relates to a series of traditional ritual in Dayak culture is getting stronger but there are also people who take advantage of rituals for their personal gain. In these cases Dayakologi Institute plays its role. Since the beginning, Dayakologi Institute always socialized and motivated the society to preserve culture and minimize its misuse. In order to make the implementation and control easier, each area has its territory and cultural leader

Related to this issue, contractors or PLN representative will be called by Tumenggung or cultural leader to discuss about the culture to be respected before constructing towers. A series of traditional ritual ceremonies has been held namely traditional Paremahan or Ngudas tanah ceremony. Ngudas is a very important ceremony for indigenous people which are a form of respect to the Almighty Power (Jubata) which is held when opening or cultivating land. Ngudas also means of requesting permission for when conducting cultivation of land, the Almighty protect

and keep workers away from disturbance and distress depending on rules of each region. In practice, the invitation or announcement is delivered by local government (usually Headman or Sub-district Head) for legality and administrative records. Financial matters are covered by the contractors, while traditional ritual is carried out by local cultural institution.

Before the ritual of Ngudas is performed, coordination and consultation has been conduct between the local government, cultural institution, contractor and PLN about payment of the cost for the ceremony. The requested fund is sent to the contractor through Sub district or Village. If all preparations have been done, the invitation is sent out. All of the people around the project area were invited including the representative of adat, local government, the contractor and PLN board.

After Ngudas held as the instruction of the adat leader, the indigenous people around the project area feel restful and expect that the project will be save and implemented well also give the positive impact in their livelihood. Ceremony of Ngudas has been conducted in several villages; after the traditional rituals are done, local government prepare a report as the evidence that the area is practicing traditional rituals.

In this monitoring period, Ngudas was held several times in two villages. First, Ngudas was held in Kawat village, Tayan Hilir on 26 October 2019. Afterward, Ngudas conducted at Sungai Mawang Village related to ROW alignments in August 2019. Moreover, the last Ngudas for this period was held in December 2019 in Sebarra Village as the permission, due to the alignment traversing sacred cemetery. The documentation of Ngudas Ceremony is shown in Appendix 24.

8. Actions and Strategies Developed to Improve the Project Social

The key areas that have been addressed to improve project implementation performance including:

- **Land preparation/clearing vs. tradition, cultural string of home living:** Managing problems that relate to preparing land, cutting trees for interest of the project. The understanding of social aspect of culture especially cultural problem in Dayak people's live will be the key-opener to the implementation of social communication with the community, through Focus Group Discussions (FGD). During the operation of the project, contractors has already built good relationship with local people and taking care all tradition customs as demand of community before starting work of construction.

At the other issue concern to cutting trees process which conduct by sub-contractor need to supervise intensively by main contractor and PLN specifically in Tayan-Sanggau-Sekadau Project (which is still in construction phase) to avoid wrong cutting trees as this issue could arise as obstruction. For Bengkayang -Ngabang-Tayan project which have been in operation phase, there were no activities related to land clearing. Any issues during land clearing have been resolved in proper handling.

Social compensation: The preparation of some social compensation programs to muffle the possibility of distractions and social conflict either emerged from their own society or outside society that will disturb the project. This social compensation passing through some steps discussion and FGD (socialization) that prioritize "need" rather than "want". People should understand those aspect. Thus, PIC already conducts prior survey concerning in vulnerable and severely affected people need. Concern to social compensation that will be implemented through income restoration program to some severely and affected vulnerable people. PLN has made the list of vulnerable and severely people as beneficiaries of income restoration program. Furthermore, the beneficiaries of income Restoration Program have been monitored and assisted during the implementation of the project.

- **Grievance Mechanism:** On second socialization phase, Land Acquisition Committee must ensure the procedure are in place to allow affected people to lodge a complaint or a claim with the assurance of a timely and satisfactory resolution of that complaint or claim. In addition, the project may have to make special accommodations for women and members of vulnerable groups to ensure that they have equal access to grievance redress procedures. Such accommodation may include employment of women or members of vulnerable groups to facilitate the grievance redress process or to ensure those groups representing the interests of women and other vulnerable groups take part in the process.
- **Coordination:** Implementation of coordination with some parties who control such land that might be affected by project activity through:
 - i. Religious leaders, public figures, women, youth, etc., in locations controlled by people and or prone locations, cultural reason, etc.
 - ii. Traditional leaders, traditional institutions, etc., especially in a number of locations that are considered sacred with trust system, and the locations also have some cultural heritages.
 - iii. Government institutions that control the land such as Ministry of Forestry, school, local government, etc.
 - iv. Government institution and other institutions that dominate important and vital objects in the project sites such as Armed Forces Institute (TNI).

All concerned project stakeholders have to increase their participation. And actively involved in each socialization and coordination held by PLN.

- **Social empowerment and community development for impacted community and executive power:** This activity was not meant for the direct impact of the project activities, but it could be in a form of social compensation that was given (if any). A number of activities such as counseling, saving electrical energy, training for facility managers, sanitary facilities, counseling for Cleanliness and Health, Clean Water and Sanitation Community-based (SANIMAS) for society, women's groups, etc

One positive impact during the construction works was the establishment of new small businesses i.e. temporary small shops near to the substation, increase of income for food stall surrounding the tower locations. The contractor also rented a house from the local people around the project area that gave additional income. The contractor gave the opportunity for people who live nearby the construction site to provide foods for workers. The contractor also used employed local people for foundation works, material transport, and security to guard machines and material, and local public communication.

The contractor hired local people by coordinating with the Head of Village. The contractor prioritized the vulnerable and severely affected people to be employed in the project implementation. Village leader or local youth leader organized people who can work in the project. Because the skills of local people were limited, the contractor could only offer general work. Most workers were recruited from Java, because they had more experience of working in transmission lines construction.

Key timelines shown in Table 29 are pertinent to note under social safeguards

Table 29 Key Timelines Associated with Social Safeguards Imperatives for all Packages

No	Subject	Person in-charge	Timeline	Remarks
SOCIAL SAFEGUARDS – Packages 1-4				
1.	Submission of a standalone report on implementation of IRRP to mitigate payment gap for land use restriction in Package 1	UIP Kalbagtim	15 November 2019.	Close, Incorporated in Semiannual Social Report sem 2. Please see appendix 5
2.	Land ownership updates a. Coordination between UIP and PPT b. Detailed status update (total number and progress) of land ownership document (SKT and certificate). To be reported in S2/2019 monitoring report.	UIP Kalbagtim and UIP Kalbagbar	a. November 2019 b. Jan 2020	a. Close b. Bengkayang-Jagoibabang certification progress: Verification of compensation payment document for tower base Bengkayang-Ngambang-Tayan Certification progress:: Total of tower base = 407 Issued certificate = 0 Application for Certification = 21 Certification progress of Ngambang Substation: verification of Balik Nama registration document in BPN Landak (already registered on 26 February 2020)


No	Subject	Person in-charge	Timeline	Remarks
3.	Update implementation progress on actions set in the Forestry Land Use Permit (IPPKH) in Social Monitoring Report Sem 2, 2019	PPT, UIP, PIC	January 2020	Close. Incorporated in Semiannual Social Report sem 2. Please see Table 6. Appendix 9 Over all progress up to January 2020 was 40 % Update: PNBP payment the 4 th year (2020), already paid in 15 January 2020 Rehabilitation of DAS already contracted in December 2019
4.	Availability of 2019 monitoring reports in Bahasa Indonesia in UPP and make them available to the APs	UIP Kalbagbar, Kalbagtim, PIC	a. Starting November 2019	Partially, the draft in Bahasa is available, but not delivered yet. Delivery target of the document is in the end of March 2020
SOCIAL SAFEGUARDS – Packages 5-7				
5.	Land acquisition compensation payment for 3 remaining land plots (T 24, T16 AR, T67) for Package 7 (towers)	UPP	December 2019	On Progress, Compensation payment for tower base scheduled to be completed in February 2020
6.	ROW: Compensation payment a. Package 6: Payment for 9 spans (10 plots) a. Package 7: Payment for 15 spans (29 land plots)	UIP, UPP	a. December 2019 b. January 2020	Close, ROW payment for 360 Span (Pack 6 & Pack. 7) already complete 100%
7.	Acceleration of land ownership updates a. Coordination between UIP and PPT b. Coordination between PPT and KATR/BPN c. Issuance of 3 PLN's certificates for substations d. Detailed status update (total number and progress) of APs land ownership documents (SKT and certificate). To be reported in S2/2019 monitoring report with evidences	UIP Kalbagtim and UIP Kalbagbar	a. November 2019 b. Starting November 2019 c. December 2019 d. Jan 2020	a. Close b. Close c. Certification progress of Pack. 5: • Sanggau Substation → The issuance of SK Hak from Kanwil Kalbar • Sekadau Substation → HGB

No	Subject	Person in-charge	Timeline	Remarks
				<p>certificate issued</p> <p>d. Certification progress of Pack.6: Total tower base = 235 Certificate issued = 5 On process = 9</p> <p>Certification progress of Pack. 7: Total tower base = 125 Certificate issued = 28 On process = 27</p>
8.	<p>IRRP implementation.</p> <p>a. SKOM HQ approval for proposed IRRP batch 3rd for 59 APs in Package 6 and 3 APs in Package 7 (SS Sanggau)</p> <p>b. Implementation of IRRP Batch 3rd</p>	UIP Kalbagbar	<p>a. February 2020</p> <p>b. April-August 2020.</p>	<p>a. On Progress agreement from PLN HQ</p> <p>b. Close. Incorporated in Semiannual Social Report sem 2. Please see appendix 22</p>
9.	<p>a. Disclosure of Sem 1, 2019 internal monitoring reports on PLN website</p> <p>b. Official submission of the final 2017 EMA report to ADB</p> <p>c. Disclosure of 2017 EMA report on PLN and ADB websites</p> <p>d. Official submission of the final stage 1 EMA report for Package 5 – 7 (land acquisition of tower plots) to PLN and ADB</p> <p>e. Mobilization of stage 2 EMA (TL rights-of-way)</p> <p>f. Submission of draft stage 2 EMA report to ADB.</p>	<p>KRKAL, K3L, PPT</p> <p>PPT, UIP Kalbagbar K3L, AKO KRKAL, K3L, PPT, ADB</p> <p>PPT, UIP Kalbagbar, K3L</p> <p>UIP Kalbagbar</p> <p>PPT, UIP Kalbagbar</p>	<p>a. 8 November 2019</p> <p>b. 8 November 2019</p> <p>c. 15 November 2019</p> <p>d. 8 November 2019</p> <p>e. Fourth week of November 2019</p> <p>f. March 2020</p>	<p>a. Close</p> <p>b. Close, submitted on 13 November 2019</p> <p>c. Close</p> <p>d. Submitted on 13 November 2019</p> <p>e. Deploy in December 2019, targeted to be finished in March 2020</p> <p>f. On Schedule</p>
10.	Briefings on social safeguards need to be conducted to the contractors.	UIP Kalbar, Pusmanpro	November 2019	Close, has been Conducted in weekly meeting


APPENDICES

Appendix 1 Project Organization Charts


PROJECT ORGANIZATION CHART

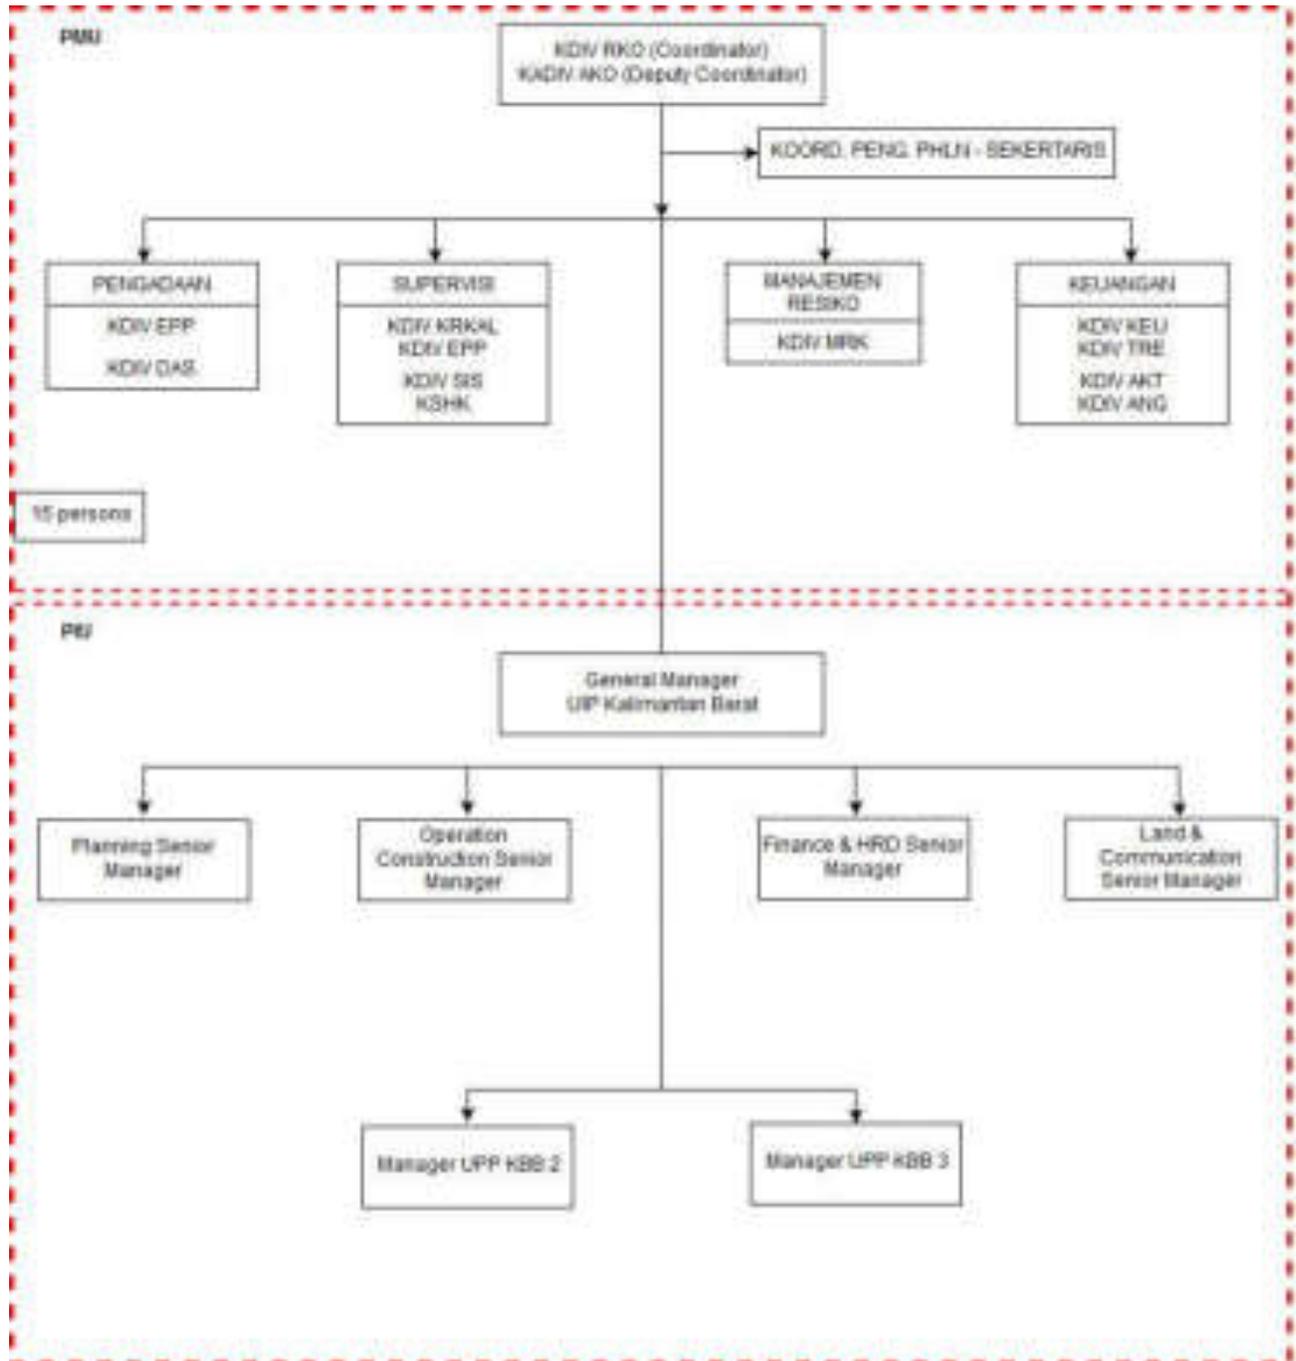


ORGANIZATION CHART OF PT PLN (PERSERO) UIP KALBAGBAR

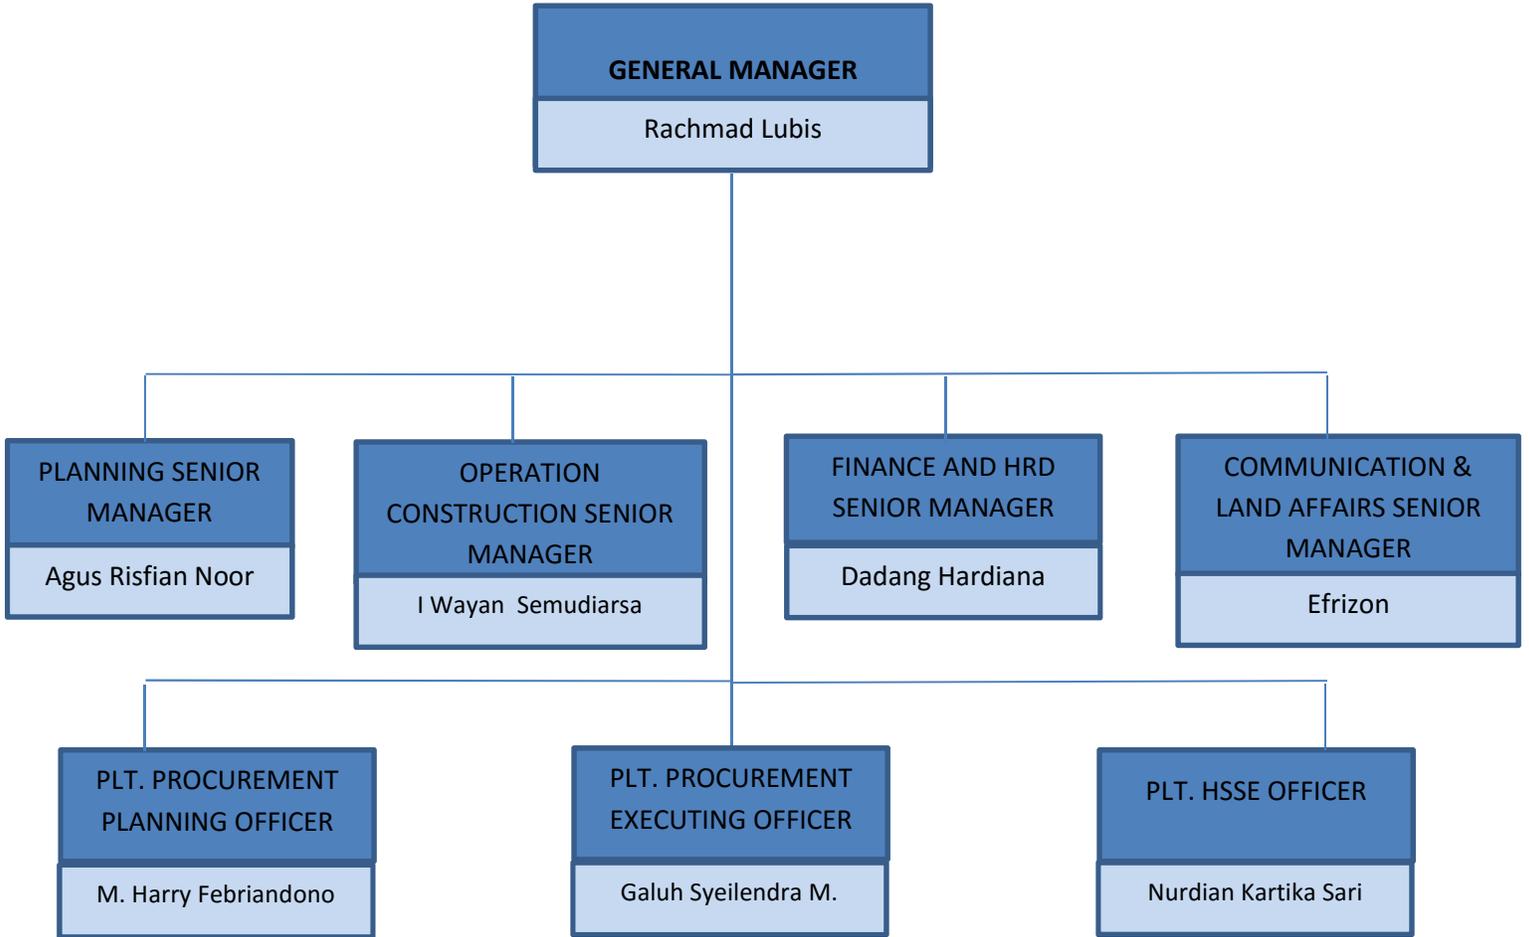

ORGANIZATION CHART OF PT. PLN (Persero) UPP KALBAGBAR 2

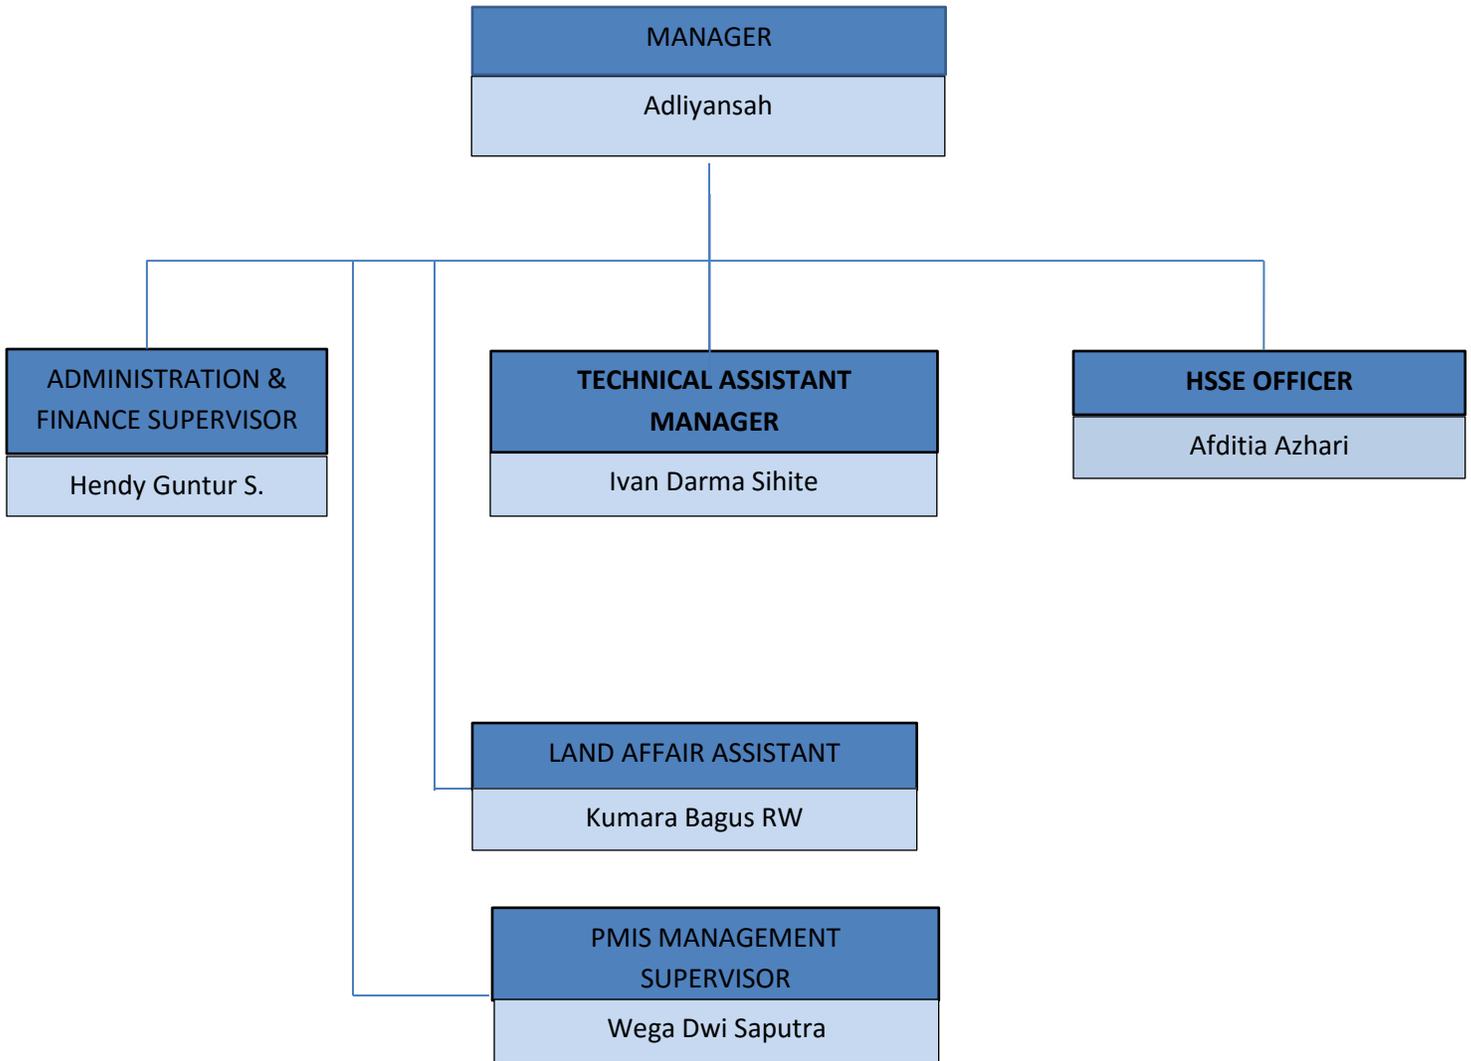


ORGANIZATION CHART OF PT. PLN (Persero) UPP KALBAGBAR 3

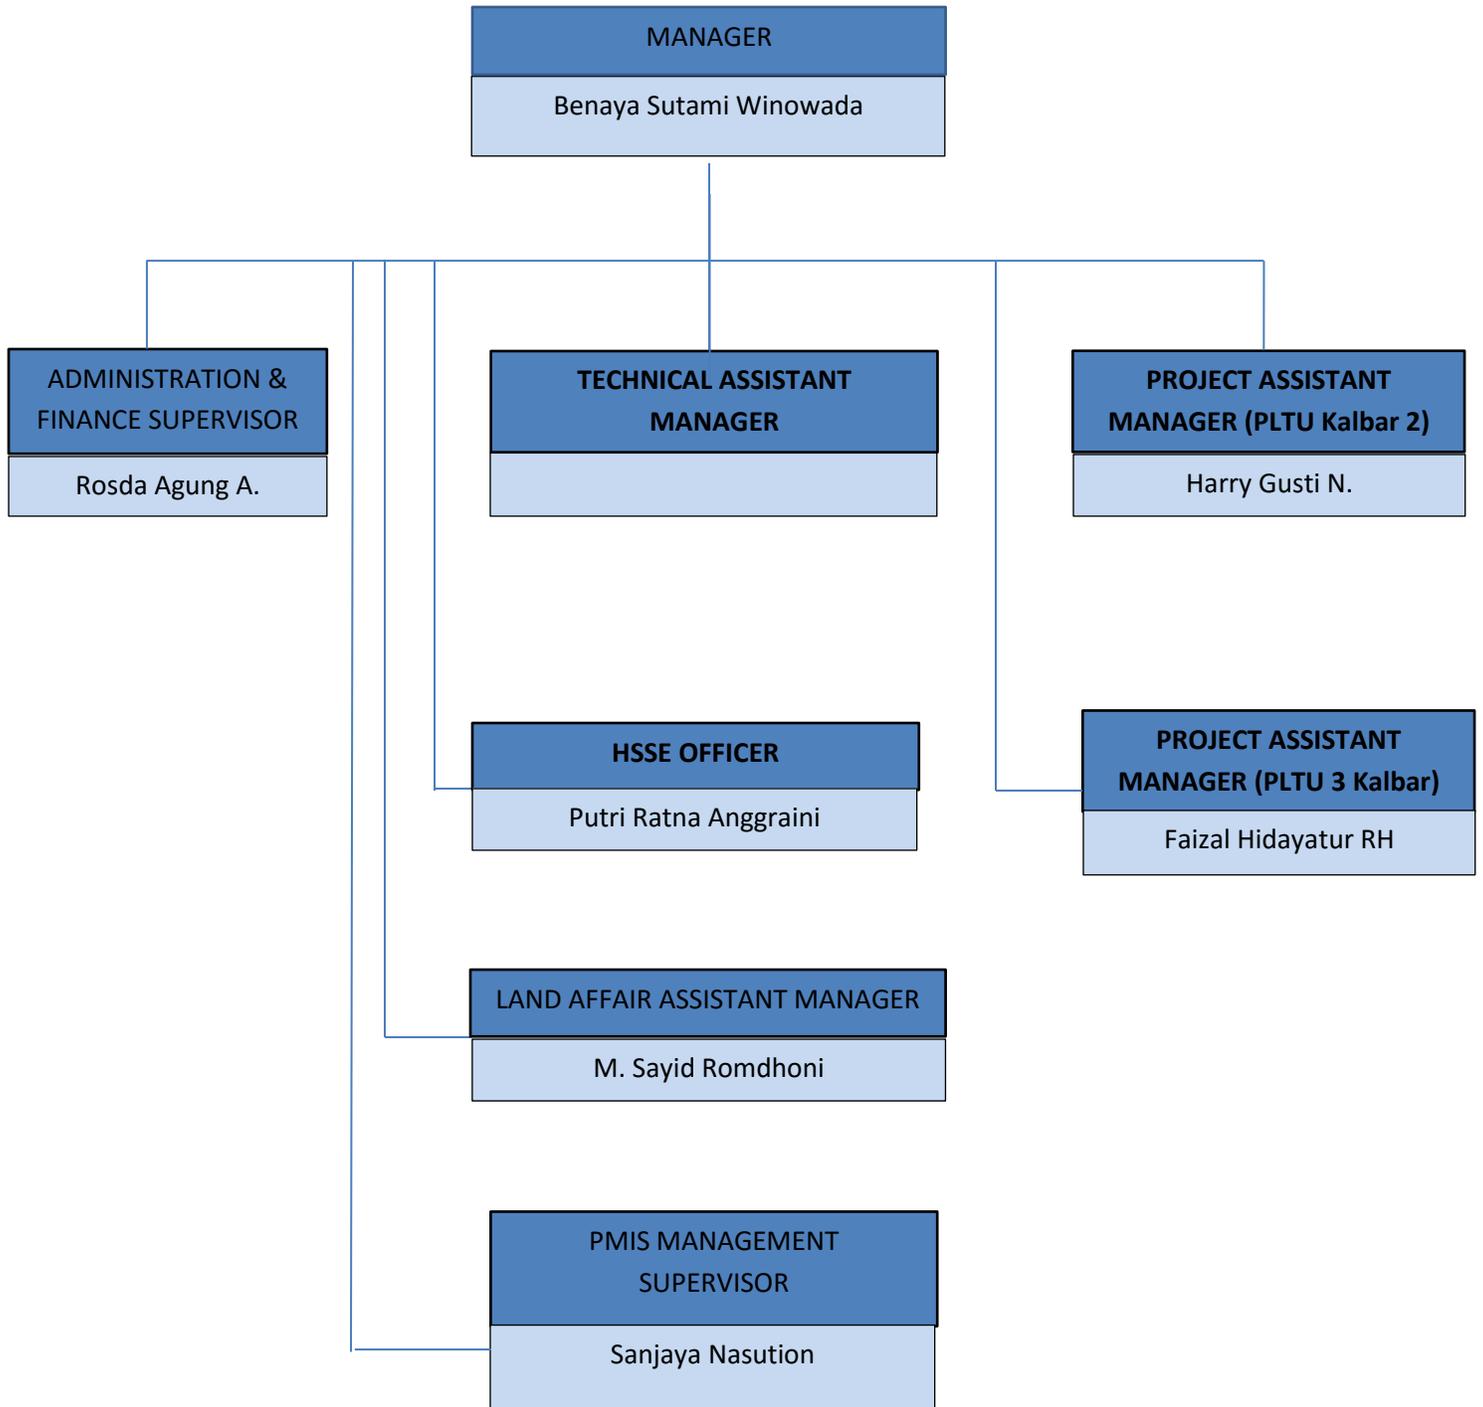

STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN PROYEK STRENGTHENING WEST KALIMANTAN PROJECT

ADB LOAN 3015 DAN AFD 1024-01 B

PT PLN (Persero) PUSAT MANAJEMEN PROYEK

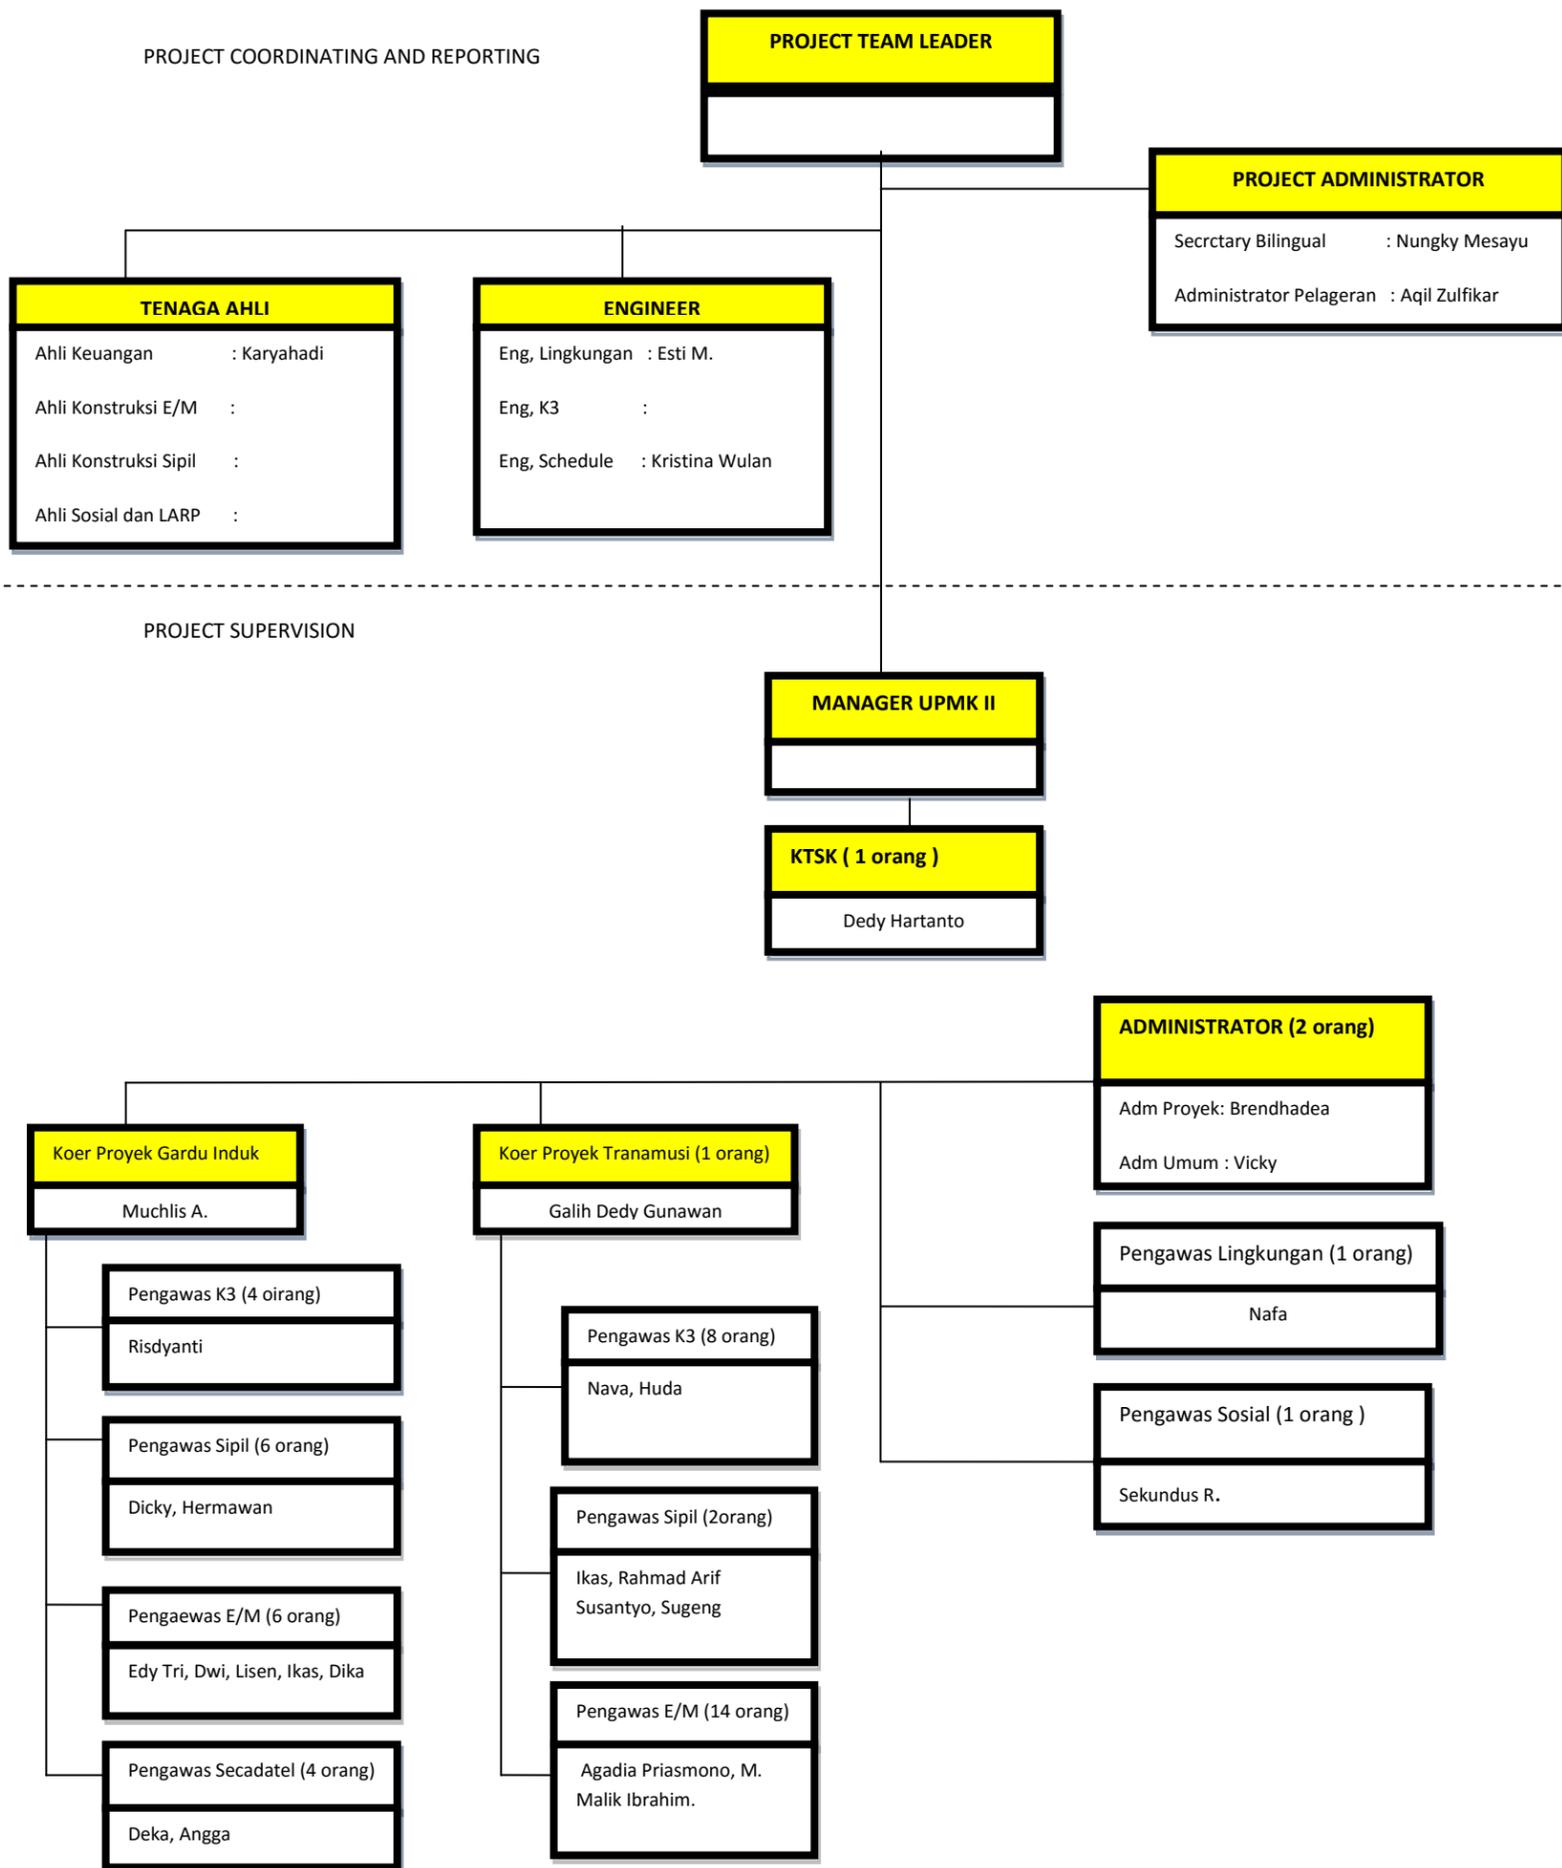

Appendix 2 Submission Letter of Revised IMA

Number : 5634 /KEU.05.02/010205/2019
Attachment : 2 (two) documents
Subject : Submission of Revised Independent Monitoring Agency (IMA) SUTT 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau.

November 13, 2019

To:

ADB Indonesia Resident Mission
The Plaza Office Tower, 11th floor
Jl. MH Thamrin 28-30,
Jakarta 10350

Dear Mr. Wicklein,

Following up to ADB's response to the Independent Monitoring Agency (IMA) document on April 18, 2019, we hereby submit the revised Independent Monitoring Agency (IMA) document stage 1 for the Tayan - Sanggau - Sekadau 150 kV SUTT project. In addition, we also have already sent the soft file through email on May 23, 2019.

Thank you for your kind attention.

**Yours Sincerely,
EXECUTIVE VICE PRESIDENT
PROJECT MANAGEMENT OFFICE,**



HENING KYAT PAMUNGKAS

Cc (without attachment):

1. Yth. DIRDAN-1
2. Yth. DIRREG-KAL
3. EVP KR-KAL

INDEPENDENT MONITORING AGENCY


**150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Lines
and 150/20 kV Sanggau and Sekadau Substations**

PT PLN (PERSERO) UIP KALIMANTAN BAGIAN BARAT

Jl. Letjen Soeprapto No. 50 G Pontianak
Telp/Fax (0561) 762580/ (0561) 762579

FINAL REPORT - REVISION

Reported by Pusat Studi Lingkungan Hidup – Universitas Tanjungpura

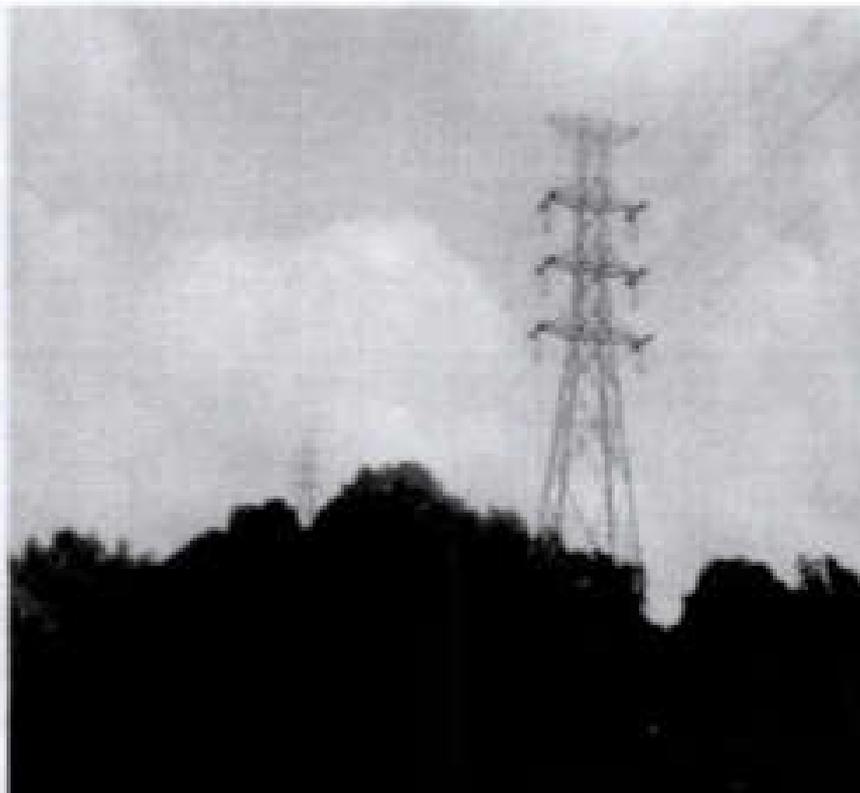

Pontianak, April 2019

INDEPENDENT MONITORING AGENCY (IMA)

TAHAP I PROYEK SUTT 150 KV TAYAN-SANGGAU-SEKADAU

PT PLN (PERSERO) UIP KALIMANTAN BAGIAN BARAT

Jl. Letjen Soeprato No. 50 G Pontianak
Telp/Fax (0561) 762580/ (0561) 762579

LAPORAN AKHIR – REVISI


Pusat Studi Lingkungan Hidup – Universitas Tanjungpura



Pontianak, April 2019

**Appendix 3 Vulnerable Affected People List in the Corridor of the 275 kV
Bengkayang - Jagoibabang TL**

AP Affected by the ROW of 275 kV

No	Affected People (AP)	Status of AP in Household	Age (th)	Sex M/F	Occupation	Income/Month	Status / Vulnerability				In Project Area	Usage	In Other Location	Total Area	Affected Trees	Field Surveky result by PIC / Survey Lapangan oleh PIC		Photos	Vulnerability
							Status Income	Status Aged	Status Gender	Vulnerabl e Propose						Survey Result by PIC/ Hasil Survey PIC			
KECAMATAN		Lumar	DESA		Lamolda														
1	Amoi	widow	56	F		0	Yes	No	Yes	Yes	20000	144	10000	30000	9	Cannot work any more, livelihood supported by her children. Prefer to get cash as income restoration.	Sudah tidak bekerja, Biaya sehari hari di berikan dari anak anaknya, Jika di berikan bantuan program income restoration lebih menyukai mendapatkan uang kas		Vulnerable
KECAMATAN		Sanggau Ledo	DESA		Bange														
2	Surai	widow	75	F	Farmer	550,000	Yes	Yes	Yes	Yes	10000	2600	2500	12500	1	Cannot work any more, livelihood supported by her children. Prefer to get fertilizer and seed as income restoration.	Sudah tidak bekerja, Biaya sehari hari di berikan dari anak anaknya, Jika di berikan bantuan program income restoration lebih menyukai mendapatkan pupuk dan bibit		Vulnerable
KECAMATAN		Seluas	DESA		Mayak														
3	Batu	householder	70	M	farmer	150,000	Yes	Yes	No	Yes	40000			40000	6	He is 80 years old, he work as rock breaker and sell the rock. His income is less than Rp. 250,000/month, Eventhough he has 1 Ha of land but he cannot work on his farm as he's very old. He involved in every process of land acquisition but unfortunately compensation was taken away by his son.	Pak Batu sudah berumur 80 tahun dan tidak lagi berladang, saat ini pekerjaannya adalah memecah batu dan menjualnya. Penghasilannya adalah Rp. 250,000/ bulan. Pada saat proses pembebasan ROW ikut aktif menghadiri sosialisasi. Pak Batu tidak bisa memanfaatkan uang kompensasinya karena telah di ambil oleh anaknya		Vulnerable
KECAMATAN		Jagoi Babang	DESA		Jagoi Babang														
4	Akon	household	80	M	farmer	693,333	Yes	Yes	No	Yes	40000			40000	10	work as farmer, his house is far away from village, so PIC only can meet his son. His income is less than Rp. 1,000,000/ month. Mr. akon also join in farmer group which each group receive corn seeds from Agriculture agency	Bekerja sebagai petani, karena rumahnya jauh dari desa maka PIC hanya bisa menemui anaknya. Mr. akon termasuk dalam kelompok tani yang menerima bantuan bibit jagung dari dinas pertanian bengkayang. Pendapatannya kurang dari Rp. 1,000,000/bulan		Vulnerable
5	Nyawop / Anyen	household	78	M	farmer	100,000	Yes	Yes	No	Yes					113	Land belongs to his son Mr. Anyen. Work as motor bike taxi and his income is Rp. 500,000,- as additional income he plant pepper and get Rp. 5,600,000 /year. He expect to get fertilizer for pepper tree as income restoration	Lahan yang terkena adalah milik anaknya : Bp. Anyen yang bekerja sebagai ojek dengan penghasilan Rp. 500,000/bulan. Sebagai tambahan pendapatannya Bp. Anyen menanam sahang dengan tambahan penghasilan Rp. 5,600,000/bulan. Mengharapkan mendapatkan bantuan berupa pupuk untuk sahang		Vulnerable

Jumlah Vulnerab		0																	
AP Affected by the Tower Foundation of 275 kV																			
Tower Number	Name Of Affected People (AP)	Ethnic Group	Gender	Landholding (m2)	Affected Land		Occupation	STATUS					Field Surveky result by PIC / Survey Lapangan oleh PIC		Photos	Vulnerability			
					m	%		Income/month	Income Status	Gender Status	Ethnic Status	Vulnerabl e Propose	Survey Result by PIC/ Hasil Survey PIC						
KECAN : Seluas	DESA	: Seluas																	
T.160	Kartini	Melayu	F	25,000	625	2.5	Private, farmer	600,000	Yes	Yes	No	Yes	Cannot work as she's already old and her right leg was fracture, daily cost is supproted by her brother and sister.	Sudah tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua dan kakinya patah. Biaya sehari hari di tanggung oleh saudaranya.		Vulnerable			

**Appendix 4 Coordination Meeting related to CSR Package 1: 275 kV
Bengkayang - Jagoibabang TL**



UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

PLN

Jl. M.T. Haryono No. 384, Balikpapan 76114

T (0542) 871559 (Hunting System)

F (0542) 871558, 871565

E pinuipkalbagtim@pln.co.id

Nomor	: 004- /STH.02.02/UIP KALBAGTIM/2019	15 Februari 2019
Surat	: -	
Sdr.No		
Lampiran	: 1 (satu) set	
Sifat	: Segera	
Perihal	: Penyampaian Usulan Program CSR terkait Social Safeguard SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang	Kepada Yth. : PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta

u.p. EVP Construction Division For Kalimantan Region,

Sehubungan dengan Rapat Koordinasi terkait permasalahan "Social Safeguard" Paket 1, Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang pada tanggal 26 November 2018 dan telah dilaksanakannya survey terkait program ekonomi produktif oleh UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar tanggal 23 Januari 2019 – 31 Januari 2019, bersama surat ini kami sampaikan usulan program CSR terkait pemenuhan Social Safeguard untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dengan berkas pendukung terlampir agar dapat dilakukan kesepakatan untuk pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan dukungannya diucapkan terimakasih.

PLH GENERAL MANAGER
SRM PERTANAHAN DAN
KOMUNIKASI,

EATTAH WIBISONO

Tembusan :

1. EVP, Corporate Communication & CSR
2. GM PLN UIP KALBAGBAR

Minutes of Meeting	<i>Date</i>	26 November 2018
	<i>Time</i>	13.30 WIB – Selesai
	<i>Place</i>	Ruang Rapat PLN PUSAT
Peserta : (daftar hadir terlampir)	<i>Note Taker</i>	Touku M. Reza Fahmy
Agenda	Koordinasi terkait Permasalahan "Social Safeguard" Paket 1, Jalur SUTET 275 kv Bengkayang – Jagobabang.	Attendants - DIV KR-KAL - DIV Corporate Communication & CSR - PLN UIP KALBAGBAR - PLN UIP KALBAGTIMI - ADB
<p>Rapat dibuka oleh VP KONJAR sesuai dengan Undangen Rapat No. 4549/STH.03.01/EVPKR-KAL/2018 tanggal 23 November 2018</p> <p><u>Pembahasan</u></p> <p>A. Penyampalan PT PLN UIP KALBAGTIM</p> <p>PLN UIP Kalbagtim telah melakukan tindak lanjut terkait program CSR yang dapat mengakomodir masyarakat yang terdampak pembangunan SUTET 275 kv Bengkayang – Jagobabang. Adapun program yang dapat dilakukan oleh pihak PLN UIP Kalbagtim adalah Bantuan sarana dan prasarana Posyandu serta penyuluhan tentang fasilitas kesehatan desa di 13 desa dalam 5 kecamatan.</p> <p>B. Penyampalan DIV- Corporate Communication & CSR</p> <p>Program CSR PT. PLN (Pecero) ini sifatnya mengakomodir keseluruhan atau kelompok dalam suatu desa tidak hanya perseorangan sesuai dengan pemilik Lahan ROW pada jalur SUTET 275 kv Bengkayang – Jagobabang.</p> <p>C. Penyampalan ADB</p> <p>Terkait program CSR yang telah dilakukan oleh PLN yaitu rehabilitasi sekolah menurut pihak ADB tidak cukup mewakili masyarakat yang terdampak pembangunan SUTET 275 kv Bengkayang – Jagobabang. Untuk program usulan Bantuan sarana dan prasarana Posyandu serta penyuluhan tentang fasilitas kesehatan desa di 13 desa dalam 5 kecamatan pihak ADB menyambut baik program tersebut. Adapun ADB menyampaikan agar program CSR ini dapat dikombinasikan dengan program ekonomi produktif, contohnya dapat berupa bantuan dari segi Agrrikultur, Peternakan dan bantuan penyuluhan yang dapat menumbuhkan perekonomian desa setempat.</p>		

Kesimpulan

1. PLN melalui UIP KALBAGTIM akan menambahkan alternatif program ekonomi produktif yang berpotensi di masing-masing wilayah dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa yang terdampak pembangunan SUTET 275 kv Bengkayang – Jagoibabang.
2. UIP KALBAGBAR siap mensupport kegiatan survey CSR di jalur SUTET 275 kv Bengkayang – Jagoibabang.
3. PLN UIP KALBAGTIM akan menyampaikan draft usulan terkait program yang akan dilaksanakan pada minggu III Desember 2018.

Notulis,

Teuku M. Reza Fahmy



PT PLN (PERSERO)
KANTOR PUSAT

DAFTAR HADIR

Hari/ Tgl : Senin / 20 November 2018
 Tempat : PT PLN (Persero) Kantor Pusat, RR Lt. 12
 Waktu : 10.00 WIB – Selesai
 Agenda : Coordination Meeting for Social Safeguards Issue Package 1
 Overhead Lines Project Bengkulu - Jagolbabang

NO	NAMA	INSTANSI	EMAIL/ NO. TELP	TTD
1.	Rehmawati Belli	STAF/PLN	rehmawati@pln.co.id 081413020	
2.	Teemu M. Pasa Ferry	DUSA-HIS	teemu.pasa@pln.co.id 0805240523	
3.	Happy W	CSR	Happy.wardhy@pln.co.id 083847348728	
4.	Johannes G. Simit	PLN LIT KALABANG	082218820888 johannesgimit@pln.co.id	
5.	DEBAP LISTIANE	PLN LIT KALABANG	deba@pln.co.id 0812 8809 1867	
6.	A. Rahman	CSR	rahman@pln.co.id 08121276727	
7.	DENNY - H	CSR	denny.wijaya@pln.co.id 0813 - 8716 - 1909	
8.	Sumdiana	AIB	sumdiana@pln.co.id 081293494110	
9.	Medhira Handinidewi	AIB	medhira@pln.co.id 08023006010	
10.	Hanny	AIB	hanny@pln.co.id 08121006014	

Minutes of Meeting

Date	23 Januari 2019
Time	10.00 WIB – Selesai
Place	Kab. Bengkayang

Attendees :

Note taken

Minutes

Agenda

Presenter

-

Discussion : Survey CSR terkait pemenuhan syarat dengan ADB untuk SUTET 275kV Bengkayang – Jagoi Babang

1. Berdasarkan data untuk jalur SUTET 275kV Bengkayang – Jagoi Babang melewati 13 desa, dengan daftar sebagai berikut :

JALUR PROYEK	RECAMATAN	NO	DESA
BENGKAYANG - JAGOIBABANG	Lumar	1	Magmagan Karya
		2	Tiga Berkat
		3	Belimbing
		4	Lamolda
	Leda	5	Lesabela
		6	Jesape
		7	Bange
	Sanggau Leda	8	Gua
		9	Sango
	Seluas	10	Sahan
		11	Mayak
		12	Seluas
	Jagoi Babang	13	Jagoi

2. PLN UIP Kalbagtim bersurat kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kabupaten Bengkayang untuk permohonan data terkait kebutuhan desa, hal ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang dilakukan pada Oktober 2018. Dalam koordinasi tersebut dijelaskan bahwa untuk potensi desa-desa yang dilalui jalur SUTET
3. Mulai tanggal 24 Januari 2019 hingga 31 Januari 2019, PLN UIP Kalbagtim bersama PLN UIP Kalbagbar telah melaksanakan survey terkait program CSR yang telah direkap melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, dengan data yang didapat sebagai berikut :

No	Nama Desa	Nama Kelompok	Jenis Usaha
1	Magmagan Karya	Berkah	Peternakan Ayam Putih
2	Tiga Berkat	Lamangrek	Peternakan Ayam Putih
3	Belimbing	Manso Tuah	Peternakan Ayam Putih
4	Lamolda	Maju Bersama	Pertanian Jagung
5	Lesabela	PKH Bunga Anggrek	Pertanian Jagung
6	Jesape	Karya Baru	Ahrintan
7	Bange	Maju Sejahtera	Peternakan Rambing
8	Gua	Maju Bersama	Olahan Ubi Rambut

9	Sango	Badeh Sejahtera	Peternakan Kambing
10	Sahan	Karupe'e	Peternakan Ayam Putih
11	Mayak	Silpa	Kerajinan Anyaman Bambu
12	Sekuas	PKH Mana Karya	Peternakan Ayam Putih
13	Jagol	Baluk Barista	Kerajinan Pembuatan Sidal

4. Berdasarkan survey yang dilaksanakan didapatkan hasil sebagai berikut :

- Komoditas di Kabupaten Bengkayang yang terbaik adalah di bidang pertanian dan peternakan, dan bidang tersebut digunakan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Bengkayang.
- Potensi di bidang pertanian untuk Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :
 - a. Sawit
 - b. Karet
 - c. Durian
 - d. Sahang
 - e. Jagung
- Potensi di bidang peternakan untuk Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :
 - a. Ayam Putih
 - b. Kambing
 - c. Babi
- Kesibukan yang dilakukan adalah pergi ke ladang atau ke hutan untuk melakukan kegiatan pertanian.
- Keanggotaan dari kelompok-kelompok tersebut merupakan warga miskin dan warga yang dilalui jalur SUTET 275kV Bengkayang – Jagol Babang.
- Dari 13 desa, beberapa kelompok masih tergolong baru atau belum pernah melaksanakan kegiatan usaha karena terhambat dengan permodalan, atau yang sudah berjalan keuntungannya baru cukup untuk melanjutkan usahanya lagi.
- Berdasarkan pengamatan langsung, untuk dilakukan kegiatan ekonomi kreatif belum dapat dilakukan di sebagian besar desa. Karena alasan sebagai berikut :
 - a. Belum ada kelompok usaha
 - b. Keterbatasan teknologi
 - c. Untuk mengarah ke kegiatan ekonomi kreatif butuh waktu yang lama

**BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 KV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR**

Pada hari ini tanggal
..... bulan Januari tahun Dua ribu
sembilan belas (...../2019), bertempat di
..... kami masing-masing yang
bertandatangan di bawah ini :

1.	NILA SISWANTI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	DENNY FAJRI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	DOMINIKA	:	KEPALA DESA MAGMAGAN KARYA
4.		:	KEM. YUS. BANGSA

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program *corporate social responsibility (CSR)* terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.



UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

- 5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
- 6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah "Berotomasi Ayam Paha" dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	NILA SISWANTI PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	DENNY FAURI PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	DOMINIKA J.A. Md. KEPALA DESA MAGMAGAN KARYA	
4.		

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN LUMAR





UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

BERITA ACARA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SUTET 275 KV BENGKAYANG – JAGOI BABANG DI DESA TIGA BERKAT KECAMATAN LUMAH

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas (...../2019), bertempat di Kantor Dpsa Tiga Berkat kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1.	<u>Anissa Nabila F.M</u>	:	<u>PLN UIP Kalimantan Bagian Timur</u>
2.	<u>Ellyzer Lintang M</u>	:	<u>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat</u>
3.	<u>Pani</u>	:	<u>Ketua KUBE LAMANGREK</u>
4.	<u>Alan</u>	:	<u>kepala Desa Tiga Berkat</u>

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.



UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

PLN

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah "Rekonstruksi Ajan Putih" dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	Annisa Nabisha F.M PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	Gebyar Lintang H PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	Pani Keha RUBE LAMAHEROK	
4.	Alan Kepala Desa Tiga Berkas	

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN LUMAR



**BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 KV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA BELIMBING KECAMATAN LUMAR**

Pada dua puluh lima hari ini Jum'at tanggal
Desa Belimbing Desa Belimbing bulan Januari tahun Dua ribu
sembilan belas (2019), bertempat di
Desa Belimbing kami masing-masing yang
bertandatangan di bawah ini :

1.	Anisa Nabila F.T	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	Elgar Lintang T	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	Margareta Apang	:	Ytho Kabg Prorasi Tanah
4.	SUHARDI	:	Repa Desa Belimbing

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah "..... Relokasi Ajan Rauh" dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


1.	<u>Anna Nabita P.M</u> PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	<u>Syahrul Lintang Mubandri</u> PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	<u>Margareta Afery</u> KORPRI KUBO PAKSI TUAN	
4.	<u>SUHARDI</u> Kepala Desa Belimbing	



Mengelahi,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN LUMAR



**BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 KV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA LAMOLDA KECAMATAN LUMAR**

Pada hari ini SEMIN tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas (18/01/2019), bertempat di KANTOR DESA LAMOLDA kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1.	<u>ANNISA NABIHA</u>	:	<u>PLN UIP Kalimantan Bagian Timur</u>
2.	<u>DENNY FAJRI</u>	:	<u>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat</u>
3.	<u>AMIT</u>	:	<u>KEPALA DESA LAMOLDA</u>
4.	<u>MATTAM</u>	:	<u>RETRU KLOMPOK MASU BERKAWA</u>

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kotonagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah "Pritaman (Budi Daya) Program" dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


1.	ANNISA NABIHA PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	DEWI FAHRI PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	AMIT KEPALA DESA LAMOLDA	
4.	MATSAM KEWA KELONIPAN MENDU BERAMIA	

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA



Dipertanggungjawabkan oleh M. S. I.
NIP. 196301011981121002

KECAMATAN LUMAR


K. Kurniati, S.Pd, M.Pd
NIP. 196307081987012002

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah "..... Reklamasi (Bak Dagan) Sepulang....." dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	<p>Anna Nelsita F.M</p> <p>.....</p> <p>PLN UIP Kalimantan Bagian Timur</p>	
2.	<p>Chajar Lintang M</p> <p>.....</p> <p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat</p>	
3.	<p>Sedah</p> <p>.....</p> <p>Kepala TUBE PPH Barga Amangrek</p>	
4.	<p>F.M. Baharun . A.Md, Kep</p> <p>.....</p> <p>Kepala Desa Ledo</p>	

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA


 Debora P. M. S
 Np 19740412 1 010

KECAMATAN LEDO


 MASHM
 Np. 19740413 100003 1 010

BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 kV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA JESAPE KECAMATAN LEDO

Pada hari ini JUM'AT tanggal DUA RIBU LIMA bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas (21/01/2019), bertempat di KEMPA DESA JESAPE kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1.	ANNIA NABIHA F.N	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	ERBYAR LINTANE	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	YOHANES	:	KEMPA DESA JESAPE
4.	TUC DAVID	:	KOTTA RUSD KARTA BARU

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang- Jagoi Babang.



UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

PLN

- 5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
- 6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah "Asyrah" dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	Annisa Nabaha F.M PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	DEBYAR LINTANG N PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	YOHANES KETUA DESA JESAPE	
4.	TWE DAVID KETUA RUBE KARYA BARU	

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN LEDO



MARLIM IRI

Np 150403/3 150503 1 018



UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

BERITA ACARA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SUTET 275 KV BENGKAYANG – JAGOI BABANG DI DESA BANGE KECAMATAN SANGGAU LEDO

Pada hari ini tanggal
..... bulan Januari tahun Dua ribu
sembilan belas (...../2019), bertempat di
..... kami masing-masing yang
bertandatangan di bawah ini :

1.	NILA SISWANTI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	DEWY FASRI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	HOTMIAN MANIK	:	BERDES BANGE
4.		:	

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah * PETERBUKAN KAMBING * dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	NILA SISWANTI PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	DENYU FIZRI PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	HOTMAN MANIK SEKUEC RANGE	
4.		

Mengotahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN SANGGAU LEDO



ARIF RAHMANN HARJIM
NIP. 19631010 198412 1009.

**BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 kV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA GUA KECAMATAN SANGGAU LEDO**

Pada hari ini **JUMAT** tanggal
..... bulan **Januari** tahun **Dua ribu**
sembilan belas (**...../...../2019**), bertempat di
KANTOR KEPALA DESA GUA kami masing-masing yang
bertandatangan di bawah ini :

1.	NILA SISWANTI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	DENNY FASRI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	WAWAH SISWANTO	:	KABUR KEBANGGAN
4.		:	

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.



UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

PLN

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah
 - "PEMBUATAN JEPUNG UBI LAMPAT" dengan
 proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	NILA SISWANTI PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	DENNY FAZEL PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	WAWAN SISWANTO	
4.	

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN SANGGAU LEDO

Disyahkan di AP M. Lt
 NIP. 19741011 199412 1 010

ARIF RAHMAN HAKIM
 NIP. 19631010 198412 1 009

**BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 kV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA SANGO KECAMATAN SANGGAU LEDO**

Pada hari ini SENIN tanggal
..... bulan Januari tahun Dua ribu
sembilan **belas** (...../2019), bertempat di
..... kami masing-masing yang
bertandatangan di bawah ini :

1.	ANNIKA NAGIHA	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	DENNY FAJRI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	WARDI	:	KEPALA DESA SANGO
4.		:	

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah PETERNAKAN KAMBING dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.


Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	ANNISA NABIHA PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	DENNY FAJRI PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	WARDI KEPALA DESA SANGU	
4.		

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

KECAMATAN SANGGAU LEDO
Kari Ekbanu



**BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 KV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS**

Pada hari ini Selasa tanggal
 dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua ribu
 sembilan belas (29/01/2019), bertempat di
 Kantor Desa Sahau kami masing-masing yang
 bertandatangan di bawah ini :

1.	N/A Irawanti	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	Denny Fajri	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	BLANUS BEONG	:	Kepala Desa Sahau
4.		:	

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah "....." dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	Mita Sewarti PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	Denny Tjaja PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	BLUGIUS BILONG Kepala Desa Lutan	
4.	

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA


Dandaryono, S.Pd, M.Si
NIP. 19740101 200412 1000

10- KECAMATAN SELUAS


SUTATA

**BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 kV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA MAYAK KECAMATAN SELUAS**

Pada hari ini JUMAT tanggal
DUA PULUH LIMA bulan Januari tahun Dua ribu
sembilan belas (2019) bertempat di
kami masing-masing yang
bertandatangan di bawah ini :


1.	<u>NILA SIGWANTI</u>	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	<u>DEBY FASRI</u>	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	<u>KARUNANI</u>	:	<u>KADUS Segorony</u>
4.		:	

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah "KERAJINAN ANYAMAN BAMBU" dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	NILA SIGWANTI PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	DENNY FAZRI PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	KARNANI KABUS SEBORONG	
4.		

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA



KECAMATAN SELUAS
An Camat Seluas
Selecam



**BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 kV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS**

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH LIMA bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas (2019), bertempat di KANTOR KEPALA DESA SELUAS kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

1.	<u>NILA SISWANTI</u>	: PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	<u>DENNY FAJRI</u>	: PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	<u>KARSONO</u>	: Kepala Desa Seluas
4.		:

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.

UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN BAGIAN TIMUR

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah
 - PETERNAKAN AYAM POTONG dengan
 proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	<u>NILA SISWANTI</u> PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	<u>DENNY FARRI</u> PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	<u>KARSONO</u> Kepala Desa Seluas	
4.	

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA



 AP. N. H.
 NIP. 197412 1 00

KECAMATAN SELUAS

Am. Camat Seluas
 Sek Cam


 Amy
 AMBAK, ST
 NIP. 19740206 200502 1 002

BERITA ACARA
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
SUTET 275 kV BENGKAYANG – JAGOI BABANG
DI DESA JAGOI KECAMATAN JAGOI BABANG

Pada hari ini **JUMAT** tanggal
DUA RIBU LIMA bulan Januari tahun **Dua ribu**
sembilan belas (**2019**), bertempat di
KANTOR KEPALA DESA JAGOI kami masing-masing yang
 bertandatangan di bawah ini :

1.	NILA SISWANTI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Timur
2.	DEANY FAJRI	:	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat
3.	DEDEGUS	:	KEPALA DESA JAGOI
4.	ROSLINDA	:	ketua kelompok

Bersama-sama telah melaksanakan survey terkait rencana pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR) terkait pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang, dan disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan program CSR merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pemberdayaan lingkungan sosial masyarakat pada jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.
2. Bahwa survey dilaksanakan langsung oleh PLN dalam hal ini UIP Kalbagtim dan UIP Kalbagbar dengan dukungan instansi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa serta Pemerintahan pada Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
3. Sasaran program CSR yang akan dilaksanakan adalah program Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
4. Calon penerima manfaat adalah se-kelompok orang yang mendukung dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya pembangunan Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang.

5. Calon penerima manfaat dengan program usulan ekonomi produktif yang telah di sepakati, telah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, prosedur dan memahami serta bersedia mengikuti aturan pelaksanaan Program CSR dari PLN.
6. Program Ekonomi Produktif yang menjadi usulan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima manfaat adalah **BANTUAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI KREATIF MASYARAKAT DESA - KELOMPOK KERAJINAN DESA JAGOI KEC. JAGOI BABANG** dengan proposal kegiatan dan RAB sebagaimana terlampir menjadi bagian dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak, tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	<u>NILA SIKWANTI</u> PLN UIP Kalimantan Bagian Timur	
2.	<u>DENNY FADRI</u> PLN UIP Kalimantan Bagian Barat	
3.	<u>DEDEKUS</u> KEPALA DESA TAGOI	
4.	<u>ROSLINDA</u>	

Mengetahui,

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA


Doktermas, AP, M. Li
NIP. 1971101119504121010

KECAMATAN JAGOI BABANG

Dj. Camat Jagoi Babang

R. A. A. I. D. S. S. S.
NIP. 197306010002122005

Minutes of Meeting		Date	28 Februari 2019
		Time	09.00 WIB – selesai
		Place	RR. LL13 PLN Pusat
Attendess: (daftar hadir terlampir)		Note Taker	Teuku M. Reza Fahmy
Minutes			
Agenda	Pembahasan Usulan Program CSR terkait Social Safeguard SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoibabang	Presenter	1. DIV KR KAL 2. CS & CSR 3. UIP KALBAGBAR 4. UIP KALBAGTIM 5. ADB
<p>Rapat dibuka oleh VP Konstruksi Jaringan Regional Kalimantan.</p> <p>Menindaklanjuti rapat sebelumnya pada tanggal 28 November 2018</p> <p>PLN UIP Kalbagtim :</p> <p>Menindaklanjuti kewajiban PLN untuk memenuhi IRRP Paket 1, UIP Kalbagtim telah melakukan survey ke 13 lokasi di sepanjang jalur SUTET 275 Bengkayang – Jagoibabang, dimana program CSR ini lebih kepada program pemberdayaan ekonomi masyarakat terkena dampak ROW disepanjang Jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoibabang.</p> <p>ADB :</p> <p>Menyampaikan terkait program-program yang akan dilakukan agar memastikan partisipasi warga yang terkena dampak ROW, memperhatikan partisipasi kelompok Perempuan, dan ada unsur pendampingan . ADB mengharapkan agar monitoring kegiatan IRRP dibuatkan laporan tersendiri agar nantinya dapat dilampirkan ke dalam Laporan semi annual social monitoring report dengan dilengkapi evidence (foto/video). Pada prinsipnya ADB menyetujui program-program usulan CSR UIP Kalbagtim. Agar detail workplan program dapat disampaikan ke pihak ADB.</p> <p>CSR :</p> <p>Proposal Usulan program CSR UIP Kalbagtim sudah disampaikan dan diterima oleh Corporate Communication & CSR pada tanggal 20 Februari 2019. Terkait usulan program dan anggaran program CSR UIP Kalbagtim ini masih akan dibahas terlebih dahulu, dan surat persetujuan akan disampaikan paling lambat tanggal 04 maret 2019.</p> <p>KESIMPULAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada prinsipnya ADB menyetujui program-program usulan CSR UIP Kalbagtim, - Pelaksanaan program – program CSR UIP Kalbagtim ini dilaksanakan Oleh UIP KALBAGTIM. UIP Kalbagbar akan mensupport transportasi dan akomodasi pelaksanaan program lapangan. - Tentative jadwal dan detail Implementasi program akan dilaksanakan April – November 2019. 			

Notulis,



Teuku M. Reza Fahmy



DAFTAR HADIR

Hari/ Tgl : Kamis / 28 Februari 2019
 Tempat : PT PLN (Persero) Kantor Pusat, RR Lt. 13
 Waktu : 09.00 WIB – Selesai
 Agenda : Usulan Program CSR terkait Social Safeguard SUTET 275 kV
 Bengkulu - Jagolbabang

NO	NAMA	INSTANSI	EMAIL/ NO. TELP	TTD
1.	ISWITU .P	UIP Kalbagtim	08126075950	
2.	Tedra M. Reza Fahmy	DWIKORAL	tedra.reza.fahmy@pln	
3.	Naning Martinah	ADB	naningmartinah@adb.org	
4.	Medhira Handinidevi	ADB	mhandinidevi.consultant@adb.org 08123506690	
5.	ANALISA	UIP KEDAM	analisa@pln.co.id	
6.	BACHMAWATI	DWIKORAL	0811 411 30 20	
7.	HARRY W	CSR	08184429 8728 harry.wawandhy@pln.co.id	
8.	BEBYDA LINTANE	UIP KBB	lincingoodon@gmail.com 0812 8809 4857	
9.				
10.				

Appendix 5 CSR Bengkayang Report



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM CSR BERBASIS EKONOMI PRODUKTIF
"PLN PEDULI EKONOMI BENGKAYANG"

SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 NAMA TEMA.....	1
1.3 TUJUAN.....	2
1.4 SASARAN.....	2
1.5 MANFAAT.....	2
1.5.1 MANFAAT BAGI PLN.....	2
1.5.2 MANFAAT BAGI MASYARAKAT.....	2
BAB II PERENCANAAN..	3
2.1 PERENCANAAN PROGRAM...	3
2.2 NAMA PROGRAM.....	3
2.3 RENCANA AKSI YANG DILAKUKAN	3
2.4 PERMOHONAN PENGESAHAN ANGGARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM	4
2.5 INDIKATOR KEBERHASILANDAN EVALUASI PROGRAM	7
2.5.1 KEBERHASILAN PROGRAM.....	7
2.5.2 EVALUASI PROGRAM	7
BAB III PELAKSANAAN AKSI PROGRAM.....	8
3.1 AKSI YANG DILAKSANAKAN	8
3.1.1 SEKTOR TERNAK	8
3.1.1.1 PETERNAKAN AYAM	8
3.1.1.2 PETERNAKAN KAMBING.....	10
3.1.2 SEKTOR PERTANIAN	11
3.1.3 SEKTOR OLAHAN DAN ANYAMAN.....	11

3.2 REALISASI ANGGARAN BIAYA.....	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM.....	14
4.1 MONITORING PROGRAM	14
4.2 EVALUASI PROGRAM	15
BAB V HAL LAIN	17
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	18
6.1 KESIMPULAN	19
6.2 SARAN	18
BAB VII PENUTUP	19
LAMPIRAN	20



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan program CSR di Kabupaten Bengkayang dilatar belakangi oleh kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dengan panjang jalur sekitar 162 kilometer sirkuit (kms) yang saat ini telah beroperasi guna meningkatkan rasio elektrifikasi wilayah serta meningkatkan keandalan Sistem Khatulistiwa (Interkoneksi Kalimantan Barat) dimana jalur ini juga merupakan sistem penghubung kelistrikan antar dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

Pada tahun 2018 PT PLN (Persero) telah melaksanakan beberapa program CSR melalui PT PLN (Persero) UIP Kalbagtim dengan program Bantuan Sarana dan Prasarana SDN 013 Romo di Desa Romo Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar dengan program Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Gua Kecamatan Sanggau Ledo. Pelaksanaan program – program tersebut merupakan manifestasi kepedulian PLN terhadap wilayah di sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dimana tingkat keberhasilan pelaksanaan program telah terlaksana dengan baik.

Mengingat besarnya kontribusi masyarakat kepada PLN yang memanfaatkan lahan masyarakat guna pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dapat diselesaikan, maka pada wilayah sebanyak tiga belas desa di lima kecamatan yang dilalui jalur transmisi di Kabupaten Bengkayang dilakukan usulan program CSR untuk tahun 2019 dimana kali ini program CSR bergerak di bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat mandiri yang mengacu pada perilaku ekonomi produktif dan ekonomi kreatif.

1.2. NAMA TEMA

Program CSR kali ini memiliki sasaran terhadap peningkatan mutu ekonomi masyarakat khususnya warga yang berada di jalur lintasan transmisi SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang. Penetapan tema usulan program CSR tahun 2019 PT PLN (Persero) UIP Kalbagtim untuk masyarakat di Kabupaten Bengkayang adalah “**PLN Peduli Ekonomi Bengkayang**”. Penetapan tema ini menjadi identitas pelaksanaan seluruh program yang akan diusulkan dimana PLN UIP Kalbagtim ditunjuk sebagai leader sedangkan PLN UIP dan UIW Kalbagbar menjadi pendukung dalam giat CSR PLN yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat ini.

1.3. TUJUAN

1. Pemenuhan dan pelaksanaan perusahaan terhadap peraturan – peraturan sebagai berikut :
 - 1.a. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas
 - 1.c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - 1.c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
2. Dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi mandiri masyarakat Kabupaten Bengkayang;
3. Meningkatkan citra positif dan nama baik perusahaan PT PLN (Persero) khususnya PT PLN (Persero) UIP Kalbagtim di lingkungan masyarakat sekitarnya.

1.4. SASARAN

1. Masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh jalur transmisi SUTET 275kV Bengkayang – Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang;
2. Masyarakat kurang mampu di sekitar jalur Transmisi SUTET 275kV Bengkayang – Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang;
3. Kaum Ibu dan Perempuan (penerima manfaat mayoritas kaum ibu/ perempuan).

1.5. MANFAAT

Manfaat dari pelaksanaan program CSR “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” ini dapat dipandang dari dua sisi yaitu manfaat bagi PLN dan manfaat bagi masyarakat (penerima manfaat).

1.5.1. MANFAAT BAGI PLN

1. Meningkatkan keandalan kelistrikan oleh karena kemitraan yang telah terbentuk antara perusahaan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan pemerintah kepada perusahaan terkait pemenuhan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis perusahaan;
3. Meningkatkan citra perusahaan bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan.

1.5.2. MANFAAT BAGI MASYARAKAT

1. Meningkatkan ekonomi individu maupun kelompok sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas;
2. Meningkatkan pembangunan daerah di wilayah tersebut dengan adanya TJSL/CSR;
3. Menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang mandiri dan harmonis.

BAB II PERENCANAAN

2.1. PERENCANAAN PROGRAM

Rapat kordinasi perencanaan dan penetapan program dilaksanakan baik dari Internal maupun Eksternal PT PLN (Persero) dimana seluruh institusi maupun unit/ bidang pernah terlibat dalam pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang Jagoibabang seperti PT PLN (Persero) Direktorat Regional Kalimantan, PT PLN (Persero) UIP Kalbagtim, PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar serta Asian Development Bank (ADB) yang merupakan institusi financial yang bermitra dengan PLN.

2.2. NAMA PROGRAM

PLN Peduli Ekonomi Bengkayang

2.3. RENCANA AKSI YANG DILAKUKAN

Analisa usulan program CSR awal terdiri dari empat opsi yang telah didapat saat survey pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2018 dengan metode wawancara di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :

1. Pendaftaran keanggotaan BPJS beserta pembayaran premi 1 tahun dengan pemeriksaan gratis
2. Bantuan sarana dan Prasarana Posyandu
3. Bantuan pembangunan Gedung Rehabilitasi Sosial (Permintaan Dinas Sosial)
4. Program Keluarga Harapan.

Hasil evaluasi usulan diatas saat rapat bersama di kantor PLN pusat pada 26 November 2018 dinilai belum memenuhi kriteria tujuan pelaksanaan program CSR di Bengkayang – Jagoi Babang dimana diharapkan hasil pelaksanaan program dapat mengakomodir warga yang terdampak langsung maupun tidak langsung pada lintasan jalur transmisi terhadap segi ekonomi. Pembahasan evaluasi usulan program mengerucut kepada program yang bersifat ekonomi produktif seperti program bantuan agrikultur, peternakan dan bantuan penyuluhan yang dapat menumbuhkan perekonomian desa setempat.

Menindaklanjuti hasil rapat evaluasi tersebut PLN UIP Kalbagtim dan PLN UIP Kalbagbar bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan survey kembali dimana sasaran program adalah ekonomi produktif yang berpotensi dimasing – masing wilayah dengan berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan yang terdampak pembangunan SUTET 275 kV dan didapatkan opsi sebagai berikut :

Sektor	No	Nama Program	Kelompok Penerima Manfaat	Desa	Kecamatan
Peternakan	1	Peternakan Ayam Putih	Berkah	Magmagan Karya	Lumar
	2	Peternakan Ayam Putih	Lamanggrek	Tiga Berkat	Lumar
	3	Peternakan Ayam Putih	Manso Tuah	Belimbing	Lumar
	4	Peternakan Ayam Putih	Karupe'e	Sahan	Seluas
	5	Peternakan Ayam Putih	PKH Mana Karya	Seluas	Seluas
	6	Peternakan Kambing	Maju Sejahtera	Bange	Sanggau Ledo
	7	Peternakan Kambing	Badeh Sejahtera	Sango	Sanggau Ledo
Pertanian	8	Pertanian Jagung	Maju Bersama	Lamolda	Lumar
	9	Pertanian Jagung	PKH Bunga Anggrek	Lesabela	Ledo
	10	Alsintan Pertanian Jagung	Karya Baru	Jesape	Ledo
Olahan dan Anyaman	11	Olahan Ubi Rambat	Maju Bersama	Gua	Sanggau Ledo
	12	Kerajinan Anyaman Bambu	Silpa	Mayak	Seluas
	13	Kerajinan Pembuatan Bidai	Baluk Barista	Jagoi	Jagoi Babang

Tabel 2.3.1 Daftar Usulan Program

Usulan program pada tabel diatas merupakan hasil survey dan musyawarah yang tertuang dalam berita acara survey bersama antara PLN, Dinas Sosial beserta Kepala Desa dan Camat pada tiap wilayah program, dimana usulan tersebut dinilai mampu dilaksanakan dan akan mencapai tujuan utama sesuai perencanaan kegiatan. Rencana anggaran dan biaya (RAB) beserta jadwal pelaksanaan kegiatan kemudian disusun bersama dan mendapat persetujuan dari PLN Pusat dan ADB.

2.4. PERMOHONAN PENGESAHAN ANGGARAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

Permohonan anggaran dan jadwal pelaksanaan program disusun sesuai dengan kegiatan CSR PT PLN (Persero) UIP Kalbagtim tahun 2019, dimana penyampaian usulan resmi terkait anggaran disampaikan melalui surat 012/STH.02.02/UIP KALBAGTIM/2019 perihal Penyampaian Usulan Program CSR terkait Social Safeguard SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang pada 15 Februari 2019 kepada EVP Construction Division for Kalimantan Region dengan tembusan EVP Corporate Communication & CSR yang menangani pelaksanaan program CSR dilingkungan PT PLN Persero.



No	Nama Desa	Nama Kelompok	Jenis Usaha	Nilai Bantuan
1	Magmagan Karya	Berkah	Peternakan Ayam Putih	Rp. 165.570.000,00
2	Tiga Berkat	Lamanggrek	Peternakan Ayam Putih	Rp. 165.570.000,00
3	Belimbing	Manso Tuah	Peternakan Ayam Putih	Rp. 165.570.000,00
4	Lamolda	Maju Bersama	Pertanian Jagung	Rp. 129.795.000,00
5	Lesabela	PKH Bunga Anggrek	Pertanian Jagung	Rp. 111.070.000,00
6	Jesape	Karya Baru	Alsintan Pertanian Jagung	Rp. 129.795.000,00
7	Bange	Maju Sejahtera	Peternakan Kambing	Rp. 118.200.000,00
8	Gua	Maju Bersama	Olahan Ubi Rambat	Rp. 117.818.000,00
9	Sango	Badeh Sejahtera	Peternakan Kambing	Rp. 118.200.000,00
10	Sahan	Karupe'e	Peternakan Ayam Putih	Rp. 165.570.000,00
11	Mayak	Silpa	Kerajinan Anyaman Bambu	Rp. 120.935.000,00
12	Seluas	PKH Mana Karya	Peternakan Ayam Putih	Rp. 165.570.000,00
13	Jagoi	Baluk Barista	Kerajinan Pembuatan Bidai	Rp. 177.975.000,00
JUMLAH BANTUAN				Rp. 1.851.638.000,00

Tabel 2.4.1 Usulan Anggaran Program

Penyampaian persetujuan usulan anggaran program CSR “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” disampaikan melalui melalui surat PT PLN (Persero) Kantor Pusat Nomor. 0899/STH.02.02/DIVCOM/2019 pada tanggal 11 Maret 2019 sehingga implementasi pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai jadwal kegiatan yang telah disusun.



2.5. INDIKATOR KEBERHASILAN DAN EVALUASI PROGRAM

Indikator keberhasilan dan evaluasi terhadap program ditetapkan sesuai *standar operating procedure* (SOP) CSR PT PLN (Persero). Program “PLN Peduli Ekonomi Bengkulu” memiliki target proses dan output sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Adapun sebagai tambahan agar dibuatkan laporan dan dokumentasi dari kegiatan seperti foto dan video dari implementasi program.

2.5.1. KEBERHASILAN PROGRAM

Program bisa dikatakan berhasil bila seluruh proses pelaksanaan berjalan baik mulai dari seleksi perencanaan program, survey, pemetaan program, realisasi dan penyerapan anggaran terlaksana, hingga harapan dari hasil program dapat realisasikan.

2.5.2. EVALUASI PROGRAM

Evaluasi program dilaksanakan sebagai identifikasi untuk mengukur dan menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Self assessment akan dilaksanakan dalam penilaian program CSR “PLN Peduli Ekonomi Bengkulu” ini.



BAB III PELAKSANAAN AKSI PROGRAM

3.1. AKSI YANG DILAKSANAKAN

Aksi yang dilaksanakan dibagi menjadi 3 sektoral sehingga memudahkan monitoring pelaksanaan program dimana tiap kelompok juga memiliki pendamping dari Dinas Sosial.

3.1.1. SEKTOR TERNAK

Sektor ternak pada “Program Peduli Ekonomi Bengkayang” dibagi atas dua jenis yaitu peternakan ayam dan peternakan kambing.

Sektor	No	Nama Program	Kelompok Penerima Manfaat	Desa	Kecamatan
Peternakan	1	Peternakan Ayam Putih	Berkah	Magmagan Karya	Lumar
	2	Peternakan Ayam Putih	Lamanggrek	Tiga Berkat	Lumar
	3	Peternakan Ayam Putih	Manso Tuah	Belimbing	Lumar
	4	Peternakan Ayam Putih	Karupe'e	Sahan	Seluas
	5	Peternakan Ayam Putih	PKH Mana Karya	Seluas	Seluas
	6	Peternakan Kambing	Maju Sejahtera	Bange	Sanggau Ledo
	7	Peternakan Kambing	Badeh Sejahtera	Sango	Sanggau Ledo

Tabel 3.1.1 Daftar Desa dan Jenis pada Sektor Ternak

3.1.1.1. Peternakan Ayam

a) Desa Magmagan dan Desa Tiga Berkat

Desa Magmagan dan Desa Tiga Berkat memiliki masa waktu pelaksanaan dan kegiatan yang sama. Pendamping kelompok dari Dinsos adalah Ibu Tiur.

Realisasi Kegiatan Desa Magmagan dan Desa Tiga Berkat		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota Kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Pembangunan kandang dilaksanakan	12 april - 17 Mei 2019
	- Dropping Peralatan Kandang	9 Mei 2019
	- Pemasangan Instalasi Listrik	23 Mei 2019
4	Dropping bibit ayam 1000 Ekor	24 Mei 2019
5	Panen bibit ayam tahap 1	21 Juni 2019
6	Dropping bibit ayam 500 Ekor	26 Juli 2019
7	Penyuluhan dengan PT Japfa	19 Agustus 2019
8	Dropping bibit ayam 500 ekor	19 september 2019
9	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019

Tabel 3.1.1a Realisasi Desa Magmagan dan Desa Tiga Berkat

b) Desa Belimbing

Realisasi Peternakan ayam di Desa Belimbing memiliki kegiatan yang sama dengan Desa Mamagan dan Tiga Berkat hanya terdapat perbedaan waktu pelaksanaan. Pendamping kegiatan kelompok di Desa Belimbing juga dilaksanakan oleh Ibu Tiur.

Realisasi Kegiatan Desa Belimbing		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota Kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Pembangunan kandang dilaksanakan	12 april - 17 Mei 2019
	- Dropping Peralatan Kandang	9 Mei 2019
	- Pemasangan Instalasi Listrik	23 Mei 2019
4	Dropping bibit ayam 1000 Ekor	24 Mei 2019
5	Panen bibit ayam tahap 1	21 Juni 2019
6	Dropping bibit ayam 1000 Ekor	01 Juli 2019
7	Penyuluhan dengan PT Japfa	19 Agustus 2019
8	Panen bibit ayam tahap 2	13 september 2019
9	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019

Tabel 3.1.1b Realisasi Desa Belimbing

c) Desa Sahan

Realisasi Peternakan ayam di Desa Sahan memisahkan dropping bibit ayam ke dua menjadi dua bagian, hal ini dilakukan agar proses ternak lebih terkontrol. Pendamping kegiatan kelompok di Desa Sahan dilaksnakan oleh Bapak Veliks.

Realisasi Kegiatan Desa Sahan		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota Kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Pembangunan kandang dilaksanakan	12 april - 17 Mei 2019
	Dropping Peralatan Kandang	9 Mei 2019
	Pemasangan Instalasi Listrik	23 Mei 2019
4	Dropping bibit ayam 1000 Ekor	24 Mei 2019
5	Panen bibit ayam tahap 1	16 Juni 2019
6	Dropping bibit ayam 500 Ekor	13 Agustus 2019
7	Penyuluhan dengan PT Japfa	19 Agustus 2019
8	Dropping bibit ayam 500 ekor	12 September 2019
9	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019

Tabel 3.1.1c Realisasi Desa Sahan

d) Desa Seluas

Realisasi Peternakan ayam di Desa Seluas memiliki metode yang sama seperti Desa Belimbing dengan perbedaan waktu pelaksanaan. Pendamping kegiatan kelompok di desa Seluas dilaksanakan oleh Bapak Iyan.



Realisasi Kegiatan Desa Seluas		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota Kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Pembangunan kandang dilaksanakan	12 april - 17 Mei 2019
	- Dropping Peralatan Kandang	9 Mei 2019
	- Pemasangan Instalasi Listrik	23 Mei 2019
4	Dropping bibit ayam 1000 Ekor	24 Mei 2019
5	Panen bibit ayam tahap 1	17 Juni 2019
6	Dropping bibit ayam 1000 Ekor	23 Juli 2019
7	Penyuluhan dengan PT Japfa	19 Agustus 2019
8	Panen bibit ayam tahap 2	17 september 2019
9	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019

Tabel 3.1.1d Realisasi Desa Seluas

3.1.1.2. Peternakan Kambing

Realisasi kegiatan dan waktu pelaksanaan dari peternakan kambing di Desa Bange dan Desa Sango dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Realisasi Kegiatan Desa Bange dan Desa Sango		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota Kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Pembangunan kandang dilaksanakan	12 april - 17 Mei 2019
	- Dropping Peralatan Kandang	9 Mei 2019
4	Dropping bibit ke-1 kambing 16 Ekor	24 Juli 2019
5	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019
6	Dropping bibit ke-2 kambing 19 Ekor	8 Oktober 2019
7	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 2	14 Oktober 2019

Tabel 3.1.1.2 Realisasi Desa Bange dan Desa Sango

Realisasi peternakan kambing di Desa Bange dan Desa Sango seperti pada tabel di atas dapat terlaksana dengan jadwal yang bersamaan di karenakan pendampingan kelompok yang ditunjuk dari Dinas Sosial adalah orang yang sama, yaitu Bapak Chandra.



3.1.2. SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian pada program “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” memilih budidaya tanaman jagung.

Sektor	No	Nama Program	Kelompok Penerima Manfaat	Desa	Kecamatan
Pertanian	1	Pertanian Jagung	Maju Bersama	Lamolda	Lumar
	2	Pertanian Jagung	PKH Bunga Anggrek	Lesabela	Ledo
	3	Alsintan Pertanian Jagung	Karya Baru	Jesape	Ledo

Tabel 3.1.2.1 Sektor Pertanian

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada tiga desa diatas dilakukan secara serentak dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sama. Pendamping kegiatan kelompok di Desa Lamolda dilaksanakan oleh Ibu Tiur sedangkan untuk Desa Lasabela dan Desa Jesape dilaksanakan oleh Bapak Didik yang ditunjuk dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang.

Realisasi Kegiatan Desa Lamolda, Desa Lasabela dan Desa Jesape		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota Kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Dropping Peralatan Pertanian	11 - 17 Juli 2019
	- Mesin dan peralatan Pertanian	11 Juli 2019
	- Bibit dan Pupuk	15 Juli 2019
4	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019
5	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 2	7 Oktober 2019


Tabel 3.1.2.2 Realisasi Desa Lamolda, Desa Lasabela dan Desa Jesape

3.1.3. SEKTOR OLAHAN DAN ANYAMAN

Sektor olahan dan anyaman pada program “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” terdiri dari kelompok dan usaha yang sebelumnya sudah eksis dalam pengusahaanya. Kebutuhan kelompok usaha lebih kepada pemodalan bahan baku dan tambahan alat pendukung kegiatan.

Sektor	No	Nama Program	Kelompok Penerima Manfaat	Desa	Kecamatan
Olahan dan Anyaman	1	Olahan Ubi Rambat	Maju Bersama	Gua	Sanggau Ledo
	2	Kerajinan Anyaman Bambu	Silpa	Mayak	Seluas
	3	Kerajinan Pembuatan Bidai	Baluk Barista	Jagoi	Jagoi Babang

Tabel 3.1.3 Sektor Olahan dan Anyaman



a) Desa Gua

Realisasi Desa Gua dilaksanakan sesuai kegiatan dan jadwal yang telah disusun secara bersama yaitu olahan ubi rambat. Kelompok memang telah memiliki keahlian dalam pengolahan budidaya pertanian yang ada. Pendamping kegiatan kelompok di desa Gua dilaksanakan oleh Bapak Chandra.

Realisasi Kegiatan Desa Gua		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Droping peralatan mesin pengolahan	24 Juli 2019
4	Sosialisasi dan penyuluhan tahap 2	16 Agustus 2019
5	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019

Tabel 3.1.3a Realisasi Desa Gua

b) Desa Mayak

Realisasi Desa Mayak adalah pemodaln terhadap bahan baku dan penyuluhan dan peralatan kerajinan, dimana kelompok telah eksis dalam usaha kerajinan bambu ini. Pendamping kegiatan kelompok di Desa Mayak dilaksanakan oleh Ibu Yuni.

Realisasi Kegiatan Desa Mayak		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota Kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Droping Peralatan	24 Mei 2019
	- Memulai produksi anyaman	24 Mei - saat ini
4	Sosialisasi dan Penyuluhan tahap 2	15 Agustus 2019
5	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019
6	Pemesanan untuk dropping bibit rotan dari Kalteng	18 Oktober 2019

Tabel 3.1.3b Realisasi Desa Mayak

c) Desa Jagoi

Realisasi Desa Jagoi adalah pemodaln bahan baku dan peralatan kerajinan serta penyuluhan kebutuhan kelompok. Anggota kelompok telah memiliki keahlian yang sangat baik dan untuk pemasaran hasil usaha telah dilirik oleh pasar mancanegara. Beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok adalah besarnya jumlah pemesanan sedangkan bahan baku utama pembuatan kerajinan anyaman bidai belum terpenuhi. Dengan adanya program CSR ini pemodaln terhadap bahan baku Bidai dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan pemesanan dan ditambah penyuluhan terkait pemasaran produk kelompok. Pendamping kegiatan kelompok di Desa Mayak dilaksanakan oleh Bapak Astaja.



Realisasi Kegiatan Desa Jagoi		
No	Kegiatan	Waktu
1	Pendataan anggota kelompok	20 Januari 2019
2	Sosialisasi dan penyuluhan tahap 1	12 April 2019
3	Dropping peralatan dan bahan baku anyaman	24 Juli 2019
	- Memulai produksi anyaman	24 Mei - saat ini
4	Sosialisasi dan penyuluhan tahap 2	15 Agustus 2019
5	Penyerahan bantuan secara simbolis	26 September 2019

Tabel 3.1.3c Realisasi Desa Jagoi

3.2. REALISASI ANGGARAN BIAYA

Realisasi penyerapan anggaran dilaksanakan berdasarkan RAB dan implementasi kegiatan dilapangan. PLN bersama pendamping kelompok dan ketua kelompok bersama – sama memonitoring penggunaan anggaran untuk kebutuhan kelompok secara utuh. Berita acara pemanfaatan anggaran sebagai realisasi pemanfaatan anggaran dapat dilihat pada lampiran dalam laporan ini

No.	*Nama Aksi Program	Penerima Manfaat	Lokasi			JUMLAH	Persentase Realisasi
			Desa	Kecamatan	Kota/Kab		
	PLN Peduli Ekonomi Bengkulu					Rp -	
	Peternakan Ayam Putih	Berkah	Magmagan Karya	Lumar	Kab. Bengkulu	Rp 165,570,000	100%
	Peternakan Ayam Putih	Lamangrek	Tiga Berkat	Lumar	Kab. Bengkulu	Rp 165,570,000	100%
	Peternakan Ayam Putih	Manso Tuah	Belimbing	Lumar	Kab. Bengkulu	Rp 165,570,000	100%
	Pertanian Jagung	Maju Bersama	Lamolda	Lumar	Kab. Bengkulu	Rp 129,795,000	100%
	Pertanian Jagung	PKH Bunga Anggrek	Lesabela	Ledo	Kab. Bengkulu	Rp 111,070,000	100%
	Alsintan	Karya Baru	Jesape	Ledo	Kab. Bengkulu	Rp 129,795,000	100%
	Peternakan Kambing	Maju Sejahtera	Bange	Sanggau Ledo	Kab. Bengkulu	Rp 118,200,000	100%
	Olahan Ubi Rambat	Maju Bersama	Gua	Sanggau Ledo	Kab. Bengkulu	Rp 117,818,000	100%
	Peternakan Kambing	Badeh Sejahtera	Sango	Sanggau Ledo	Kab. Bengkulu	Rp 118,200,000	100%
	Peternakan Ayam Putih	Karupe'e	Sahan	Seluas	Kab. Bengkulu	Rp 165,570,000	100%
	Kerajinan Anyaman Bambu	Silpa	Mayak	Seluas	Kab. Bengkulu	Rp 120,935,000	100%
	Peternakan Ayam Putih	PKH Mana Karya	Seluas	Seluas	Kab. Bengkulu	Rp 165,570,000	100%
	Kerajinan Pembuatan Bidai	Baluk Barista	Jagoi	Jagoi Babang	Kab. Bengkulu	Rp 177,975,000	100%
TOTAL JUMLAH						Rp 1,851,638,000	

Tabel 3.2.1 Realisasi penyerapan anggaran biaya

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

4.1. MONITORING PROGRAM

Monitoring dilakukan oleh PLN dan Dinas Sosial melalui pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang di bentuk saat penyusunan rencana program ekonomi produktif diinisiasi. Fungsi dari pendamping PKH adalah sebagai pengawas jadwal kegiatan kelompok, pelaporan hingga mengelola dan memonitoring anggaran sesuai kebutuhan di lapangan bersama dengan ketua kelompok. Anggota kelompok penerima manfaat adalah warga yang didominasi oleh orang - orang yang berada dibawah jalur SUTET 275 kV sedangkan sisanya adalah warga yang tidak mampu yang berada disekitar jalur tersebut. Organisasi dalam kelompok terdiri dari ketua dan anggota, dimana dalam pengelolaan jumlah anggota, ketua kelompok telah berkomitmen untuk menerima anggota baru yang teridentifikasi tidak mampu dan bertempat tinggal di sepanjang jalur SUTET 275 kV. Adapun jumlah anggota yang telah teridentifikasi sebagai bagian kelompok adalah sebagai berikut;

No	Nama Desa	Nama Program	Daftar Penerima Manfaat		
			Nama Kelompok	Laki Laki	Perempuan
1	Magmagan Karya	Peternakan Ayam Putih	Berkah	2	8
2	Tiga Berkat	Peternakan Ayam Putih	Lamanggrek	-	10
3	Belimbing	Peternakan Ayam Putih	Manso Tuah	-	10
4	Sahan	Peternakan Ayam Putih	Karupe'e	20	20
5	Seluas	Peternakan Ayam Putih	PKH Mana Karya	8	1
6	Bange	Peternakan Kambing	Maju Sejahtera	12	1
7	Sango	Peternakan Kambing	Badeh Sejahtera	9	-
8	Lamolda	Pertanian Jagung	Maju Bersama	15	9
9	Lesabela	Pertanian Jagung	PKH Bunga Anggrek	-	26
10	Jesape	Alsintan Pertanian Jagung	Karya Baru	16	9
11	Gua	Olahan Ubi Rambat	Maju Bersama	-	6
12	Mayak	Kerajinan Anyaman Bambu	Silpa	-	10
13	Jagoi	Kerajinan Pembuatan Bidai	Baluk Barista	6	24
Sub Total				88	134
TOTAL				222	

Tabel 4.1.1 Monitoring anggota kelompok

Data penerima manfaat semenjak pembentukan kelompok hingga efektifnya kegiatan sampai dengan serah terima telah menyerap sebanyak 222 orang dimana sebanyak 60 % anggota kelompok di dominasi oleh kaum Ibu atau perempuan.

Jumlah Penerima Manfaat	
Laki Laki	88
Perempuan	134
Total	222




Tabel 4.1.2 Tabel persentase penerima manfaat

4.2. EVALUASI PROGRAM

Pada tanggal 26 September 2019 telah dilaksanakan serah terima program secara resmi bertempat di Gedung Aula Kantor Bupati Bengkayang yang dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial, seluruh Camat dan Kepala Desa. Sinergi antara PLN UIP Kalbagtim dengan pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk program “PLN Peduli ekonomi Bengkayang” dapat terjalin dengan baik. Sehingga program yang diikuti oleh sekitar 222 orang sebagai penerima manfaat yang tercatat dengan mayoritas perempuan, dapat merasakan manfaat secara langsung atas pelaksanaan program PLN Peduli Ekonomi Bengkayang.

Evaluasi akhir dari pencapaian program disampaikan pada kesempatan serah terima program. Tercatat pengembangan usaha yang paling baik pada penilaian awal saat ini muncul dari sektor ternak yaitu peternakan ayam dari Desa Seluas. Berdasarkan hasil penjualan untuk bibit tahap satu, kelompok berhasil mendapatkan omset sebesar Rp. 58.567.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk tahap dua berhasil mendapatkan sebesar Rp. 44.839.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga melalui program CSR ini, kelompok dapat mengumpulkan laba kotor sebesar Rp. 103.406.000,00 (seratus tiga juta empat ratus enam ribu rupiah). Kemudian sektor yang sama pada Desa Belimbing penjualan tahap satu dan dua dapat mengumpulkan laba kotor sebesar Rp. 83.830.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) di ikuti oleh desa lainnya dengan kisaran keuntungan kotor yang sama. Perbedaan hasil penjualan



panen pada sektor ayam disebabkan bedanya pengelolaan ternak ayam oleh kelompok (keunggulan kelompok dalam mengurangi susut), hal lain dikarenakan beberapa kelompok memiliki target masa waktu panen yang berbeda hingga harga jual per-kilogram yang berbeda (tergantug harga pasar saat panen).


Pada usaha peternakan kambing, diketahui pemeliharaan ternak ini memiliki jangka waktu yang relatif lebih lama.Susut atau matinya bibit kambing juga terjadi di Desa Bange sebanyak 1 ekor, hal ini terjadi karena kambing jatuh sakit. pemberian bibit ke dua kambing juga terkendala lebih lama dikarenakan faktor alam yaitu kabut asap yang cukup tebal menyelimuti Kabupaten Bengkayang dan seluruh Kalimantan Barat pada umumnya. Kabut asap juga mempengaruhi sektor pertanian dan olahan untuk penanaman bibit sebagai langkah awal dalam usahanya, namun hal tersebut di isikan dengan kegiatan - kegiatan penyuluhan dan diskusi kelompok tiap usaha.

Usaha kerajinan anyaman bambu oleh Desa Mayak dan anyaman bidai oleh Desa Jagoi melalui CSR ini telah meningkatkan hasil penjualan produk melalui pemenuhan peralatan kerja dan bahan baku anyaman. Kelompok kerajinan anyaman ini memang telah eksis sedari dahulu sehingga dengan adanya bantuan program CSR ini para pekerja lebih produktif dan dapat meningkatkan hasil penjualannya. Ketika produk sudah jadi kemudian dijual, maka setengah dari hasil pendapatan tersebut akan dijadikan sebagai modal untuk usaha kelompok yang mandiri dan setengahnya kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggota kelompok.

Secara Umum pengukuran keberhasilan program PLN Peduli Ekonomi Bengkayang dapat dilihat dari implementasi pelaksanaan program yang telah dijalankan. Sebagai evaluasi akhir program dilakukan self assessment dengan indikator untuk mengukur keberhasilan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR/SKALA	5 Sangat Berhasil	4 Berhasil	3 Cukup Berhasil	2 Kurang Berhasil	1 Gagal
1	Partisipasi Aktif Masyarakat	V				
2	Ada Lembaga Yang Mengelola Program		V			
3	Ada Pengawasan Intern		V			
4	Program dilaksanakan sesuai dengan workplan			V		

Tabel 4.2.1 Self assessment akhir program



BAB V HAL LAIN

Implementasi kegiatan program hingga peresmian akhir penyerahan secara simbolis dapat dilaksanakan PT PLN (Persero) UIP Kalbagtim dengan berkolaborasi bersama PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar dan PT PLN (Persero) UIW Kalbagbar. Hal ini juga menjadi kunci sukses dari monitoring dan pengawasan program yang dilaksanakan secara internal PLN, mengingat faktor geografis lokasi PLN UIP Kalbagtim yang bertempat di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Monitoring dan pengawasan kegiatan juga dilakukan Kantor PLN Pusat, PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek (PUSMANPRO) serta ADB sebagai mitra kerja PLN.

Program CSR PLN Peduli Ekonomi Bengkayang ini merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai wujud terima kasih atas apa yang telah diberikan untuk PLN baik dukungan dan bantuan atas pengadaan lahan hingga pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan SUTET 275kV Bengkayang – Jagoi Babang rampung dan saat ini dapat dioperasikan.

Pada sesi akhir program guna meningkatkan mutu kemitraan PLN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan warga pada lintasan jalur SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoibabang pada khususnya, PLN merilis berita yang pada media elektronik yang dapat dilihat pada web berikut ini :

1. <https://pontianakpost.co.id/dukung-pembangunan-13-desa-di-bengkayang-pln-berikan-bantuan-csr/>
2. <http://www.rmolkalbar.com/read/2019/09/27/7501/Dukung-Pembangunan-13-Desa-Di-Bengkayang,-PLN---Berikan-Bantuan-CSR->
3. <https://equator.co.id/dukung-pembangunan-13-desa-di-bengkayang-pln-berikan-bantuan-csr/>

Adapun untuk dokumentasi foto dan video dilampirkan menjadi satu bagian dari laporan ini atau dapat diambil pada link berikut ini :

https://drive.google.com/open?id=1oAnmr0XHzXP_Y1AjM2DSFNRWRBjo8d3e



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

1. Dalam program CSR “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” PLN UIP Kalbagtim telah memenuhi dan melaksanakan amanah Undang-Undang serta peraturan yang berlaku tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) dan pemenuhan Social Safeguard pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Pontianak Kalimantan Barat;
2. Pelaksanaan program CSR “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 366.K/DIR/2007 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/ Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L);
3. Seluruh jadwal kegiatan dan dan anggaran yang disusun didalam RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” telah sesuai direalisasikan;
4. Program CSR “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” telah meningkatkan kesejahteraan kelompok atau penerima manfaat sesuai dengan sasaran pemberdayaan ekonomi di sepanjang jalur Transmisi SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoibabang;
5. Program CSR “PLN Peduli Ekonomi Bengkayang” telah meningkatkan citra perusahaan baik bagi pandangan warga sekitar transmisi hingga masyarakat luas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.

6.2. SARAN

1. Adapun penyelesaian program telah dilaksanakan oleh PLN agar monitoring dan pendampingan tetap dilaksanakan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Aparatur Sipil Negara di tingkat Desa hingga Kecamatan dalam menjaga eksistensi kelompok dan usaha yang telah dibentuk;
2. Dibutuhkan konsistensi dan semangat berkembang oleh anggota kelompok untuk mempertahankan serta meningkatkan usaha yang telah dimiliki;
3. Program CSR ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang maupun Institusi BUMN atau Swasta yang memiliki kegiatan perusahaan kerja wilayah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII
PENUTUP

Kegiatan ini berorientasi dalam lingkup sosial, khususnya untuk masyarakat sekitar lokasi pembangunan jaringan transmisi SUTET 275kV Bengkayang – Jagoi Babang di Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya peningkatan ekonomi dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar proyek. Melalui gerakan program CSR "PLN Peduli Ekonomi Bengkayang" ini, tercipta suatu kondisi sosial dimana masyarakat dapat menerima kehadiran PLN dalam pembangunan infrastruktur untuk melistriki wilayahnya. Masyarakat juga merasa ikut memiliki tanggungjawab menjaga infrastruktur kelistrikan dan bangga menjadi bagian dari pembangunan proyek PLN itu sendiri.

Diharapkan melalui program CSR ini kewajiban, kepedulian serta citra perusahaan PT. PLN (Persero) UIP KALBAGTIM dapat terpenuhi dan tercermin seiring usaha pembangunan ketenagalistrikan demi terwujudnya Kalimantan terang.

Mengetahui,

PLT. SRM PERTANAHAN DAN KOMUNIKASI

ASISTEN MANAJER KOMUNIKASI



BUDI SUSETYO



JOHANNES GUNAWAN SIRAIT







DOKUMENTASI



SEKTOR TERNAK





SEKTOR TERNAK







SEKTOR OLAHAN DAN ANYAMAN



OLAHAN DAN ANYAMAN



PERESMIAN PROGRAM




PENERIMA MANFAAT




DAFTAR PENERIMA MANFAAT

DAFTAR PENERIMA MANFAAT CSR
"PLN PEDULI EKONOMI BENGKAYANG"
PT PLN (PERSERO) UIP KALIMANTAN BAGIAN TIMUR


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	BUDI SETIONO	L	MAGMAGAN
2	YULIANTO	L	
3	NOVILIANA SARI	P	
4	PARIDA	P	
5	MARDIAH LAPUT	P	
6	IRAH IRAHMA	P	
7	NURLAILI	P	
8	YUSPITA	P	
9	RITA	P	
10	ANASTASIA IRIN	P	
11	PANI	P	TIGA BERKAT
12	KLARA	P	
13	TIA SUHARTIEM	P	
14	YUSTINA	P	
15	TANUM	P	
16	FARIDA	P	
17	MURNI	P	
18	VERONIKA	P	
19	JAJUK	P	
20	KRISTINA	P	
21	MARGARETA APENG	P	BELIMBING
22	ROBIANA	P	
23	YUSTINA	P	
24	HELENA WATI	P	
25	SANTI	P	
26	NORMAH	P	
27	IJUMILDA	P	
28	JUMINAH	P	
29	SUKARSIH	P	
30	RANDA	P	
31	MATSAM	L	LAMOLDA
32	SIMON SUMAN	L	
33	TIAM	L	
34	P GARANSE	L	
35	ASANG	L	
36	BIDAI	P	
37	SIMAH	P	
38	AMOY	P	




39	ALEKSANDER	L	
40	HARDIMAN	L	
41	P MISANG	L	
42	TUTUK	L	
43	Y BUYUK	L	
44	NURLELA	P	
45	NURSI AH	P	
46	AGUS	L	
47	ANGA	L	
48	MARSAHIT	L	
49	SANTULIT	L	
50	B LENA	P	
51	M KASONG	L	
52	LIDIA PIRI	P	
53	Y TEOBA	P	
54	ATIK	P	
55	JAIDAH	P	LASABELA
56	PAULA DINDIL S	P	
57	EMILIANA MAI	P	
58	ANENG	P	
59	DAYOK	P	
60	YOHANA MARIA	P	
61	MINA	P	
62	MISAH	P	
63	ENI	P	
64	JUNI	P	
65	PAULINA	P	
66	AMI	P	
67	ANYUN	P	
68	ANYUK	P	
69	A RINA	P	
70	DINDIK	P	
71	EKAMIS	P	
72	EMELIANA ALIS	P	
73	INDIA	P	
74	KARIKIH	P	
75	KRISTINA KARTIANA DAO	P	
76	MARIA GUTU	P	
77	MEUPA IPO	P	
78	NONA	P	
79	SUMIATI	P	
80	NALI	P	
81	TIUS DAVID YUSMAN	L	JESAPE
82	SUYANTO	L	
83	LILIS SUWANTO	L	




84	ANWAR B	L		
85	HON JIN	L		
86	SUPARDAN	L		
87	M SALEH	L		
88	JAWAWI	L		
89	MAT JUNI	L		
90	JAIRI	L		
91	SURIPTO	L		
92	JAMANI	L		
93	SUGITO	L		
94	WARDI	L		
95	NAJUAN	L		
96	RUSNAH	P		
97	TIKA ROSALIA	P		
98	IDA YANI	P		
99	FRANSISKA YOSIANA	P		
100	RUSNI	P		
101	LUSIANA AJINI	P		
102	ERTATI	P		
103	ALUSIATI	P		
104	RUPIATIN	P		
105	HERMAN	L		
106	RAHMAT	L		BANGE
107	HUMBING	L		
108	ADIONG	L		
109	ANADI	L		
110	MINA	P		
111	DIUS	L		
112	MULYADI	L		
113	JULYADI	L		
114	KRISMANTO	L		
115	RONI	L		
116	TERES	L		
117	ITUS PIRDAUS	L		
118	ISEP	L		
119	SRI SUJINEM	P	GUA	
120	SITI YASMIRAH	P		
121	WAHYUNI	P		
122	ETTI HANDAYANI	P		
123	BONIYAH	P		
124	PAINI	P		
125	FRANSISKUS PRIYATNO	L	SANGO	
126	HERMANUS HERIMANSIUS	L		
127	GREGORIUS GINAS	L		
128	YOHANES TOTO	L		



129	KONGGEN	L	
130	LECI	L	
131	YAKOBUS ARISTO NANANG	L	
132	JULING	L	
133	PRADITAMA	L	
134	ARISTON APUK	L	SAHAN
135	NIKODEMUS	L	
136	LOSARIANUS ARDIMAS	L	
137	TONI	L	
138	ANSELMUS MUNEN	L	
139	JIBARTO	L	
140	SAPOR	L	
141	DEVRI ALVON XANDER	L	
142	APRIANUS	L	
143	EYENG	L	
144	OKTAVIANUS	L	
145	ROBIN. K	L	
146	EMIR	L	
147	AGUSTINUS ODO	L	
148	ATIAU	L	
149	PETRUS	L	
150	ARVIKTOR	L	
151	BENO. S	L	
152	K. TATIK	L	
153	STYANTO	L	
154	KATARINA ATUK	P	
155	NIAR	P	
156	DAYA PINA YUNI	P	
157	LUSIA NEON	P	
158	LUSIANA APUNG	P	
159	MARIA NURHAYATI	P	
160	MARIA NURHAYATI	P	
161	RAIN MILIA	P	
162	AMBIL	P	
163	ANTONIA UNTUN	P	
164	ASTERIA ROMITA	P	
165	IDA LAILA	P	
166	JENAH	P	
167	JURAINI ATONG	P	
168	KRISTINA F	P	
169	NINGESIH	P	
170	NOMI	P	
171	ONEK	P	
172	SERI WATI	P	



173	UTUK	P	
174	SILI	P	MAYAK
175	NOVITA SARI	P	
176	ENDA	P	
177	TAMAH	P	
178	GADUH	P	
179	ILIANA	P	
180	HERLINA DAYANG	P	
181	MARGARETA	P	
182	JIHIM	P	
183	ELIA	P	
184	WARJO	L	SELUAS
185	USMAN	L	
186	ALKHALIK	L	
187	YANTO	L	
188	SAMUEL JERO	L	
189	AE	L	
190	JUMBEN	L	
191	FRANSISKA	P	
192	AMIN	L	JAGOI
193	ROSLINDA	P	
194	MEKIYANTI	P	
195	SEWING SERYATI	P	
196	MIMI	P	
197	DIYEW	P	
198	BUJEK	P	
199	YUSTINA AMINAH	P	
200	JAMI	P	
201	JENIDAH TONEL	P	
202	MENIS	P	
203	SELIAN	P	
204	ITAWATI	P	
205	SARI	P	
206	LIGEN	P	
207	IKUAI KIBIAL	P	
208	NORMA YUNITA	P	
209	HERMAN ATANG. S	L	
210	ISAWATI	P	
211	GUYENG	P	
212	RUPITA TANJUNG	P	
213	JONDAY. AK. N	P	
214	NYAGOL	P	
215	YOHANES JIMIT	L	
216	HAMIJAH	P	



217	TETI DAMAYANTI	P	
218	KUSWANDI	L	
219	MARIUS	L	
220	ELIS	P	
221	MITAH	L	
222	SUHARDI	L	



REALISASI ANGGARAN



RISALAH HASIL SURVEY RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Bantuan Peternakan Ayam Putih
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Magaragan Kanyo
5	Tanggal Survey / wawancara	:	12 April 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	Memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk berternak agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba dari penjualan ternak yang dikembangkan.
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. - meningkatkan hubungan baik antar anggota kelompok
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya (sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya (sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Amira Nabha		1. Budi Setiawan	
2. Mela Sunanih		2. Tawanih	



**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : BUDI S
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : KELOMPOK USAHA BERSAMA "BERLAH"
Alamat : DESA MAMAGAN KAMPA
No Telp :

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 165.570.000,00

Terdibang : Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor Rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan :-

Bantuan Dana BL untuk Bantuan :

Untuk Perawatan :

1. Biaya Pembangunan Kandang 2 kandang masing-masing kelompok untuk kapasitas 1000 ekor ayam
2. Biaya Peralatan Kandang (tempat makan ayam, tempat minum ayam, kawat alas, terpal, pemanas ruangan, keranjang ayam, palan ayam, vitamin ayam, botolam, tabung gas)
3. Biaya Pembelian Bibit ayam 1000 ekor
4. Biaya Penyuluhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindakan lanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu memsocialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan hemat

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermeterai, tempel

*) coret salah satu

BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

BUDI S : Ketua Kelompok Usaha Bersama "BERKAH" Desa Magmagan Karya

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa peternakan ayam putih lengkap dengan kandang dan peralatan senilai Rp 165.570.000,00 (Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan peternakan ayam putih untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019



**RISALAH HASIL SURVEY
RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)**

1	Nama Program	:	Bantuan Peternakan Ayam Putih
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Tiga Berkat
5	Tanggal Survey / wawancara	:	12 April 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	Memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk berternak agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba dari penjualan ternak yang dikembangbiakan.
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. - meningkatkan hubungan baik antar anggota kelompok
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dan PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya (sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya (sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	
1. Amata Nabila		1. Panti	
2. Nita Luvant		2. Tiara Satrio	

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : YANI
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : KELompok USAHA BERSAMA "LAMANGREK"
Alamat : DESA TINA BEEKAT
No Telp :

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 165.570.000,00

Tertibang : Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan :-

Bantuan Dana DI untuk Bantuan :

Untuk Peruntukan :

1. Biaya Pembangunan Kandang 2 kandang masing-masing kelompok untuk kapasitas 1000 ekor ayam
2. Biaya Peralatan Kandang (tempat makan ayam, tempat minum ayam, kawat alas, terpal, pemanas ruangan, keranjang ayam, pakan ayam, vitamin ayam, bohlam, talung gas)
3. Biaya Pembelian bibit ayam 2000 ekor
4. Biaya Penyuluhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindaklanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu memsosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterai, stempel

*) coret salah satu



BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

PANI : Ketua Kelompok Usaha Bersama "LAMANGGREK" Desa Tiga Berkat

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa peternakan ayam putih lengkap dengan kandang dan peralatan senilai Rp 165.570.000,00 (Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan peternakan ayam putih untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019



**RISALAH HASIL SURVEY
RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)**

1	Nama Program	:	Bantuan Peternakan Ayam Putih
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Belimbing
5	Tanggal Survey / wawancara	:	12 April 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	Memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk berternak agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba dari penjualan ternak yang dikembangkan.
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. - meningkatkan hubungan baik antar anggota kelompok
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Anisa Nabila		1. Margaretha Apung	
2. Nila Sunani		2. Tiara Sumpu	

BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M,T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

MARGARETA APENG : Ketua Kelompok Usaha Bersama "MANSO TUAH" Desa Belimbing

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa peternakan ayam putih lengkap dengan kandang dan peralatan senilai Rp 165.570.000,00 (Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan peternakan ayam putih untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019

PENERIMA



(MARGARETA APENG)



**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : MARGARETA APENG
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : KELOMPOK USAHA BERSAMA "MAMBA TUH"
Alamat : DESA BELIMBING
No Telp :

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 165.370.000,00

Terbilang : Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor Rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan :-

Bantuan Dana BL untuk Bantuan :

Untuk Peruntukan :

1. Biaya Pembangunan Kandang 2 kandang masing-masing kelompok untuk kapasitas 1000 ekor ayam
2. Biaya Peralatan Kandang (tempat makan ayam, tempat minum ayam, karung alas, terpal, pemeras ruangan, keranjang ayam, pakan ayam, vitamin ayam, bohlam, tabung gas)
3. Biaya Pembelian Bibit ayam 2000 ekor
4. Biaya Penyuluhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindaklanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Memalisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kejelasan kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (hidat mencari)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bongkayang, 12 April 2019
PENERIMA MANFAAT



Keterangan :

- Mohon di tandatangi, bermaterai, stempel
- *) coret salah satu

Margareta Apeng

RISALAH HASIL SURVEY RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Bantuan Pertanian Jagung
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Landa
5	Tanggal Survey / wawancara	:	
6	Tujuan Kegiatan	:	Maintainance program pertanian & meningkatkan produksi padi - berprestasi
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	ada peningkatan produksi
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dan PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Anisa Nabih		1. Matsari	
2. Mita Suwanti		2. Turian Sumantri	



**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : _____

Perwakilan dari (Tayasan/
Komunitas/NGO/dll) : _____

Alamat : _____

No Telp : _____

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : *Mang / Barang ** , senilai Rp 129.795.000,00

Terbilang : Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor Rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan :-

Bantuan Dana BK untuk Bantuan :

Untuk Peruntukan :

1. Biaya Pembelian SBT jagung
2. Biaya Pembelian Perawatan Pertanian (Pupuk dan racun rumput)
3. Biaya Pembelian Mesin Pemipil Jagung, Mesin Penggiling jagung, Mesin Handtraktor
4. Biaya Branding Kemasan
5. Biaya Penyuluhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindaklanjut dan bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Memaksanakan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SBT (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Matsam


Keterangan :

- Momen di tandatangani, bermaterai, stempel
- *) coret salah satu

BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

MATSAM : Ketua Kelompok Usaha Bersama "MAJU BERSAMA" Desa Lamolda

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa pertanian jagung lengkap senilai Rp 129.795.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan pertanian jagung untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan


Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019

PENERIMA



(MATSAM)



(FATTAH WIBISONO)

RISALAH HASIL SURVEY RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Pertanian Jagung
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Lesabela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang
5	Tanggal Survey / wawancara	:	25 Januari 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	- Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kab. Bengkayang
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Lapangan Pekerjaan yang dapat menghasilkan
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	Program CSR SUTET 275kV Bengkayang - Jagoibabang

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	
1. Annisa Nabliha		1. Jaidah	
2. Nila Siswanti		2. Didik Wicaksono	

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)**

Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

JAIDAH : KETUA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PKH BUNGA ANGREK

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa dana sebesar Rp 111.070.000,00

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan Pertanian jagung termasuk bahan baku, peralatan dan pelatihan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan wadah bagi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) setempat agar semakin berkembang.
- Semakin bertambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ledo, 12 April 2019

PENERIMA



**PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN
BAGIAN TIMUR**



(FATTAH WIBISONO)

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : JAIDAH
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PKH BUNGA ANGREK

Alamat : SEMAYAS DUSUN BELATIK DESA LESABELA

No Telp : -

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 111.070.000,00

Terbilang : Seratus sebelas juta tujuh puluh ribu rupiah

Untuk Bantuan :

Kegiatan Pertanian Jagung [Bibit, Pupuk, Peralatan]

Tindakanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat I (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhankegiatantersebut.
4. Membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanyekesadaranpenggunaanlistrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ledo, 12 April 2019
PENERIMA MANFAAT

Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterai, stempel

*) coret salah satu



RISALAH HASIL SURVEY RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Asintan
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Jesape, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang
5	Tanggal Survey / wawancara	:	25 Januari 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	- Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kab. Bengkayang
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Lapangan Pekerjaan yang dapat menghasilkan
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	Program CSR SUTET 275kV Bengkayang - Iagoibabang

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Annisa Nabaha		1. Tius David Yusman	
2. Nila Siswanti		2. Didik Wicaksono	

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)**

Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

TIUS DAVID YUSMAN : **KETUA KELOMPOK TANI KARYA BARU**

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa dana sebesar Rp 129.795.000,00

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan Ahinta, Bibit, Pupuk, termasuk bahan baku, peralatan dan pelatihan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan wadah bagi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) setempat agar semakin berkembang.
- Semakin bertambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ledo, 12 April 2019

PENERIMA



(TIUS DAVID YUSMAN)

**PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN
BAGIAN TIMUR**



(FATTAH WIBISONO)

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : TIUS DAVID YUSMAN
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : KELOMPOK TANI KARYA BARU

Alamat : DUSUN JELATANG DESA JESAPE KEC. LEDO
No Telp :

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 129.795.000,00

Terbilang : Seratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh limaribu rupiah

Untuk Bantuan :

Kegiatan Alsipta (Bibit, Pupuk, Peralatan)

Tindakan/lanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhankegiatantersebut.
4. Membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakalan listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan asset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ledo, 12 April 2019
PENERIMA MANFAAT

Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterai, stempel
- *) coret salah satu



(TIUS DAVID YUSMAN)

**RISALAH HASIL SURVEY
RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)**

1	Nama Program	:	Bantuan Peternakan Kambing
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Bangor
5	Tanggal Survey / wawancara	:	12 April 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	Memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk berternak agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba dari penjualan ternak yang dikembangkan.
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. - meningkatkan hubungan baik antar anggota kelompok
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Amisa Nabila		1. HERMAN	
2. Nisa Samanti		2. Chandra Keloro	

BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

HERMAN : Ketua Kelompok Usaha Bersama "MAJU SEJAHTERA"
Desa Bange

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa peternakan kambing lengkap senilai Rp 118.200.000,00 (Seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah),

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan peternakan kambing untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019

PENERIMA



(HERMAN)



**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : HERMAN
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : KELOMPOK USAMA BERSAMA "MAJU SEJAHTERA"
Alamat : DEGA BANGE
No Telp :

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa (Uang / Barang *), senilai Rp 118.200.000,00

Terbilang : Seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor Rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan :-

Bantuan Dana DL untuk Bantuan :

Untuk Peruntukan :

1. Biaya Pembelian Sisi Kambing
2. Biaya Pembangunan Kandang (2 kandang dalam 1 kelompok)
3. Biaya Vitamin/Vaksin
4. Biaya Penyuluhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindaklanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu memsocialhaskan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bengkayang, 12 April 2019
PENERIMA MANFAAT

Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterai, stempel
- *] coret salah satu



RISALAH HASIL SURVEY RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Bantuan Olahan Ubi Rambut
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Gura
5	Tanggal Survey / wawancara	:	
6	Tujuan Kegiatan	:	Mendapatkan hasil usaha olahan ubi rambut sebagai keping & membantu lapangan pekerjaan warga desa
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	Mendapatkan penghasilan tambahan
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya[sebutkan]
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesiadaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesiadaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya[sebutkan]
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Annisa Nabila		1. SRI SUJINEM	
2. Mita Irawan		2. Chandra Kelana	

BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

: Ketua Kelompok Usaha Bersama "MAJU BERSAMA" Desa Gua

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa program untuk olahan ubi rambat menjadi tepung lengkap dengan alat dan budidaya ubi rambat senilai Rp 117.818.000,00 (Seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan kreasi produk olahan ubi rambat menjadi tepung untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019

PENERIMA



(Sri Sugiono)



P. PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
PEMBANGUNAN
KALIMANTAN
BAGIAN TIMUR

(FATTAH WIBISONO)

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : _____
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : _____
Alamat : _____
No Telp : _____

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 117.818.000,00

Terbilang : Seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor Rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan, :-

Bantuan Dana BL untuk Bantuan :

Untuk Peruntukan :

1. Biaya Pembelian Bibit Ubi Rambat/Ubi Jalar
2. Biaya Pembelian Mesin Kupas, Mesin Parut, Mesin Peras, dan Mesin Penepung
3. Biaya Branding Kemasan
4. Biaya Penyuluhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindaklanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu memsocialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan sendiri yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bengkayang, 12 April 2019

PENERIMA MANFAAT

Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterai, stempel
*) coret salah satu



RISALAH HASIL SURVEY
RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Bantuan Peternakan Kambing
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Sango
5	Tanggal Survey / wawancara	:	12 April 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	Memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk beternak agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba dari penjualan ternak yang dikembangkan.
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. - meningkatkan hubungan baik antar anggota kelompok
8	Manfaat untuk PLN	:	<ul style="list-style-type: none"> - Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	<ul style="list-style-type: none"> a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya <p style="text-align: right;">..... (sebutkan)</p>
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	<ul style="list-style-type: none"> a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya <p style="text-align: right;">..... (sebutkan)</p>
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	
1. Annisa Nabika		1. Fransiskus Pr...	
2. Nika Iwanan		2. Chandro I...	

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa

Nama : **FRANSISKUS**
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : **KELM PDL USAHA BERKAMA "BAGH SEJAHTERA"**
Alamat : **DEGA SAMBO**
No Telp :

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 118.200.000,00

Terbilang : Seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor Rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan :-

Bantuan Dana BI, untuk Bantuan :

Untuk Perantoran :

1. Biaya Pembelian Bibit Kambing
2. Biaya Pembangunan Kandang (2 kandang dalam 1 kelompok)
3. Biaya Vitamin/Vaksin
4. Biaya Penyuluhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindakan lanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang aman (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan ikhlas yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bengkayang, 12 April 2019

PENDIRI MANFAAT



Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterai, stempel
- *) coret salah satu

BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

FRANSISKUS : Ketua Kelompok Usaha Bersama "BADEH SEJAHTERA"
Desa Sango

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa peternakan kambing lengkap senilai Rp 118.200.000,00 (Seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan peternakan kambing untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019

PENERIMA



(FRANSISKUS)



(FATTAH WIBISONO)

RISALAH HASIL SURVEY
RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Bantuan Peternakan Ayam Putih
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Sahan
5	Tanggal Survey / wawancara	:	12 April 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	Memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk berternak agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba dari penjualan ternak yang dikembangbiakan.
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. - meningkatkan hubungan baik antar anggota kelompok
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Anisa Nabita		1. Ariston Apuk	
2. Nib Juvanh		2. Helis Candri . E	

BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

ARISTON APAK : Ketua Kelompok Usaha Bersama "KARUPE'E" Desa Sahau

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa peternakan ayam putih lengkap dengan kandang dan peralatan senilai Rp 165.570.000,00 (Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan peternakan ayam putih untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019

PENERIMA


(Ariston Apak)

**PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGUNAN
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**


(FATTAH WIBISONO)

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : Ariston Apuk
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : Kelompok Kampung
Alamat : Desa Sahari Kcc. Seluas
No Telp :

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 165.570.000,00

Tertiblah : Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor Rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan :-

Bantuan Dana BL untuk Bantuan :

Untuk Perumahan :

1. Biaya Pembangunan Kandang 2 kandang masing-masing kelompok untuk kapasitas 1000 ekor ayam
2. Biaya Peralatan Kandang (tempat makan ayam, tempat minum ayam, kawat alas, terjal, pemanas ruangan, keranjang ayam, pakan ayam, vitamin ayam, bohlam, tabung gas)
3. Biaya Pembelian Bibit ayam 2000 ekor
4. Biaya Penyuluhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindaklanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas keberanian dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu memsosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdapat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bengkayang, 12 April 2019
PENERIMA MANFAAT



Ariston Apuk
Ariston Apuk

Keterangan :

- Mohon di tandatangi, bermaterai, stempel
- *) coret salah satu



RISALAH HASIL SURVEY

RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	:	Olahan Bambu
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Mayak, Kec. Sanggau Lodo, Kab. Bengkayang
5	Tanggal Survey / wawancara	:	25 Januari 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	- Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kab. Bengkayang - Kesiapan terkait produk bidai sebagai produk Kalimantan Barat
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Modal berupa bahan baku tersedia sehingga produksi anyaman bambu dapat terus dilakukan
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	Program CSR SUTET 275kV Bengkayang - Iagoibabang

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Annisa Nabiha		1. Sili	
2. Nila Siswanti		2. Juri Atman	



**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : Sili
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : KUBE SILPA

Alamat : Dusun Pejampi, Desa Mayak Kec. Seluas
No Telp : 081351754920

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 120.935.000,00

Terbilang : Seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Untuk Bantuan :

Kegiatan Olahan Bambu menjadi Anyaman (Bahan Baku, Peralatan, dan Pelatihan)

Tindaklanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Bengkayang, 12 April 2019
PENERIMA MANFAAT



Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterial, stempel
- *) coret salah satu

(S I L I)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)**

Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

S I L I : Ketua Kelompok Usaha Bersama SILPA
Dusun Pejampi, Desa Mayak, Kecamatan Seluas

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa dana sebesar Rp 120.935.000,00

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan olahan Bambu termasuk bahan baku, peralatan dan pelatihan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan wadah bagi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) setempat agar semakin berkembang.
- Memanfaatkan Bahan baku yang banyak tersedia di alam agar lebih bernilai ekonomis.
- Semakin bertambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar.
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, 12 Januari 2017



**RISALAH HASIL SURVEY
RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)**

1	Nama Program	:	Bantuan Peternakan Ayam Putih
2	Jenis bantuan	:	Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:	
4	Lokasi Kegiatan	:	Desa Seluar
5	Tanggal Survey / wawancara	:	12 April 2019
6	Tujuan Kegiatan	:	Memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk berternak agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba dari penjualan ternak yang dikembangkan.
7	Manfaat untuk Masyarakat/ Komunitas	:	- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. - meningkatkan hubungan baik antar anggota kelompok
8	Manfaat untuk PLN	:	- Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	:	a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya(sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	:	a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya(sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	:	

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Amra Nabaha		1. Bayu Ibrahim	
2. Mita Sunanti		2. Iyan	



**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : Boyu Tashim
**Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll)** : Kelompok POKT Mami Kangas
Alamat :
No Telp :

Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp 165.570.000,00

Terbilang : Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Bantuan ditransfer PLN ke rekening, yaitu :

- Nama Rekening, :-
- Nomor Rekening, :-
- Nama Bank, :-
- Untuk Bantuan :-

Bantuan Dana BL untuk Bantuan :

Untuk Forustaker :

1. Biaya Pembangunan Kandang 2 kandang masing-masing kelompok untuk kapasitas 1000 ekor ayam
2. Biaya Peralatan Kandang (tempat makan ayam, tempat minum ayam, kawat alas, terpal, pemanis ruangan, keranjang ayam, pakan ayam, vitamin ayam, bobbles, tabung gas)
3. Biaya Pembelian Bibit ayam 2000 ekor
4. Biaya Penyukhan/Pelatihan dan Pendampingan

Tindaklanjut dari Bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan pemuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu mempromosikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan aset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Sehat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan pemuh tanggung jawab.

Bengkayang, 12 April 2019



Keterangan :

- Mohon di tandatangan, bermaterai, stempel
- *) coret salah satu

BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)

Nomor :

Pada hari ini Jumat tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

BAYU ISAHIM : Ketua Kelompok PKH "MANA KARYA"
Desa Seluas

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manajer Bidang Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa peternakan ayam putih lengkap dengan kandang dan peralatan senilai Rp 165.570,000,00 (Seratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan peternakan ayam putih untuk dikelola secara kelompok
- Penyuluhan dan Pendampingan kelompok secara berkala selama 6 bulan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan lapangan pekerjaan yang dikelola secara kelompok sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di desa tersebut
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 12 April 2019

PENERIMA



(BAYU ISAHIM)

**PT PLN (PERSERO)
UNIT-INDUK PEMBANGUNAN
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**



(FATTAH WIBISONO)

RISALAH HASIL SURVEY RENCANA PROGRAM PT PLN (PERSERO)

1	Nama Program	: Olahan Rotan
2	Jenis bantuan	: Bantuan Fisik / Non-Fisik *)
3	Bentuk bantuan Non Fisik	:
4	Lokasi Kegiatan	: Desa Jagoi, Kec. Jagoi Bahang, Kab. Bengkayang
5	Tanggal Survey / wawancara	: 25 Januari 2019
6	Tujuan Kegiatan	: - Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kab. Bengkayang - Keseriusan terkait produk bidai sebagai produk Kalimantan Barat
7	Mandiat untuk Masyarakat/ Komunitas	: - Modal berupa bahan baku tersedia sehingga produksi bidai dapat terus dilakukan
8	Mandiat untuk PLN	: - Citra positif perusahaan - Menjaga relasi dengan stakeholder - Branding PLN pada nama program, dan souvenir program
9	Sumber dana bantuan untuk program ini adalah	: a. donatur dari beberapa institusi BUMN/ pemerintah, b. dari PLN 100% c. ada kontribusi masyarakat d. lainnya (sebutkan)
10	Potensi pengembangan program untuk Citra PLN	: a. kesediaan dibangun spanduk / seragam "BANTUAN PLN" b. kesediaan memberikan nama program yang memberikan karakter PLN c. lainnya (sebutkan)
11	Hal lain yang perlu disampaikan	: Program CSR SUTET 275kV Bengkayang - Jagoi Bahang

TIM PT PLN		TIM EKSTERNAL	
Nama	TTD	Nama	TTD
1. Annisa Nabihah		1. Roslinda	
2. Nila Siswanti		2. Muhammad Astaja	



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN BINA LINGKUNGAN DARI PT PLN (PERSERO)**

Nomor :

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 Bulan April Tahun 2019, dilakukan penyerahan bantuan dana bina lingkungan dari :

FATTAH WIBISONO : Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero)
Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur yang
beralamat Jalan M.T Haryono No 384 Balikpapan

Kepada

: ROSLINDA

Bantuan PT PLN (Persero) melalui Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi diberikan, berupa dana sebesar Rp 177.975.000,00

Bantuan tersebut diberikan :

- Kegiatan olahan rotan (pembuatan bidai) termasuk bahan baku, peralatan dan pelatihan

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk :

- Memberikan wadah bagi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) setempat agar semakin berkembang
- Produk bidai Jagoi lebih dikenal
- Semakin bertambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar
- Meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders
- Potensi pemberitaan nasional dan citra positif perusahaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkayang, 12 April 2019



**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN BANTUAN DANA
PT PLN (PERSERO)**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : Roslinda
Perwakilan dari (Yayasan/
Komunitas/NGO/dll) : Pengrajin Bidai
Alamat : Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Bahung, Kab. Bengkayang,
Kalbar
No Telp : 0813 4570 2828
Telah menerima bantuan dari PT PLN (Persero), berupa : Uang / Barang *) , senilai Rp
177.975.000,00

Terbilang : Seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Untuk Bantuan :

Kegiatan Olahhan Rotan menjadi Bidai (Bahan Baku, Peralatan, dan Pelatihan)

Tindaklanjut dari bantuan tersebut kami berkewajiban untuk :

1. Merealisasikan program dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran kegiatan termasuk harga satuan, volume (kuantitas) dan kualitas pekerjaan serta kesesuaian antara usulan proposal dengan realisasi bantuan.
2. Melaporkan bukti realisasi bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima. Dilengkapi dengan foto dokumentasi dan beberapa pernyataan penerima manfaat.
3. Menyerahkan dan/atau memanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan kegiatan tersebut.
4. Membantu mensosialisasikan program PT PLN (Persero) kepada masyarakat yaitu :
 - a. Pemakaian listrik yang SAH (tidak mencuri)
 - b. Membantu mengamankan asset PT PLN (Persero) di lingkungan terdekat
 - c. Kampanye kesadaran penggunaan listrik yang baik dan benar

Surat pernyataan komitmen ini Kami buat dengan kondisi yang sebenarnya dan akan Kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keterangan :

- Mohon di tandatangani, bermaterai, stempel
*) coret salah satu

Bengkayang, 12 April 2019
PENERIMA MANFAAT



(ROSLINDA)

Appendix 6 Coordination Meeting related to IRRP of Payment Gap in 275 kV Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line

Minutes of Meeting	Date	19 th January 2017
	Time	10.00 WIB
	Place	Ruang Rapat ADB
Attendees : Nening Mardinah (ADB) Hidayatullah (PLN UIP) Yustlati (Tractebel)	Note taker	Yustlati

Minutes


Agenda	Rapat pembahasan Income Restoration Program (IRP) paket 1,2, 3, 4	Presenter	- ADB - PLN UIP KBB - TRACTEBEL
--------	---	-----------	---------------------------------------

Discussion:

1. Program perbaikan mata pencaharian (Income restoration program-IRP) diberikan dengan mendasarkan pada kajian kebutuhan warga terkena dampak (AH), program corporate social responsibility (CSR) PLN, dan program Dinas Sosial setempat.
2. Pendataan akhir, WTP yang vulnerable dan terkena dampak serius (*severely affected households*) telah selesai dilakukan. Untuk Paket 1-4, total jumlah vulnerable AHs; 31 AHs, sementara *severely AHs*: 2. Data ini sedikit berbeda dengan data dalam RCCDP, tractebel akan membuat laporan verifikasi data beserta penjelasan atas perbedaan data.
 - a. Berdasarkan RCCDP Paket 1 – 2 (KV 275 TL), total *severely affected* adalah 9 orang dan vulnerable : 11 orang. Berdasarkan hasil survey verifikasi Tractebel untuk *Severely affected* : 2 orang dan vulnerable 6 orang
 - b. Berdasarkan RCCP Paket 3 – 4 (150 KV TL) total *severely affected* : 4 orang dan vulnerable 17 orang. Berdasarkan hasil survey verifikasi tractebel untuk *severely affected* : 0 dan vulnerable 25 orang.
3. Untuk IRP, pemberian bantuan bibit dan pupuk/obat beserta pelatihan pendukung akan diberikan untuk *affected households (AH)* yang bekerja sebagai petani.
4. Rencana bantuan yang akan di berikan adalah bibit jagung dan lada (sahang). Akan dilakukan pelatihan sebelum menerima bantuan bibit dan pendampingan oleh dinas terkait setelah pemberian bantuan.
5. Sahang akan diberikan 400-500 batang per orang, jagung 50-75 kg untuk lahan sekitar 1 Ha atau perkiraan minimal Rp. 1,000,000,- / keluarga.
6. Untuk *affected people* yang bukan petani dapat di berikan alternative bantuan lain seperti bantuan peternakan atau di sesuaikan dengan kebutuhan *affected people* dengan nilai setara minimal Rp 1,000,000,-/keluarga. Pelatihan dan pendampingan juga akan diberikan.

7. Biaya Pemberian IRP menjadi tanggung jawab PLN.
8. Untuk menghindari kecemburuan sosial, PLN berencana akan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan meminta list warga kurang mampu untuk kemudian ditambahkan dalam list penerima IRP maksimal 3-8 warga setiap desa (di 275 KV TL: 5 desa; 150 KV TL: 8) dimana AH's penerima IRP tinggal.
9. Tractebel harus intensif mensupport PLN, termasuk berkoordinasi dengan dinas sosial, pertanian dan perkebunan dalam pelaksanaan IRP.
10. Proposal untuk IRP akan selesai pada akhir Januari 2017 oleh PLN dan akan dikirim ke PLN pusat (SEKPER) pada akhir January 2017 untuk di evaluasi. Evaluasi dan persetujuan proposal diharapkan selesai akhir Februari 2017.
11. IRP akan di laksanakan setelah mendapat persetujuan dari PLN pusat. Pelaksanaannya dimulai pada bulan Maret 2017
12. ADB meminta klarifikasi terkait easement fee ROW 275 kV. Jika memang hasil klarifikasi terkait easement fee ROW 275 kV yang belum di laksanakan, ADB meminta easement fee 275 kV diberikan dalam bentuk IRP.
13. Lain-lain –

-- Selesai --

Nama	Email	Tanda Tangan
Naning Mardinah	nmardinah@adb.org	
Hidayatullah	hidayatullah_oka@ymail.com	
Yustiatl	yustice@yahoo.com	

**Appendix 7 Vulnerable and Severely APs in the Corridor of 150 kV
Bengkayang – Ngabang – Tayan TL**

SUMMARY OF VULNERABLE HH (PACKAGE 3) AND SEVERLY HH

APENDIX: Vulnerable Househods

No	Tower	Name (Nama)	Status in the HH / Status KK	Age / Umur	Sex / Jenis Kelamin	Occupation / Pekerjaan	Number of HH member / Jumlah anggota KK	HH income/per month (IDR / pendapatan perbulan)	Vulnerability / Kerentanan			Field survey result by PIC / Survey Lapangan oleh PIC			
									Poor / Miskin	Women headed HH /KK wanita	Elderly headed HH / Renta	survey result by PIC / Hasil Survey PIC		Photos	Vulnerability
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
SANGGAU REGENCY															
1. Village: Cempedak															
1	Transmission	Noren	HH	62	M	Laborer / Buruh	6	500,000	V			affected of ROW , involved in socialization and inventory process. Livelihood as rubber and paddy farmer. Income per month is Rp. 500,000. Pepper seedlings is expected	Lahannya terkena ROW , pekerjaan sebagai petani padi dan karet. Aktif dalam mengikuti sosialisasi proses pembebasan ROW . Pendapatan perbulan adalah Rp. 500,000. Menerima bila ada bantuan bibit sahang		Vulnerable
2	T.02	Nyonya Sarum	HH	50	F	Laborer / Buruh	4	1,300,000		V		Mrs. Sarum is not woman headed, she's married since 2001. has 1 Ha of rubber tree. She has 2 children have marreid, as her income is under Minimum regional wage, this family is vulnerabe	Nyonya Sarum telah menikah kembali tahun 2001. memiliki 2 anak, lahan terkena tapak tower dan jalur. Total lahan yang dimiliki adalah 1 Ha Meskipun bukan ukan termasuk kepala keluarga wanita. Tetapi termasuk keluarga miskin		Vulnerable
2. Village: Mak Awing															
3	T.26	Sarsa	HH	50	M	Enterpreneur / swasta	6	700,000	V			He works as rubber and paddy farmer, involve in socialization process and his land affected of tower and transmission. Land compensation has been used for surgery cost of his wife. Income is Rp. 20,000/ day	Sarsa bekerja sebagi petani karet dan padi, aktif ikut serta dalam sosialisasi pembebasan lahan. Lahan terkena tower and jalur. Kompensasi ganti rugi untuk tower di gunakan untuk biaya berobat dan bedah istrinya. Pendapatannya Rp. 20,000/day		Vulnerable
4	T.27	Annius Bebe	HH	51	M	Farmer	3	500,000	V			Anius Bebe works as rubber and paddy farmer and stll has 1 son not married yet. Land affected tower and ROW . Involve in socialization and inventory. Own 1 Ha of land. Income/ month is Rp, 1,000,000. Expect to get fertilizer (NPK & urea) aid	Anius Bebe saat masih memiliki tanggungan 1 orang anak. Lahan terkena tower dan jalur, ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan inventaris pembebasan lahan. Luas lahan yang dimiliki adalah 1 Ha, pendapatn perbulan : Rp, 1,000,000, Mengharapkan bantuan dalam bentuk pupuk NPK dan Urea		Vulnerable
3. Village: Temiang Mali															
5	T.35	Anggek	HH	55	F	Farmer / Petani	3	400,000		V		Live with her brother and work as rubber farmer. Land affected to tower and ROW . Land compensation of tower has been received and was used to renovate cemetary of her family. Her income is Rp. 400.000/month. Pepper seedlings is expected	Tinggal hanya bersama saudara laki lakinya, bekerja sebagai petani karet. Lahannya terken tower dan jalur. Kompensasi ganti rugi lahan tower di gunakan untuk renovasi kuburan keluarganya. Pendapatan perbulannya Rp. 400,000		Vulnerable
6	T.35	L. Nadir	HH	74	M	Farmer / Petani	8	1,500,000			V	Work as rubber and paddy farmer with income Rp. 500,000/month. His land affected by Tower and ROW . Land compensation for tower has been received and saved in credit union. He get paddy seedlings and fertilizer from government. He prefer to have "SEMBAKO" as income Rehabilitation	Bekerja sebagai petani karet dan padi dengan pendapatan per bulan Rp. 500,000. Tanahnya terkena tower dan ROW . Sudah mendapatkan bantuan pemerintah untuk bibit padi dan pupuk. Uang ganti rugi lahan tower di simpan di credit union. Harapan bantuan mendapatkan SEMBAKO sebagai peningkatan pendapatan		Vulnerable

7	T.37	Anyi	HH	64	M	Farmer / Petani	6	1,500,000			V	<p>He works as rubber farmer, all children have married and help him to work in rubber and paddy field. He has 2 Ha of land. His income is Rp.1.500.000/month. His land affected of tower and ROW. Land compensation of tower has been received and was shared to his son. Pepper seedlings is expected</p> <p>Bekerja sebagai petani karet, tidak ada tanggungan anak karena sudah menikah semua. Memiliki lahan 2 Ha. Pendapatannya Rp. 1,500,000/bulan. Tanahnya terken tower dan ROW. Ganti rugi lahan tower telah di bagi bagikan kepada anak anaknya</p>		Vulnerable
8	T.40	Buncang	HH	50	M	Farmer / Petani	4	2,000,000			V	<p>Buncang is sick and cannot work any more, He has land <1Ha, Land affected to tower and ROW. His income is Rp. 450,000/month. His wife work as rubber /paddy farmer. Expect to get SEMBAKO as income rehabilitation</p> <p>Buncang sudah tidak mampu lagi bekerja, sakit-sakitan. Memiliki lahan <1 Ha, lahan terkena tower dan ROW. Pendapatannya perbulan : Rp. 450,000. Pekerjaannya petani karet dan padi. Mengharapkan mendapatkan bantuan SEMBAKO sebagai income rehabilitation</p>		Vulnerable
4. Village: Tae														
9	T.39	Darius Acos	HH	71	M	Farmer / Petani	3	2,000,000			V	<p>PIC cannot meet the land owner as he came back from rubber / paddy field in the evening. Mr. Darius Acos lives only with his wife.</p> <p>PIC tidak dapat bertemu dengan Pak Darius karena pergi keladang dan kembali pada malam hari. Darius Acos tinggal hanya bersama istri nya</p>		Vulnerable
5. Village: Padi Kaye														
10	T.48	Eneng	HH	51	F	Laborer / Buruh	2	1,000,000			V	<p>Can not met the land owner as he always work in rubber field. And go back in evening</p> <p>PIC tidak dapat bertemu dengan ibu Eneng karena masih bertani karet dan baru kembali malam hari. Ibu Eneng hanya hidup sendiri</p>		Vulnerable



15	T.102	Tengkel	HH	41	M	Farmer / Petani	5	1,200,000	V		own land 2,5 Ha (paddy and rubber), has 3 children. Income Rp. 50,000-60,000/day. His land is affected for tower and ROW. Compensation of tower has been received and is used to buy Television. Seedling aid expected	Memiliki lahan 2,5 Ha (padi dan karet) memiliki 3 orang anak. Pendapatan : Rp. 50,000-60,000/ hari. Lahannya terkena tower dan ROW. Compensasi ganti rugi tower di gunakan untuk membeli Televisi dan antena parabola. Mengharapkan bantuan bibit	Vulnerable
16	T.107	Apek Parman	HH	42	M	Farmer / Petani	6	1,200,000	V		work as rubber farmer with income Rp. 1,500,000, compensation for tower has been received and used for renovate house.Expect to get rubber / palm seedling for income rehabilitation	Bekerja sebagai petani karet dengan pendapatan Rp. 1,500,000/bulan. Ganti rugi tower telah di gunakan untuk renovasi rumah. Mengharapkan mendapatkan bantuan bibit karet atau sawit	Vulnerable
17	T.102 - T.101	Aby	HH	62	M	Farmer / Petani	7	1,500,000	V		Work as rubber farmer with income Rp, 1,000,000 / month. Not join in socialization as no invitation yet. Land affected to ROW. Compensation isnot yet paid. Expected for any seedling	Bekerja sebagi petani karet dengan pendapatan perbulan Rp. 1,000,000. Tidak mengikuti sosialiasi karena belum ada undangan. Memiliki 4 orang anak (3 sudah berkeluarga, 1 masih sekolah) belum terima ganti rugi. Menerima bantuan segala macam bentuk bibit.	Vulnerable
18	T.104 - T.105	Anun	HH	39	M	Farmer / Petani	4	1,600,000	V		own land 3 Ha, has 2 children, work as farmer of rubber with income Rp. 50,000/day. Involved in inventory of tree	Bekerja sebagai petani karet dengan pendapatan Rp.50,000/ hari. Telah mengikuti proses inventaris. Belum terima ganti rugi ROW. Memiliki lahan 3 Ha.	Vulnerable

8. Village : Tebedak

19	T.112	Acok	HH	82	M	Laborer / Buruh	4	750,000	V		Do not work any more as she's already old. Live with his son, has land 1 Ha. Compensation of tower is used for daily cost. Involve in socialization process of land acquisition.	Tidak bekerja karena sudah tidak mampu, tinggal bersama anaknya dan memiliki lahan 1 Ha. Ganti rugi tower di gunakan untuk kebutuhan sehari hari. Ikut dalam proses sosialisasi pembebasan lahan.	Vulnerable	
20	T.122 & 125	Murtinah	HH	56	F	Farmer / Petani	5	1,500,000	V		own land >5 Ha planted rubber and palm, Rp. 1,000,000-1,500,000/month, compensation was used to buy palm trees	Memiliki lahan >5 Ha di tanami karet dan sawit, pendapatannya per bulan Rp. 1,000,000 - 1,500,000. Kompensasi di gunakan untuk membeli pohon sawit di tanam di ladangnya	Vulnerable	
21	T.124	Ngaeng	HH	>50	M	Laborer / Buruh	10	950,000	V		own land 6 Ha planted rubber, earn Rp1,500,000 month, compensation was used for livelihood cost. Expect electricity distribution to village	Memiliki lahan 6 Ha, petani karet, Pendapatan sebesar Rp. 1,500,000/bulan. Kompensasi ganti rugi tower di gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari. Mengharapkan listrik bisa masuk desanya	Vulnerable	
22	T.124	Atta	HH	50	M	Farmer / Petani	5	1,000,000	V		land owned 1 Ha, compensation was used for buying 1 Ha land planted with rubber, earn Rp,1,500,000/month	Memiliki lahan 1 ha, kompensasi di gunakan untuk membeli 1 Ha lahan untuk di tanami karet. Pendapatan perbulan adalah Rp. 1,500,000	Vulnerable	
23	Transmission	Anjong	HH	51	F	Farmer / Petani	3	500,000	V	V	Cannot met the AP as she still work in rubber field	Tidak dapat bertemu dengan bu Anjong karena masih bekerja noreh karet sampai sore hari		Vulnerable
24	Transmission	Antonius Atang	HH	73	M	Farmer / Petani	3	750,000	V	V	Work as rubber farmer, involved in inventory of plants. Ever failed in planting pepper fo 50 trees. Expect to get paddy seedlings as income rehabilitation	Bekerja sebagai petani karet, padi. Ikut serta dalam kegiatan inventory tanaman. Pernah tanam sahang tapi gagal sekitar 50 batang. Mengharapkan dapat bantuan bibit padi		Vulnerable

9. Village : Amboyo Inti

25	T.119	Thamrin	HH	61	M	Laborer / Buruh	4	430,000	V			Has 4 son have been married. Mr. Thamrin retired from PTPN and his income from pension is Rp. 431,000. Now he is sick cannot work as farmer. Expect to get pepper seedlings and electricity distribution to Tebedak village (location of his rubber field affected to ROW)	Memiliki 4 orang anak yang sudah menikah semua. Pendapatannya dari pensiun PTPN adalah Rp. 430,000,- Saat ini tidak bekerja karena sakit sakitan. Mengharapkan mendapatkan bantuan bibit sahang dan pengaliran listrik di desa tebedak (lokasi kebun karet yang terkena ROW)		Vulnerable
Total		25		14		7		5							

Note:

All HouseHolds (HH) interviewed do not have any cattle. Their livelihood only as farmer. Give appropriate seeds can be usefull to expand their agriculture field.

Number of severly AP's 150 kV Transmission Line

Bengkayang - Ngabang Transmission line

No	No. Tower	Name	Land holding/ pemilikan lahan (m2)	Land affected / lahan yang terkena(m2)	Land Remaining/ sisa lahan (m2)	Affected in % / Persentase dampak	Description	Penjelasan	Photo	Severely affected
1	34 (Dharma Bakti Village)	Mrs Bancek	20,000	219	19,781	1%	Woman headed households, 62 years old, as farmer of rubber and pady. Land affected to tower and transmission. (information from her son)	Informasi dari anak laki lakinya bahwa bu Bancek berumur 62 tahun, bekerja sebagai petani karet, padi. Lahannya terkena tapak tower dan ROW,	N/A	Not severely but identified as vulnerable , and asked electricity to Klampe village

Number of severly APs BENGKAYANG SUBSTATION

2	substation	Juwarso	40,500	20,000	20,500	49%	Compensation was used to buy new land near the substation and total ownership of land at other area is 3 ha, planted with oil palms; compensation also was used to build rooms for rent besides his house. He also works as a trader. He does not feel satisfied with the process of land acquisition; he claims that there was intimidation as he comes from outside Kalimantan. affected land 28%. He produce Tempe as daily livelihood.	Kompensasi ganti rugi lahan di gunakan untuk membeli lahan dekat substation dan membangun rumah kos di samping rumahnya. Memiliki lahan 3 Ha di tanami sawit. Tidak merasa puas dengan ganti rugi yang di terima karena adanya intimidasi sebagai orang pendatang. Lahan yang terkena dampak adalah 28% . Mata pencahariannya sehari hari adalah pembuat tempe		Severely
---	------------	---------	--------	--------	--------	-----	--	--	--	----------

Appendix 8 Forrest Land Use Permit for Packages 1 – 4



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR: 6/1 / IPPKH / PMM / 2017**

TENTANG

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 KV BENGKAYANG - JAGOI BABANG DAN SUTT 150 KV SINGKAWANG - BENGKAYANG, BENGKAYANG - NGABANG, NGABANG - TAYAN ATAS NAMA PT. PLN (PERSERO) SELUAS 64,62 (ENAM PULUH EMPAT DAN ENAM PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN LANDAK DAN KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 634-12/20/600.3/2011 tanggal 30 September 2011 sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25/1/IUPTL-T/PMDN/2016 tanggal 27 September 2016, PT. PLN (Persero) mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tanggal 27 September 2046;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.100/Menhut-VII/2014 tanggal 20 Februari 2014, PT. PLN (Persero) mendapat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkulu - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkulu, Bengkulu - Ngabang dan Ngabang - Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas ±77,70 Hektar (panjang ± 38.852 m dan lebar ± 20 m) di Kabupaten Bengkulu, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa PT. PLN (Persero) telah memenuhi kewajiban sebagaimana dalam persetujuan prinsip tersebut huruf b, yaitu:
- c.1. melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak sesuai Berita Acara Penataan Batas Areal Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkulu - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV



Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. PLN (Persero) di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 24 Desember 2014, dengan realisasi seluas 64,62 Hektar;

- c.2. menyampaikan Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Johny Simon Lefran, S.H bahwa perseroan sanggup:
 - c.2.1 melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c.2.2 melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c.2.3 memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan *monitoring* dan evaluasi di lapangan;
 - c.2.4 memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:
 - 1) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR);
 - 2) membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 - 3) membayar Penggantian Nilai Tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - 4) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c.2.5 melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
 - c.2.6 melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c.2.7 mengganti biaya investasi pengelolaan/ pemanfaatan hutan kepada PT. Nitiyasa Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c.2.8 membayar iuran izin yang telah dibayarkan oleh PT. Nitiyasa Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya, sesuai peraturan perundang-undangan;
- c.3. menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan;
- c.4. menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan;
- c.5. melakukan koordinasi instansi kehutanan setempat;
- c.6. melakukan revisi rencana kerja penggunaan kawasan hutan sesuai hasil tata batas;



- d. bahwa Direktur Pengadaan PT. PLN (Persero) dengan surat Nomor 0106/KON.02.01/DITDAN/2016 tanggal 1 Februari 2016, mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa sesuai Pasal 48 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip dapat mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan dan dikenakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- f. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1316/PKTL/REN/PLA.0/12/2016 tanggal 1 Desember 2016, permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap a.n. PT. PLN (Persero) sebagaimana hasil tata batas seluas 64,62 Hektar sudah sesuai ketentuan teknis;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan atas nama PT. PLN (Persero) seluas 64,62 (Enam Puluh Empat dan Enam Puluh Dua Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;



22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk-II/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11 /2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI);

Memperhatikan: 1. Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 660.1/206/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010 hal Rekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTT 150 kV jalur Ngabang-Tayan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan di Kabupaten Landak dan Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;



2. Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 660.1/207/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010 hal Rekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTT 150 kV jalur Singkawang-Bengkayang oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
3. Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 660.1/209/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010 hal Rekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTT 150 kV jalur Bengkayang-Ngabang oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 240/BLHD/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV GI Jalur Bengkayang-Perbatasan Sarawak (Panjang ± 81,434 Km) oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Kalimantan di Kecamatan Bengkayang, Lumar, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas dan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
5. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/1996/EkBang.B tanggal 6 Juli 2012 mengenai Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan serta SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang seluas 109,28 Hektar a.n. PT. PLN (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 KV BENGKAYANG - JAGOI BABANG DAN SUTT 150 KV SINGKAWANG - BENGKAYANG, BENGKAYANG - NGABANG, NGABANG - TAYAN ATAS NAMA PT. PLN (PERSERO) SELUAS 64,62 (ENAM PULUH EMPAT DAN ENAM PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN LANDAK DAN KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**



- KESATU** : Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap atas nama PT. PLN (Persero) di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat seluas 64,62 (enam puluh empat dan enam puluh dua perseratus) Hektar, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
- KETIGA** : PT. PLN (Persero) berhak:
- berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi rencana pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rencana pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan yang tidak dapat dielakan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT** : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PT. PLN (Persero) wajib menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
- KELIMA** : Dalam hal PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Penetapan areal kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan menyampaikan permohonan penetapan areal kerja berdasarkan hasil tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.



- b. permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud Amar KEEMPAT.
- KETUJUH** : Selain kewajiban dimaksud Amar KEEMPAT, PT. PLN (Persero) wajib:
- a. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c. membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
 - e. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
 - g. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - i. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengamankan kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan Hutan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - l. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
 - m. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - n. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai dengan tembusan: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi



Kalimantan Barat, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas;

- a. laporan tersebut huruf n, memuat:
 - a.1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
 - a.2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
 - a.3. pemenuhan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
 - a.4. rencana dan realisasi penansman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - a.5. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan;

KEDELAPAN: PT. PLN (Persero), dilarang:

- a. memindahtangankan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. menjaminkan atau mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain;
- c. melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah setempat.

KESEPULUH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan, apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.

KESEBELAS: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

KEDUABELAS: Perpanjangan Izin Pinjam Paksi Kawasan Hutan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.



- apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan ini.
- KESEMBILAN** : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku dan melekat sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- KESEPULUH** : Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 26 April 2025, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

16 JAN 2017

**A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,**

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
HIMPUNAN TATA USAHA



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Gubernur Kalimantan Timur;
9. Bupati Berau;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;
12. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda;
13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau;
14. Direktur PT. Berau Coal.



KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 27 September 2046, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 JAN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
KEPADA DAN TATA USAHA

A.n. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,**

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG



Terdistribusikan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
9. Gubernur Kalimantan Barat;
10. Bupati Bengkayang;
11. Bupati Landak;
12. Bupati Sanggau;
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas;
15. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak;
16. Direktur Pengadaan PT. PLN (Persero).





PT PLN (PERSERO)

Jalan Tunjaya Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. : (021) 7261876, 7261122, 7262254

(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/ROBB

Faksimile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : 0106 /KON.02.01/DITDAN/2016

01 Februari 2016

Sifat : -

Lampiran : Satu set

Perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang -
Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang -
Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang -
Tayan di Kalimantan Barat

Kepada

**Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI**

Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat
Gedung Jemari Saleh Lt. Dasar
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jln. Gatot Subroto No. 44
Jakarta - 12190

u.p. Yth. : **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Menunjuk surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.100/Menhut-VII/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT PLN (Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pasal 25 ayat (1), yang berbunyi "*Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri*", bersama ini kami PT PLN (Persero) mengajukan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

1. Copy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.100/Menhut-VII/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT PLN (Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang -Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Laporan hasil penataan batas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III;
3. Baseline Penggunaan Kawasan Hutan;

4. Copy...

4. Copy Akta Notaris Pernyataan Asli dari Notaris Johnny Simon Lefran, SH Tanggal 29 Desember 2015;
5. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



DIREKTUR PENGADAAN,

SUPANDIAT IWAN SANTOSO

Tembusan :

- GM PT PLN (Persero) UIP X



20 Februari 2014

Nomor : S. 100/Menhut-VII/2014
Lampiran : Satu lembar peta
Hal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Yth. **Direktur Utama PT. PLN (Persero)**
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 0491/131/DIRUT/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan No. 1407/131/DIRUT/2013 tanggal 16 Agustus 2013, sesuai dengan :

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008;
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013 tanggal 13 November 2013;
- f. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- g. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan No. P. 20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/Menhut-II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
- i. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 63/Menhut-II/2011 tanggal 5 September 2011;
- j. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 240/BLHD/2010 tanggal 3 Mei 2010;
- k. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1996/EkBang-B tanggal 6 Juli 2012;
- l. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 660.1/206/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
- m. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 660.1/207/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
- n. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 660.1/209/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
- o. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S. 24/VI-BRPUK/2014 tanggal 8 Januari 2014;
- p. Akta Pernyataan No. 05 tanggal 4 Januari 2013 dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, SH., M.Hum.

/dengan ...

dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan a.n. PT. PLN (Persero) seluas ± 77,70 Ha (tujuh puluh tujuh dan tujuh puluh perseratus hektar) melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan ratio 1 : 1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3.

Areal tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 4,26 Ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 73,42 Ha serta telah dibebani IUPHHK-HT PT. Nityasa Idoia seluas ± 31,47 Ha dan IUPHHK-HT PT. Sinar Kalbar Raya seluas ± 2,15 Ha sebagaimana peta terlampir.

Persetujuan prinsip ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini hanya diberikan dalam rangka pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan, bukan untuk kepentingan lain dan arealnya tetap mempunyai status sebagai kawasan hutan seluas ± 77,70 Ha (panjang ± 38.852 m dan lebar ± 20 m).
2. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini bukan merupakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sehingga kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.
3. PT. PLN (Persero) dibebani kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
 - b. Melakukan inventarisasi tegakan dengan supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan dengan pembinaan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah X Pontianak;
 - c. Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan :
 - 1) Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
 - 2) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - 4) Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a) Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR);
 - b) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c) Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan
 - d) Kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - 5) Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - 6) Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - d. Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan :

/1) Mengganti ...

- 1) Mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada PT. Nityasa Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) Membayar iuran izin yang telah dibayarkan oleh PT. Nityasa Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan;
 - f. Menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi kehutanan setempat;
 - h. Melakukan revisi rencana kerja penggunaan kawasan hutan sesuai hasil tata batas;
 - i. Menyampaikan laporan secara periodik setiap 12 (dua belas) bulan sekali atas kemajuan pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.
4. Letak dan luas secara pasti kawasan hutan yang dipinjam pakai tersebut ditentukan berdasarkan hasil penataan batas di lapangan yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) dengan supervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak dengan mengikutsertakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Kabupaten Landak dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau.
 5. Pelaksanaan inventarisasi tegakan dilaksanakan PT. PLN (Persero) dengan supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Kabupaten Landak dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau.
 6. Pemanfaatan kayu sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagal Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana kerja penggunaan kawasan hutan a.n. PT. PLN (Persero) dan dilaksanakan setelah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 7. Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. PLN (Persero) yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat.
 8. Apabila pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau terjadi penyimpangan, maka persetujuan prinsip ini menjadi batal dan PT. PLN (Persero) dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 9. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
 10. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan informasi dalam persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Menteri Kehutanan,



Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat (tanpa lampiran);
2. Bupati Bengkayang (tanpa lampiran);

/s/ Bupati ...

3. Bupati Landak (tanpa lampiran);
4. Bupati Sanggau (tanpa lampiran);
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (tanpa lampiran);
6. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
9. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemutaran Sosial;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang;
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Landak;
13. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
15. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas;
16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak;
17. Direktur Utama PT. Nityasa Idola;
18. Direktur Utama PT. Sinar Kalbar Raya.

Appendix 9 Monitoring of IPPKH

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Update Januari 2020

Nomor Izin : 6/1/IPPKH/PMDN/2017
 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang Ngabang-Tayan atas Nama PT PLN (Persero) Seluas 64,62 (Enam Puluh Empat dan Enam Puluh Dua Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
 Masa Berlaku : 19 Januari 2017 - 27 September 2046

NO	KEWAJIBAN	KETERANGAN	PERSENTASE	UPDATE
1	membuat rencana & pelaksanaan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan	paling lambat 1 tahun sebelum masa izin berakhir	0%	
2	penanaman rehabilitasi DAS		50%	*Pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak 11.PJ/KON.02.02/UIP.KALBAGBAR/2019 tanggal 26 Desember 2019 *Anggaran penanaman rehabilitasi DAS disetujui, saat ini proses pengadaan jasa konsultansi penanaman rehabilitasi DAS *Pentetapan Lokasi Penanaman DAS terbit Nomor: SK.1885/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 *BA expose hasil verifikasi calon lokasi Nomor: BA.22/KTA/R2PKH/DAS.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 *survey calon lokasi penanaman das di Batu Ampar (27-28 Des 2018) *2018 : penunjukkan konsultan perencanaan Rehabilitasi DAS - Inhutani *perintah verifikasi calon lokasi penanaman rehabilitasi DAS No: S.414/KTA/RP2PKH/DAS.1/11/2018 tanggal 12 Nov 2018 *peta indikatif lokasi penanaman rehabilitasi DAS dari BPDAS dan HL Kapuas tgl 7 Juni 17
3	pembayaran PNBP	dilakukan setiap tahun	100%	Tahun 2017 : 20 Maret 2017 Tahun 2018 : 15 Januari 2018 Tahun 2019 : 14 Januari 2019 Tahun 2020 : 15 Januari 2020
4	melaksanakan inventarisasi tegakan	selesai - laporan sudah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi & BPHP (tgl 8 Sept 2017)	100%	laporan sudah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi & BPHP (tgl 8 Sept 2017)
5	membayar PSDH &/DR	selesai - laporan sudah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi & BPHP dilaksanakan 100% pada 28 Mei 2018	100%	laporan sudah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi & BPHP dilaksanakan 100% pada 28 Mei 2018
6	membayar ganti rugi nilai tegakan (bila merupakan hutan rehabilitasi)	NA. bukan hutan rehabilitasi	100%	
7	mengganti biaya investasi & iuran izin kepada pemegang izin	mengganti biaya ijin yang telah dikeluarkan oleh 1. PT Nitiyasa Idola 2. PT Sinar Kalbar Raya karena PLN melintas area perusahaan tsb.	0%	
8	melakukan pemeliharaan batas areal IPPKH		0%	
9	perlindungan hutan areal IPPKH	berupa: * pemberian marka papan pengumuman yang berhubungan dengan perlindungan hutan * menara pantu/pos jaga/menara/sarana lainnya * melakukan patroli bersama polisi hutan	0%	
10	mengamankan kawasan hutan	* mencantumkan nama kelompok hutan * input keterangan menara pantau * melaksanakan patroli bersama	0%	
11	memberikan kemudahan bagi aparat	* mencantumkan instansi yang dituju ke mana * menyampaikan tujuan kegiatan * menyebutkan frekuensi kegiatan	0%	
12	mengkoordinasikan kegiatan lingkungan hidup & pemanfaatan hutan		0%	
13	melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan	berupa CSR	10%	proses penyampaian usulan program CSR tahun 2020 di pusat Surat Nomor: 3088/STH.02.02/550000/2019 tanggal 3 Oktober 2019
14	membuat laporan berkala setiap 6 bulan	upload data online di web ppkh.menlhk.go.id	100%	

PROGRESS PEMENUHAN
KEWAJIBAN 40%

WORKPLAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IPPKH

update Januari 2020

Nomor Izin : 6/1/IPPKH/PMDN/2017

Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang Ngabang-Tayan atas Nama PT PLN (Persero) Seluas 64,62 (Enam Puluh Empat dan Enam Puluh Dua Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Masa Berlaku : 19 Januari 2017 - 27 September 2046

NO	KEWAJIBAN	WORKPLAN	KETERANGAN
1	membuat rencana & pelaksanaan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan	tahun 2021 - semester 1	
2	melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan	tahun 2018-2023	*tahun 2018: pelaksana kegiatan perencanaan rehabilitasi DAS *tahun 2019: - penetapan lokasi terbit dan rancangan teknik terbit proses pengadaan konsultan penanaman rehabilitasi DAS - Kontrak ditandatangani 11.PJ/KON.02.02/UIP.KALBAGBAR/2019 tanggal 26 Desember 2019 *tahun 2020: penanaman tahun 1 *tahun 2021: penanaman tahun 2 *tahun 2022: penanaman tahun 3 *tahun 2023: evaluasi dan penyerahan hasil ke DirDAS
3	membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	dilaksanakan setiap tahun sebelum tanggal jatuh tempo (sebelum tanggal 19 Januari yang merupakan tanggal terbit IPPKH)	Tahun 2017 : 20 Maret 2017 Tahun 2018 : 15 Januari 2018 Tahun 2019 : 14 Januari 2019 Tahun 2020 : 15 Januari 2020
4	melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan	bulan September 2017	selesai - laporan sudah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi & BPHP (tgl 8 Sept 2017)
5	membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tahun 2018-2023	selesai - dilaksanakan 100% pada 28 Mei 2018
6	membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi	-	NA. Bukan hutan rehabilitasi
7	mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	tahun 2021 - semester 1	*mengganti biaya ijin yang telah dikeluarkan oleh 1. PT Nitiyasa Idola 2. PT Sinar Kalbar Raya karena PLN melintas area perusahaan tsb. *berdasarkan info dari BPHP, kedua perusahaan belum dapat diidentifikasi, karena sudah tidak aktif.
8	melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan	tahun 2021 - semester 2	
9	melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tahun 2021 - semester 2	berupa: * pemberian marka papan pengumuman yang berhubungan dengan perlindungan hutan * menara pantua/pos jaga/menara/sarana lainnya * melakukan patroli bersama polisi hutan
10	mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan	tahun 2021 - semester 2	* mencantumkan nama kelompok hutan * input keterangan menara pantau * melaksanakan patroli bersama
11	memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan	tahun 2021 - semester 1	* mencantumkan instansi yang dituju ke mana * menyampaikan tujuan kegiatan * menyebutkan frekuensi kegiatan
12	mengkoordinasikan kegiatan lingkungan hidup & kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan	tahun 2021- semester 1	
13	melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan	tahun 2020 - semester 2	berupa CSR
14	membuat laporan berkala setiap 6 bulan sekali	dilaksanakan per-semester	diinput melalui website

Appendix 10 Land Certification Update for Packages 1 – 7

**STATUS ASET TANAH GARDU INDUK
DAN PROGRES SERTIPIKASI**

No	Lokasi Aset	Luas	Status Tanah	Pelaksana Proses	Wilayah BPN	Progres				Keterangan dan Permasalahan
						Pendaftaran	Terbit Peta Bidang	SK Hak	Terbit Sertipikat	
1	Gardu Induk Bengkayang, Desa Magmagan Karya, Bengkayang	66.087	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Sudah Pengukuran				Pengurusan akan dialihkan ke UIP KALBAGTIM
2	Gardu Induk Bengkayang, Desa Magmagan, Bengkayang	688	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Sudah Pengukuran			HGB No. 00001	sdh diserahkan SHGB asli (nota dinas tanggal 10 Oktober 2017) ke MKSA/DMSDMUMUM
3	Gardu Induk Ngabang, Desa Tebedak, Ngabang, landak	9.875	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Sudah Pengukuran	Terbit			Luasan besar dan kecil sudah proses penandatanganan oleh kakan untuk selanjutnya dinaikan ke kanwil (Penggabungan sertipikat)
4	Gardu Induk Sanggau, Kelurahan Bunut, Sanggau	22.304	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau dan Kanwil BPN Kalimantan Barat	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Risalah Panitia A untuk kemudian menaikan berkas dari Kantah ke Kanwil agar dibuatkan SK Hak
5	Gardu Induk Sekadau, Desa Mungguk, Sekadau Hilir, Sekadau	22.474	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sekadau dan Kanwil BPN Kalimantan Barat	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit		Mengurus BPHTB untuk segera di terbitkan sertipikat (28 juni 2019)

**STATUS ASET TANAH TAPAK TOWER
DAN PROGRES SERTIPIKASI**

No	Lokasi Aset	Luas	Status Tanah	Pelaksana Proses	Wilayah BPN	Progres				Keterangan dan Permasalahan
						Pendaftaran	Terbit Peta Bidang	SK Hak	Terbit Sertipikat	
	SUTT 150 kV BENGKAYANG-NGABANG									
	Total tapak tower = 279 Terbit sertipikat = 4 Proses = 21 Belum proses = 254									
1	T.23 Desa Bani Amas, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
2	T.24 Desa Bani Amas, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
3	T.25 Desa Bani Amas, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
4	T.35 Desa Darma Bhakti, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
5	T.36 Desa Darma Bhakti, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
6	T.37 Desa Darma Bhakti, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
7	T.38 Desa Darma Bhakti, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
8	T.48 Desa Bangun Sari, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
9	T.52 Desa Bangun Sari, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
10	T.53 Desa Bangun Sari, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
11	T.55 Desa Bangun Sari, Bengkayang, Bengkayang	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Permohonan HGB				Proses
12	T.80 Kab. Bengkayang	225	Surat Pernyataan	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	6 Maret 2018	TERBIT
13	T.84 Kab. Bengkayang	225	Surat Pernyataan No. 593/ /Pem	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	6 Maret 2018	TERBIT
14	T.85 Kab. Bengkayang	225	Surat Pernyataan No. 593/ /Pem	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	22 Februari 2018	TERBIT

**STATUS ASET TANAH TAPAK TOWER
DAN PROGRES SERTIPIKASI**

No	Lokasi Aset	Luas	Status Tanah	Pelaksana Proses	Wilayah BPN	Progres				Keterangan dan Permasalahan
						Pendaftaran	Terbit Peta Bidang	SK Hak	Terbit Sertipikat	
15	T.86 Kab. Bengkayang	225	Surat Pernyataan No. 593/ /Pem	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Bengkayang	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	22 Februari 2018	TERBIT
16	T.113 Desa Tebedak, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
17	T.114 Desa Tebedak, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
18	T.116 Desa Tebedak, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
19	T.116 A Desa Tebedak, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
20	T.116 B Desa Tebedak, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
21	T.117 Desa Tebedak, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
22	T.255 Desa Ambarang, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
23	T.257 Desa Ambarang, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
24	T.258 Desa Ambarang, Ngabang, Landak	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses
25	T.225 Desa Amboyo Utara, Ngabang, Landak	400	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Landak	Pra Ukur				Proses

**STATUS ASET TANAH TAPAK TOWER
DAN PROGRES SERTIPIKASI**

No	Lokasi Aset	Luas	Status Tanah	Pelaksana Proses	Wilayah BPN	Progres				Keterangan dan Permasalahan
						Pendaftaran	Terbit Peta Bidang	SK Hak	Terbit Sertipikat	
	SUTT 150 kV TAYAN-SANGGAU									
	Total tapak tower = 235 Terbit sertipikat = 5 Proses = 0 Belum proses = 230									
1	T.204 Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Sanggau	225	593/531/SKT/Pem/2015	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12/04/2019	Terbit
2	T.205 Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Sanggau	400	593.2/441/Pem	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12/04/2019	Terbit
3	T.209 Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Sanggau	225	593.2/30/SKT/Pemdes/I/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12/04/2019	Terbit
4	T.210 Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Sanggau	225	593.2/532/SKT/Pem/2015	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12/04/2019	Terbit
5	T.212 Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Sanggau	225	593.2/231/SKT/Pemdes/VI/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12/04/2019	Terbit

**STATUS ASET TANAH TAPAK TOWER
DAN PROGRES SERTIPIKASI**

No	Lokasi Aset	Luas	Status Tanah	Pelaksana Proses	Wilayah BPN	Progres	Terbit Peta Bidang	SK Hak	Terbit Sertipikat	Keterangan dan Permasalahan
						Pendaftaran				
	SUTT 150 kV SANGGAU-SEKADAU									
	Total tapak tower = 125 Terbit sertipikat = 28 Proses = 13 Belum proses = 84									
1	T. 49 Desa Penyeladi, Kapuas, Sanggau	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12-Apr-19	TERBIT
2	T. 54 Desa Penyeladi, Kapuas, Sanggau	225	593/484/AG	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12-Apr-19	TERBIT
3	T. 49 Desa Penyeladi, Kapuas, Sanggau	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12-Apr-19	TERBIT
4	T. 54 Desa Penyeladi, Kapuas, Sanggau	225	593/484/AG	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12-Apr-19	TERBIT
5	T. 49 Desa Penyeladi, Kapuas, Sanggau	225	SKT	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12-Apr-19	TERBIT
6	T. 54 Desa Penyeladi, Kapuas, Sanggau	225	593/484/AG	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN Sanggau	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	12-Apr-19	TERBIT
7	T.78 Desa Sungai Kunit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SKT No. 520/92/ SPT-D/2013	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	2 Agustus 2018	TERBIT
8	T.79 Desa Sungai Kunit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SKT No. 520/505/ SPT-D/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	2 Agustus 2018	TERBIT
9	T.80 Desa Sungai Kunit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SKT No. 520/506/ SPT-D/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Agustus 2018	TERBIT
10	T.81 Desa Sungai Kunit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			SHM Diagunkan Pemilik . Dasar Ganti Rugi SPT, terindikasi SHM oleh BPN
11	T.82 Desa Sungai Kunit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SKT No. 520/509/ SPT-D/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	29 Maret 2018	TERBIT
12	T.84 Desa Sungai Kunit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT NO 520/507/SPT- D/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	29 Maret 2018	TERBIT
13	T.85 Desa Sungai Kunit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SKT No. 520/510/ SPT-D/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	29 Maret 2018	TERBIT
14	T.86 Desa Sungai Kunit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SKT No. 520/511/ SPT-D/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	29 Maret 2018	TERBIT
15	T.87 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
16	T.88 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	400	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	11 Desember 2017	TERBIT
17	T.89 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
18	T. 90 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM No.02690	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan

**STATUS ASET TANAH TAPAK TOWER
DAN PROGRES SERTIPIKASI**

No	Lokasi Aset	Luas	Status Tanah	Pelaksana Proses	Wilayah BPN	Progres		SK Hak	Terbit Sertipikat	Keterangan dan Permasalahan
						Pendaftaran	Terbit Peta Bidang			
19	T.91 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
20	T.92 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No.590/070/PEM/2011/2010	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
21	T. 93 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM No.02617	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
22	T. 94 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM No.2336	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
23	T. 95 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	400	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			PENETAPAN HAK
24	T. 96 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM 02621	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
25	T. 97 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM No. 02623	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
26	T. 98 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM NO 2383	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
27	T.101 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
28	T.102 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
29	T.103 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM NO 106	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
30	T.104 Desa Peniti, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
31	T.107 Desa Ensalang, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No. 590/013/Um/2015/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
32	T.108 Desa Ensalang, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No. 590/011/Um/2015/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
33	T.109 Desa Ensalang, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No. 590/012/Um/2015/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
34	T.113 Desa Ensalang, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No. 590/010/Um/2015/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	11 Desember 2017	TERBIT
35	T.116 Desa Ensalang, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No. 590/009/Um/2015/2016	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
36	T.117 Desa Sungai Ringin, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	11 Desember 2017	TERBIT

**STATUS ASET TANAH TAPAK TOWER
DAN PROGRES SERTIPIKASI**

No	Lokasi Aset	Luas	Status Tanah	Pelaksana Proses	Wilayah BPN	Progres		SK Hak	Terbit Sertipikat	Keterangan dan Permasalahan
						Pendaftaran	Terbit Peta Bidang			
37	T.119 Desa Sungai Ringin, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SPT No.	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	8 Desember 2017	TERBIT
38	T.110 Desa Ensalang, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
39	T.114 Desa Ensalang, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SKT No. 590/015/Um/2006/2013	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit	Terbit	18 Februari 2019	TERBIT
40	T.115 Desa Ensalang, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Proses Pemisahan
41	T.83 Desa Sungai Kunyit, Sekadau Hilir, Sekadau	225	SHM 2 PEMILIK	PLN UIP Kalbagbar	Kantah BPN SEKADAU	Sudah Pengukuran	Terbit			Tumpang tindih dengan pemilik lain

Appendix 11 Time Schedule of Land Certification in Packages 3, 6 and 7

**Appendix 12 List of Vulnerable and severely AP in the Corridor of 150 kV
Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line**

No.	Name>Nama	Status in the HH/ Status KK	Age/ Umur	Sex/ Jenis Kelamin (M/F)	Occupation/ Pekerjaan	Number of HH member/ Jumlah anggota KK	HH income/month (IDR/pendapatan perbulan)	Vulnerability/Kerentanan			Vulnerable (Rentan)	Severely (Parah)
								Poor/ Miskin	Women headed HH/KK Wanita	Elderly headed HH/ KK Renta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KABUPATEN SANGGAU												
<i>Kecamatan Tayan Hilir</i>												
Desa Kawat												
	M. Yunus	HH	71	M	Retirement	3	1 - 2 jt			1	1	
SUBTOTAL								0	0	1	1	0
Desa Cempedak												
	H.M. Yusuf (wahdah-anak)	HH	92	M	Farmer	1	> 10 jt			1	1	
	Supiana Rosmiati	HH	38	F	Farmer	5	1-2 jt	1			1	
	Yeyen	HH	50	M	Farmer	7	1-2 jt	1			1	
	Jaher	HH	60	M	Farmer	2	1-2 jt			1	1	
	Jihon	HH	72	M	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1		1	1	
	Bambang T.winarto	HH	60	M	Private	5	>10 jt			1	1	
	Gabe	HH	69	M	Farmer	7	1 - 2 jt			1	1	
	Alimin/ Lade (istri)	HH	58	M	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1			1	
	Awi	HH	40	M	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1			1	
	Ibrahim Sulaiman	HH	65	M	Farmer	2	100 rb - 1 jt	1		1	1	
	Songli	HH	66	F	Farmer	7	1-2 jt	1		1	1	
	Salpinus Sangkiat	HH	56	M	Farmer	3	100rb-1 jt	1			1	
SUBTOTAL								8	0	7	12	0
Desa Tebang Bena												
	Namsun	HH	71	M	Farmer	6	1-2 jt	1		1	1	
	Deron	HH	60	M	Farmer	1	1 - 2 jt			1	1	
	Yosafat Sami	HH	65	M	Farmer	3	1 - 2 jt			1	1	
	Lusius Ong	HH	61	M	Farmer	4	1 - 2 jt			1	1	
	Silvanus Acom-Tini (istri)	HH	60	M	Farmer	3	1 - 2 jt			1	1	
SUBTOTAL								1	0	5	5	0
<i>Kecamatan Balai</i>												
Desa Makkawing												
	Selipang	HH	55	F	Farmer	6	1-3 jt	1	1		1	
	Nitalisa/ Istri Roma	HH	30	F	Farmer	4	100-1jt	1			1	
	Antonius Andi	HH	33	M	Farmer	6	1-2 jt	1			1	
SUBTOTAL								3	1	0	3	0
Desa Temiang Mali												
	Matus Pauji	HH	64	M	Farmer	6	1-2 jt	1		1	1	
	Kuncit	HH	50	M	Farmer	6	1-2 jt	1			1	
SUBTOTAL								2	0	1	2	0
Desa Hilir												
	Lion (kecik- cucu)	HH	82	F	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1	
SUBTOTAL								1	0	1	1	0
Desa Keadu												
	Moses/ Agnes Iyam	HH	45/ 57	M	Farmer	3	100 rb - 1 jt	1			1	
	Kristina Serimi	HH	43	F	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1	1		1	
	Maria Mina	HH	58	F	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1	1		1	
	Antonius Jati	HH	63	M	Farmer	6	1-2 jt	1		1	1	
	Antonius Minar Tulai	HH	40	F	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1			1	
	Yohanes James	HH	54	M	Farmer	3	100 rb - 1 jt	1			1	
	Rupinus Tului	HH	41	M	Farmer	5	100 rb - 1 jt	1			1	1
	Leonardus Apoi	HH	65	M	Farmer	5	2 - 3 jt			1	1	
	Evardus Kuncang	HH	58	M	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1			1	
	sabinus kancang	HH	35	M	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1	
	Petrus Amak	HH	45	M	Farmer	7	100 rb - 1 jt	1			1	
SUBTOTAL								10	2	2	10	1
Desa Senyabang												
	Anton	HH	68	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1	
	Herkulanus Luko	HH	61	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1	
	Kanisius Jaher	HH	58	M	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1			1	
	Stefanus Kenen -Ati (istri)	HH	45	F	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1	
	Sukimin	HH	46	M	Farmer	7	1 - 2 jt	1			1	
	Aon	HH	48	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1	
	Firmanus Siong	HH	60	M	Occupied some people to cultivate his oil palm	6	> 10 jt			1	1	
	Romanus Kusa	HH	49	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1	
	Petrus Acan	HH	67	M	Farmer	2	1 - 2 jt			1	1	
SUBTOTAL								7	0	4	9	0

No.	Name>Nama	Status in the HH/ Status KK	Age/ Umur	Sex/ Jenis Kelamin (M/F)	Occupation/ Pekerjaan	Number of HH member/ Jumlah anggota KK	HH income/month (IDR/pendapatan perbulan)	Vulnerability/Kerentanan			Vulnerable (Rentan)	Severely (Parah)
								Poor/ Miskin	Women headed HH/KK Wanita	Elderly headed HH/ KK Rentan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Desa Temiang Taba												
	Timotius Timas/ Darto S.	HH	59	M	Retirement public servant	5	100 rb - 1 jt	1			1	
	Gunik/ Adon (anak)	HH	29	M	Farmer	2	100 rb - 1 jt	1			1	
	Andrianus Yayuk	HH	40	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1	
	Wisono-Rigu (anak)	HH	58	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1	
	Sukardi B	HH	50	M	Farmer	7	1 - 2 jt	1			1	
							SUBTOTAL	5	0	0	5	0
Kecamatan Tayan Hulu												
Desa Menyabo												
	Kalistus Landong	HH	52	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1	
	Laten	HH	67	M	Farmer	4	2 - 3 jt			1	1	
	Setia Budi	HH	64	M	Farmer	3	1 - 2 jt			1	1	
							SUBTOTAL	1	0	2	3	0
Desa Sosok												
	Dedy Candra Alengsius	HH	34	M	Farmer	7	100 rb - 1 jt	1			1	
	Ya'sabirin	HH	61	M	Farmer	7	2 - 3 jt			1	1	
	Tam Misbar	HH	74	M	Farmer	8	sudah tidak bekerja	1		1	1	
							SUBTOTAL	2	0	2	3	0
Desa Binjai												
	Adrianus Pekomeng	HH	43	M	Farmer	5	2 - 3 jt	1			1	
	Bambang Hermanto/ Putra Gining	HH	66	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1	
	Sulah- Juanang(anak)	HH	46	M	Farmer (Rubber)	6	1 - 2 jt	1			1	
	Rupinatul	HH	35	F	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1	
	Suratno	HH	65	M	Farmer	8	2 - 3 jt	1		1	1	
	Martinus Sindeng	HH	70	M	Farmer	4	1 - 2 jt			1	1	
	Cahaya- Sanding (anak)	HH	90	F	Farmer	3	tidak bekerja	1		1	1	
	Vinsensius Sokin	HH	58	M	Farmer	5	100 rb - 1 jt	1			1	
	Yohanes Anes	HH	65	M	Farmer	6	3 - 10 jt			1	1	
							SUBTOTAL	7	0	5	9	0
Kecamatan Parindu												
Desa Suka Gerundi												
	Stanilaus Atui	HH	60	M	Farmer	5	2 - 3 jt			1	1	
	Kalista Nik	HH	47	F	Farmer	4	2 - 3 jt		1		1	
	Yulia Widyawati	HH	32	F	Housewife	4	100 rb - 1 jt	1	1		1	
	Elisabet Elis	HH	38	F	Farmer	7	2 - 3 jt		1		1	
	Rosa	HH	45	F	Farmer	5	2 - 3 jt		1		1	
	Lusia	HH	56	F	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1	
							SUBTOTAL	2	4	1	6	0
Desa Palem Jaya												
							SUBTOTAL	0	0	0	0	0
Desa Pusat Damai												
	Veronika	HH	37	F	Housewife	7 (2KK)	1 - 2 jt	1			1	
	Seratima Simah/ Andreas (suami)	HH	63	F	Housewife	6	1 - 2 jt	1		1	1	
	Theresia Arol	HH	50	F	Farmer	7	1-3 jt	1			1	
	Yulia Siat tju	HH	64	F	Farmer	6	1-3 jt	1		1	1	
	Yakobus	HH	50	M	Teacher/PNS	10	3 - 10 jt	1			1	
	Hiyasintus Injin	HH	68	M	farmer	5	1-2 jt			1	1	
							SUBTOTAL	5	0	3	6	0
Desa Sebara												
	Petrus Sunar/ Elesius Acan (mertua)	HH	46	M	Farmer	7	1 - 2 jt	1			1	
	Stephanus Atang	HH	42	M	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1	
	Sabinus Bung	HH	54	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1	
	Bambang-wakil ismael	HH	38	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1	
							SUBTOTAL	4	0	0	4	0

No.	Name>Nama	Status in the HH/ Status KK	Age/ Umur	Sex/ Jenis Kelamin (M/F)	Occupation/ Pekerjaan	Number of HH member/ Jumlah anggota KK	HH income/month (IDR/pendapatan perbulan)	Vulnerability/Kerentanan			Vulnerable (Rentan)	Severely (Parah)	
								Poor/ Miskin	Women headed HH/KK Wanita	Elderly headed HH/ KK Rentan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Kecamatan Kapuas													
Desa Lape													
	Aten/ tanah adat												
	Aten / Tanah adat												
	Anastasia Saje	HH	42	F	Housewife	6	100 rb - 1 jt	1			1		
	Yohanes Lion	HH	70	M	Old Farmer	3	100 rb - 1 jt	1		1	1		
	Paula Dolen	HH	58	F	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1		
	Sabradus Indus	HH	43	M	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	4	0	1	4	0	
Desa Sei Mawang													
	Aki	HH	73	M	Farmer	2	100 rb - 1 jt	1		1		1	
	Eliana Maria/ Leo Kunun	HH	47	F	Farmer	3	1 - 2 jt	1			1		
	Ami	HH	65	M	Farmer	5	100 rb - 1 jt	1		1	1	1	
							SUBTOTAL	3	0	2	2	1	
Desa Bunut (P6)													
T.12	Laudis Laus	HH	56	M	Retirement	6	1 - 2 jt	1				1	
	Alisius	HH	72	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1			
							SUBTOTAL	2	0	1	0	1	
Desa Bunut (P7)													
	Solisman	HH	32	M	Farmer	3	100rb - 1 jt	1					
	Tonel	HH	63	M	Farmer	4	100rb - 1 jt	1		1	1		
	Rusandi Jang	HH	60	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1		
	Dison	HH	53	M	Farmer	5	100rb - 1 jt	1			1		
	Antymus Nasir	HH	75	M	Farmer	4	100rb - 1 jt	1		1	1		
							SUBTOTAL	5	0	3	4	0	
Desa Beringin													
	Bong Khung Song	HH	50	M	Farmer; Fishing	6	1 - 2 jt	1			1		
	Kaderi	HH	52	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
	Jubaidah	HH	53	F	selling cakes and vegetables	4	100 rb - 1 jt	1			1		
	Ahmad Dapid	HH	65	M	Farmer	4	1 - 2 jt			1	1		
	Achyar	HH	46	M	Farmer	3	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	4	0	1	5	0	
Desa Tanjung Kapuas													
	Misli	HH	36	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	1	0	0	1	0	
Desa Penyeladi													
	Aliyas	HH	55	M	Farmer	9	1 - 2 jt	1			1		
	Budi (almarhum)/ sartika-istri	HH	29	F	Housewife	3	1 - 2 jt	1			1		
T.47	Ratna	HH	38	F	Housewife	4	1 - 2 jt		1			1	
	Samsiah	HH	45	F	Housewife	5	100 rb - 1 jt	1	1		1		
T.51	Cinta (almarhum)-abang	HH	27	M	Private company	4	1 - 2 jt					1	
	Prima (anak)												
	Aminah- Jahri	HH	71	F	Farmer		100 rb - 1 jt	1		1	1		
	Rajeli	HH	52	M	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1			1		
T.57	Jaenudin	HH	58	M	Farmer	4	1 - 2 jt					1	
							SUBTOTAL	5	2	1	5	3	
Kecamatan Mukok													
Desa Semuntai													
	Supriyadi	HH	41	M	civil servant (penjaga sekolah)	3	1-2 jt	1			1		
	Ahong	HH	57	M	Farmer	4	1-2 jt	1			1		
	Lilis Suryani-Ramsi (menantu)	HH	40	F	Farmer & Builder	5	1-2 jt		1		1		
	Jawi	HH	80	M	Farmer	4	1-2 jt			1	1		
							SUBTOTAL	2	1	1	4	0	

No.	Name>Nama	Status in the HH/ Status KK	Age/ Umur	Sex/ Jenis Kelamin (M/F)	Occupation/ Pekerjaan	Number of HH member/ Jumlah anggota KK	HH income/month (IDR/pendapatan perbulan)	Vulnerability/Kerentanan			Vulnerable (Rentan)	Severely (Parah)	
								Poor/ Miskin	Women headed HH/KK Wanita	Elderly headed HH/ KK Rentan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
KABUPATEN SEKADAU													
<i>Kecamatan Sekadau Hilir</i>													
Desa Sungai Kunyit													
	Rupina NA	HH	53	F	Farmer	6	> 10 jt		1		1		
	Maro Lukas Simo	HH	48	M	Farmer	4	1 - 2 jt		1		1		
	Kristina Suyah	HH	65	F	Farmer	3	1-2 jt	1	1	1	1		
	Mikael Ahen	HH	61	M	Farmer	6	3 - 10 jt			1	1		
	Apui Y	HH	60	M	Farmer	6	3 - 10 jt			1	1		
							SUBTOTAL	1	3	3	5	0	
Desa Peniti													
	Abang Japar	HH	62	M	Farmer	9	1 - 2 jt	1		1	1		
	Rapeah	HH	33	F	Housewife	4	1 - 2 jt		1		1		
	AB. Ramsyah	HH	32	M	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1			1		
	Apuk	HH	61	M	Entrepreneur /Swasta	5	3 - 10 jt			1	1		
	Jahra	HH	60	F	Entrepreneur /Swasta	6	2 - 3 jt		1	1	1		
	Petrus Ajiu	HH	60	M	Farmer	2	3 - 10 jt			1	1		
							SUBTOTAL	2	2	4	6	0	
Desa Ensalang													
	Agustinus Alak	HH	36	M	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1			1		
							SUBTOTAL	1	0	0	1	0	
Desa Sei Ringin (reroute)													
	Kristina Kamelia	HH	32	F	Farmer	4	1 - 2 jt		1		1		
	Junaidi	HH	63	M	Farmer	4	2 - 3 jt			1	1		
							SUBTOTAL	0	1	1	2	0	
Desa Mungguk													
	Intan	HH	32	F	Farmer	5	1 - 2 jt		1		1		
	Ramli	HH	55	M	Farmer	7	2 - 3 jt	1			1		
	Sani	HH	43	M	Farmer	8	2 - 3 jt	1			1		
	Hermanto	HH	40	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	3	1	0	4	0	
TOTAL SUIT								24	10	14	122	6	
1 GI Sanggau													
	Alisius											1	
	Solisman											1	
	Yuliani											1	
2 GI Sekadau													
	Abang Mokmen											1	
	Setiban											1	
TOTAL GI												5	
TOTAL PER KATEGORI											122	11	
TOTAL VULNERABLE & SEVERELY											133		

KETERANGAN

untuk data yang tercantum ke dalam vulnerable & severely, PLN memutuskan untuk memasukkan ke salah satu kategori saja, yaitu severely

Appendix 13 Socialization Acknowledgment related to Land Acquisition in Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line

BERITA ACARA
SOSIALISASI KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN DAN TANAMAN
DI BAWAH RUANG BEBAS / ROW SUTT 150 kV TAYAN – SANGGAU
DESA MAK KAWING, KECAMATAN BALAI,
KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (31 – 01 – 2019) kami masing – masing yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Adi Susanto : Sekcam Kec. Balai
2. Heri Sarwono : Babinsa (Perwakilan Koramil Balai)
3. Sapto : Bahabinkamtibmas (Perwakilan Polsek Balai)
4. Erwin : PJ Kepala Desa Mak Kawing
5. Sudikdo : Perkawilan Dinas Perkebunan Sanggau
6. Harius, S.Ip : Perwakilan DAD Kecamatan Balai
7. Darma : BIN
8. Martinus Supriyanto : Tim Penilai Independen (KJPP)
9. Rizky Andhika : PT. Surveyor Indonesia
10. Kumara Bagus Raditya W. : Ketua Tim Pengadaan Tanah & ROW PT PLN (Persero)
UPP Kiting KBB 2
11. Nurcahyani : Anggota Tim Pengadaan Tanah & ROW PT PLN (Persero)
UPP Kiting KBB 2
12. Imal Yusman : Anggota Tim Pengadaan Tanah & ROW PT PLN (Persero)
UPP Kiting KBB 2
13. Erlan Febryandani : Anggota Tim Pengadaan Tanah & ROW PT PLN (Persero)
UPP Kiting KBB 2
14. Penerima Kompensasi : Terlampir

Bersama-sama telah membuat berita acara sosialisasi kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas / ROW SUTT 150 kV Tayan-Sanggau yang terletak di:

Desa : Mak Kawing
Kecamatan : Balai
Kota / Kabupaten : Sanggau
Propinsi : Kalimantan Barat

I. Sosialisasi dilakukan dengan berpedoman kepada :

1. UU No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
2. UU No. 30 tahun 2009 tentang penyediaan ketenagalistrikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 148 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
6. PP No. 14 Tahun 2012 tentang usaha penyediaan tenaga listrik;
7. Permenkeu No.101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;
8. Permen ESDM No.18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan SUTT Aras Searuh Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
9. Permen ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) No.04-6918-2002 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
11. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 671.1 / 1167 / DPE-C3 tanggal 29 April 2009 tentang Pembangunan Sarana Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.
12. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 250 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Wilayah Kecamatan Tayan Mak Kawing, Balai, Tayan Hulu, Parindu, Kapuas dan Mukok
13. Surat PT. PLN (Persero) UPP KITRING KBB 2 No. 708/KON.00.02/UPP.KALBAGBAR.2/2018 Tanggal 01 November 2018 perihal Sosialisasi dan Penetapan Nilai Kompensasi ROW SUTT 150Kv Tayan - Sanggau - Sekadan

II. Sosialisasi mencapai hasil sebagai berikut :

1. Bahwa sosialisasi berlangsung pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 di Aula Kantor Desa Mak Kawing dan dihadiri oleh Sekcam Balai, PJ Kades Mak Kawing, Koramil Balai, Polsek Balai, BIN, Tim Penilai Independen (KJPP), PT Surveyor Indonesia dan PT. PLN (Persero) LPP KITRING KBB 2.
2. Bahwa sosialisai dimaksud untuk menjelaskan ruang bebas dan jarak bebas minimum (ROW) pada Saluran Udara Tegangan Tinggi.
3. Pembangunan SUTT 150 KV Tayan-Sunggau-Sekadau di Desa Mak Kawing, mencakup:
 - a. Jumlah Tower 8 Tower
 - b. Jumlah Span 7 Span
4. Ruang Bebas :

Adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal disekeliling dan disepanjang saluran udara dimana tidak boleh ada benda didalamnya demi keselamatan manusia, mahluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi.
5. Menurut Permen ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik; Pasal (7) ayat (1) formula perhitungan Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Formula perhitungan Kompensasi untuk Tanah:
$$\text{Kompesasi} = 15 \% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Tanah hasil Lembaga Penilai}$$
 - b. Formula perhitungan Kompensasi untuk Bangunan:
$$\text{Kompesasi} = 15 \% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Nilai Tanah hasil Lembaga Penilai}$$
 - c. Formula perhitungan Kompensasi untuk Tanaman:
$$\text{Kompesasi} = \text{Nilai Tanaman Hasil Lembaga Penilai}$$
6. Menurut Permen ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik; Pasal (4) ayat (1) yaitu terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas transmisi tenaga listrik hanya dapat diberikan kompensasi 1 (satu) kali.
7. Kompensasi tanam tumbuh :
 - a. Kompensasi berdasarkan Permen ESDM No. 27 Tahun 2018
 - b. Tanam tumbuh yang dibebaskan adalah tanaman/tumbuhan keras yang berpotensi dan dibudidayakan yang tingginya mencapai 4 meter, misalnya durian, karet, kelapa, sawit, cempedak, jati, dll.
 - c. Nilai kompensasi berdasarkan hasil dari Tim Penilai / KJPP yang mendapat ijin praktik dari Kementerian Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah dan ROW Sesuai dengan UU No.2 tahun 2012 Pasal (1) ayat (2) tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

8. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas/ROW dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia.
9. Induksi Medan Magnet & Medan Listrik berdasarkan Standar WHO, SNI dan Depkes untuk SUTET adalah:

a. Medan magnet = 0,1 mT(mili Tesla)

b. Medan listrik = 5 kV/m

10. Hasil pengukuran medan magnet & medan listrik pada SUTT dan SUTET:

a. Medan magnet = 0,001 – 0,0032 mT (mili Tesla)

b. Medan listrik = 1,32 – 2,4 kV/m

Sedangkan hasil pengukuran medan magnet pada handphone adalah 0,6 – 1,3 mT (mili Tesla). Lebih besar bila dibandingkan dengan medan magnet pada SUTT dan SUTET.

11. Apabila penerima kompensasi merasa keberatan dengan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman dibawah ruang bebas/ROW maka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya nilai kompensasi. Dan akan ditindak lanjuti oleh pengadilan negeri setempat selama kurun waktu 14 (empat belas) hari .

12. Tanya Jawab

Nama	Pertanyaan	Jawaban
1. Silvanus Teber	Apakah syarat yang digunakan apabila orang tua sudah meninggal?	Diperlukan surat ahli waris seluruh anak/keturunan dan atau surat kuasa waris apabila dikuasakan kepada satu orang
2. Ajwin	Bagaimana apabila data inventarisasi dilapangan tidak sesuai dengan data yang di umumkan dikantor desa	Pemilik dapat mengajukan keberatan hasil inventarisasi dan dari Surveyor Indonesia akan inventarisasi ulang apabila memang benar terdapat tanaman yang tidak terinventarisasi dan masuk kedalam koridor dan kualifikasi yang ditentukan
3. Toni	Apakah setelah SUTT tersebut beroperasi bagaimana apabila ada tanaman yang tumbuh dengan sendiri di bawah jalur tersebut.	Setelah SUTT beroperasi akan dilakukan pemeliharaan rutin.

Demikian Berita Acara Sosialisasi Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman di bawah Ruang Bebas/ROW ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan ditanda tangani unsur yang bersosialisasi tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak-pihak yang bersosialisasi:

I. **Penerima Kompensasi**

(Terlampir)

II. **Aparat Desa dan Muspika**

1. Adi Susanto
Sekcam Kec. Balai
2. Heri Sarwono
Babinsa Balai
3. Septo
Bhabinkamtibmas Balai
4. Harius, S.Ip
Perwakilan DAD Kec. Balai
5. Erwin
PJ Kepala Desa Mak Kawing
6. Sudikdo
Perwakilan Dinas Perkebunan
7. Darman
BIN
8. Martinus Supriyanto
Tim Penilai Independen (KIPP)



9. Rizky Andhika
PT. Surveyor Indonesia


.....

PT PLN (Persero) UIP KALBAGBAR, UPP Kiting KBB 2

1. Kumara Bagus Raditya W.
Ketua Tim Pengadaan Tanah

.....

2. Nurchayani
Anggota Tim Pengadaan Tanah

.....

3. Imal Yusman
Anggota Tim Pengadaan Tanah


.....

4. Erlan Febryandani
Anggota Tim Pengadaan Tanah

.....

Appendix 14 Leaflet Distribution of Packages 6 and 7

Leaflet distribution of Package 6 and Package 7



Sijon, Affected People of ROW



Local government officer on ROW compensation



Agustinus Aki, Sungai Mawang ROW compensation



Syamsu Rizal, Sosok ROW compensation



Socialization of ROW Compensation on Local government office



Socialization of ROW Compensation on Local government office

Appendix 15 Leaflet of 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line

INFORMASI PROYEK SUTT 150 kV TAYAN-SANGGAU-SEKADAU dan GI 150 kV SANGGAU & SEKADAU

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk (GI) 150 kV ini dibangun untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengembangan ekonomi daerah terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.



Gardu Induk

pembangunan 2 gardu induk baru di Sanggau dan di Sekadau

Transmisi

sebanyak 360 tower berdiri di 28 desa, 7 kecamatan, dan 2 kabupaten

Wilayah Kerja

SUTT membentang sepanjang 280 kms, mulai dari GI Tayan, melewati GI Sanggau menuju GI Sekadau

PENGADAAN TANAH (PT)

UU No. 02 Th 2012
Perpres No. 3 Th 2016
Perpres No. 4 Th 2016

KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS SUTT (ROW)

Permen ESDM No. 18 Th 2015
Permen ESDM No. 27 Th 2018
Permen ESDM No. 02 Th 2019

KEGIATAN

Sosialisasi pengadaan tanah/ ROW

Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan tanaman di lahan tapak tower, dan pembuatan Peta Bidang di bawah jalur SUTT serta perhitungan tanaman keras yang tingginya lebih dari 4 meter dan berpotensi masuk ke ruang bebas

Penilaian ganti rugi tanah dan tanaman dan kompensasi ROW

Penyampaian nilai appraisal

Pemberkasan dan pembayaran

KETERANGAN

Masyarakat diberi kesempatan untuk memahami pelaksanaan pembangunan SUTT melalui tanya jawab

Dilaksanakan bersama aparat desa dan kecamatan bersama dengan pemilik tanah/ perwakilan. Pengisian blanko inventarisasi diumumkan 14 hari di kantor desa dan kecamatan untuk memberi kesempatan bila ada klaim/protes dari masyarakat

Harus mendatangi objek yang dinilai didampingi oleh pihak desa

PLN menyampaikan hasil penilaian appraisal kepada pemilik

PLN menyerahkan nilai ganti rugi/kompensasi ke pemilik setelah menyiapkan daftar inven, nominatif, KTP/KK, copy SPT/SHM, copy rekening bank

Hal yang sebisa mungkin dihindari adalah penitipan uang ganti rugi atau kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat dilakukan bila:

1. Pemilik menolak harga nilai ganti rugi/kompensasi
2. Objek tanah masih disengketakan kepemilikannya
3. Objek tanah menjadi jaminan di bank

INFORMASI

PLN UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKITAN DAN JARINGAN KBB 2 SINTANG



Jl. Y.C. Oevang Oeray RT 29 RW 02
Kelurahan Baning Kota Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang



056523634



uppkbb2.sintang@gmail.com



MEKANISME PENANGANAN KELUHAN WARGA TERKAIT GANTI RUGI TANAH & KOMPENSASI ROW

Keluhan

- jumlah tanaman dan luas tanah dianggap tidak sesuai (pada saat diumumkan)
- belum terdaftar sebagai penerima ganti rugi atau kompensasi
- menolak nilai ganti rugi atau kompensasi
- menolak dilewati jalur SUTT

Tahapan penanganan

- 1 mengajukan keluhan ke kepala dusun/kepala adat/kepala desa dan PLN UPP Kitring KBB 2 Sintang untuk dilakukan mediasi atau inventarisasi ulang
- 2 dilakukan verifikasi dan inventarisasi kembali secara bersama dengan pihak yang mengajukan keluhan, aparat desa/kelurahan setempat, PLN UPP Kitring KBB 2 Sintang di lokasi lahan dimaksud
- 3 keluhan yang masih belum dapat diselesaikan dimediasi di tingkat kecamatan dengan melibatkan BIN dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar
- 4 apabila keluhan tersebut belum dapat diselesaikan, maka dimediasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan BIN dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar
- 5 apabila tidak diperoleh kesepakatan dan didapati sengketa atas lokasi tersebut, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu konsinyasi (penitipan ganti rugi dan kompensasi) di Pengadilan Negeri setempat)

*seluruh tahapan kegiatan didampingi oleh BIN dan Kejaksaan Tinggi Kalbar

**Appendix 16 Decree Letter of Bupati Sanggau about Location Assignment
Permission for 150 kV Sanggau Substation**



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 KV SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

Mengingat

- a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan pembangunan sarana ketlistrikan di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sanggau, dipandang perlu dibangun Gardu Induk 150 Kv Sanggau;
- b. bahwa dengan adanya pembangunan Gardu Induk 150 kV Sanggau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah dibidang ketlistrikan kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV Sanggau dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusahaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6377);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2008 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV Sanggau.
- KEDUA** : Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terletak di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau pada koordinat 0°8'55.41" Lintang Utara dan 110°31'16.26" Bujur Timur dengan luas tanah yang dibutuhkan 30.000 Meter Persegi (3 Ha).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Januari 2015

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai aslinya
Kabag Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina
NIP. 19760223 199903 1 002

**Appendix 17 Decree Letter of Bupati Sekadau about Location Assignment
Permission for 150 kV Sekadau Substation**



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 671.32/ 133 /UMUM/2016
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 kV DAN TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 kV DI WILAYAH KECAMATAN SEKADAU HILIR DESA SUNGAI KUNYIT, PENITI, SUNGAI RINGIN, MUNGGOUK, GONIS TEKAM, TAPANG SEMADAK KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan sarana kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sekadau, dipandang perlu dibangun Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Sekadau;

b. bahwa dengan adanya pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di wilayah Kabupaten Sekadau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah dibidang kelistrikan khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau dan secara umum kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di wilayah Kabupaten Sekadau dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Di Wilayah Kecamatan Sekadau Hilir Desa Sungai Kunyit, Peniti, Sungai Ringin, Mungguk, Gonis Tekam, Tapang Semadak Kabupaten Sekadau.
- KEDUA :** Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, berada di lokasi sebagai berikut :
- A. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir terletak di :
 1. Desa Sungai Kunyit sebanyak 8 Lokasi;
 2. Desa Peniti sebanyak 31 Lokasi;
 3. Desa Sungai Ringin sebanyak 16 Lokasi;
 4. Desa Mungguk sebanyak 19 Lokasi;
 5. Desa Gonis Tekam sebanyak 38 Lokasi; dan
 6. Desa Tapang Semadak sebanyak 23 Lokasi
 - B. Untuk rincian detail letak lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower SUTT 150 kV di wilayah Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada daftar table Tower Schedule Transmisi 150 kV dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pembangunan Gardu Induk 150 kV di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut memerlukan luas tanah ± 3 Ha.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Maret 2016

Sesuai sesuai dengan salinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SUBHAN
NIP. 19750435 199412 1 001

BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS

**Appendix 18 Decree Letter of Bupati Sanggau for 150 kV Tayan – Sanggau
– Sekadau**



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 250 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN
TINGGI 150 kV DI WILAYAH KECAMATAN TAYAN HILIR, BALAI, TAYAN HULU,
PARINDU, KAPUAS DAN MUKOK**

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan sarana kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sanggau, dipandang perlu dibangun Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dengan adanya pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di wilayah Kabupaten Sanggau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah dibidang kelistrikan khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau dan secara umum kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Penetapan Lokasi Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di wilayah Kabupaten Sanggau dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kekuasaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengawasan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3595);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5377);
 13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prodek Mula-mula Daerah.

Menyampaikan

: Surat Menteri Kehutanan Nomor S.100/ Menhut-VII/ 2014 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan s.d. PT. PLN (Pemer) untuk Pembangunan SUTET 275 ke Bangkayang - Jempol Bahang dan SUTET 150 ke Singkawang - Bangkayang, Bangkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bangkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

menetapkan :

Menetapkan

Agenda

: Menetapkan Lokasi Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Wilayah Kecamatan Tayan Hulu, Balai, Tayan Hulu, Paritadu, Kapuas dan Matak dengan rincian sebagai berikut :

A. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Tayan Hulu terletak di :

1. Desa Cempedak sebanyak 30 lokasi; dan
2. Desa Tumpang Berau sebanyak 24 lokasi.

B. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Balai terletak di :

1. Desa Maklawing sebanyak 17 lokasi;
2. Desa Tembungah sebanyak 9 lokasi;
3. Desa Tar sebanyak 7 lokasi;
4. Desa Hillr sebanyak lokasi;
5. Desa Kehadu sebanyak 19 lokasi;
6. Desa Padakayu sebanyak 15 lokasi;
7. Desa Penyabung sebanyak 13 lokasi; dan
8. Desa Tembungaha sebanyak 11 lokasi.

C. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Tayan Hulu terletak di :

1. Desa Manyabo sebanyak 18 lokasi;
2. Desa Serek sebanyak 18 lokasi;
3. Desa Hujung sebanyak 20 lokasi;
4. Desa Sukagrandi sebanyak 12 lokasi; dan
5. Desa Palerajera sebanyak 17 lokasi.

D. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Paritadu terletak di :

1. Desa Pusat Dandal sebanyak 18 lokasi; dan
2. Desa Sebara sebanyak 18 lokasi.

E. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Kapuas terletak di :

1. Desa Lape sebanyak 0 lokasi;
2. Desa Sei Marung sebanyak 14 lokasi;
3. Kelurahan Hurut sebanyak 16 lokasi;
4. Kelurahan berlingga sebanyak 0 lokasi;
5. Kelurahan Tanjungraguna sebanyak 5 lokasi; dan
6. Desa Penyeladi sebanyak 21 lokasi.

F. Lokasi Pembangunan Tower SUT 150 KV di Kecamatan Matak terletak di :

1. Desa Sampuntal sebanyak 11 lokasi.

G. Untuk alasan detail lokasi lokasi pembangunan Tower SUT 150 KV di wilayah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada daftar lokasi Tower Sekolah Tersebut 150 KV dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lembaran I, II dan III Keputusan Bupati III.

KERUMAH

: Kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pembangunan Tower SUT 150 KV di wilayah & Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Daftar KESATU tersebut diperlukan luas tanah 60.890 Meter Persegi (6,9 Ha).

KESYOGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat keberatan dalam pemekapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 April 2014

BUNYI SANDOAU,

TD

PAOLUS HADI

Bahkan sesuai dengan
Kabag Hukum dan HAM


YASRIAN M. MH
Pembina
NRS 12700223 199903 1 002

Appendix 19 Permit from Territory Hall of Forest Area for Packages 5 – 7



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 121 Pontianak 78124
Telepon (0561) 736002, 743373, Faksimile (0561) 734383
Website: <http://pkh3.dephut.go.id>

Nomor : S. 144/BPKH.III-2/2015 /3 Mei 2015
Lampiran : 1 (satu) lembar peta
Hal : Hasil Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan
Terhadap Lokasi Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT), Provinsi Kalimantan Barat.

Yth. Manager PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana
Konstruksi Jaringan Kalimantan I
di -
Pontianak

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 148/RON.02.02/UPK RING KAL 1/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Peta Kawasan Hutan SUTT 150 kV Tayan - Sanggau - Sekadau - Sintang, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Letak areal yang dimohon mengacu pada lampiran surat berupa data koordinat Tower SUTT Tayan - Sanggau - Sekadau - Sintang, berada di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 541 titik.
2. Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 58 Ayat 1, maka berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Peraliran Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Peraliran Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Lokasi Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
3. Berdasarkan data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, lokasi yang dimohon tidak tumpang tindih dengan perizinan sektor kehutanan lainnya.
4. Berdasarkan Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII) sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6.982/Menhut-VII/PSDH/2014 tanggal 13 Nopember 2014, Lokasi Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ada yang terindikasi berada pada lahan gambut sebanyak 14 titik, yaitu titik T8, T9, T10, T11, T12, T91, T92, T93 T94, T96, T97, T98, T99, dan T100.
5. Dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara peta indikatif penundaan pemberian ijin baru dengan kondisi fisik di lapangan maka untuk lahan gambut dapat dilakukan surveil oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian.
6. Hasil telaahan hanya merupakan telaahan awal diatas peta dan data sekunder lainnya, untuk mengetahui kepastian tentang letak dan luas wilayah Lokasi Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terhadap batas kawasan yang pasti perlu dilakukan pengukuran di lapangan.

7. Diharapkan

7. Diharapkan kepada pihak yang terkait untuk tidak melakukan kegiatan - kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kebijakan teknis lainnya yang berlaku sebelum ijin resmi diperoleh.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai



Ir. Yulia, M.P.
NIP. 19620520 199403 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (sebagai laporan)
2. Gubernur Kalimantan Barat
3. Direktur Penggunaan Kawasan Hutan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
6. Bupati Sanggau
7. Bupati Sekedau
8. Bupati Sintang
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau
10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekedau
11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Appendix 20 Documentations Grievance Handling in Tayan – Sanggau - Sekadau

Documentation of Grievance Handling

Restoration of damaged road in Empawek, Palem Jaya Village regarding Commitment letter between PT. Krakatau Engineering and representative of the society



Mediation with one of Affected people (Iwan, Pusat damai)



Mediation with the people in T. 138



Obstacled access road before mediation in T. 138



The access road at T. 138 already opened after mediation



Mediation at Senunuk Sub Village regarding ROW clearance



Mediation Rumah Makan Hidayah related to placement of stagger



Appendix 21 CSR Tayan – Sanggau – Sekadau Coordination Meeting

Minutes of Meeting

Date	14 Juni 2019
Time	14.00 - Selesai
Place	Kantor Kecamatan Balai
Attendance list attached	

Minutes

Agenda	Rapat Koordinasi Rencana Program CSR Kecamatan Balai	Presenter	1. PLN UPP 2 2. Camat Balai 3. Warga Kecamatan Balai
--------	--	-----------	--

Discussion:

Pembukaan

Rapat dibuka oleh PLN UPP Kiring KBB 2 Berdasarkan Undangan Rapat PLN UPP Kiring KBB 2 Nomor 387/STH.02.03/UPP-KALBAGBAR.2/2019 tanggal 13 Juni 2019, dengan pembahasan sebagai berikut:

Diskusi

PLN UPP Kiring KBB 2 menyampaikan:

1. Rencana dan Tujuan Program CSR yang di sampaikan, merupakan program CSR dari PLN UPP Kalbagbar melalui PLN UPP Kiring KBB 2 Sentang.
2. Program CSR di targetkan kepada beberapa warga pemilik tanah yang tanahnya dilewati Jalur SUTT 150kV Tayan-Sanggau khususnya di Kecamatan Balai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Desa Makassar 3 orang
 - b. Desa Temiang Mali 2 orang
 - c. Desa Hilir 1 orang
 - d. Desa Keadu 11 orang
 - e. Desa Senyabang 9 orang
 - f. Desa Temiang Taba 5 orangTotal rencana penerima bantuan di Kecamatan Balai sebanyak 31 orang.
3. Rencana bentuk bantuan yang akan disampaikan berupa pemberian pelatihan (sosialisasi) dan bibit sahang.
4. PLN UPP Kiring KBB 2 membuka sesi tanya jawab dan diskusi.

Diskusikan sebagai berikut :

Camat Balai : Apakah bantuan yang diberikan hanya bibit sahang ?

PLN UPP 2 : Bantuan yang diberikan berupa Pelatihan (sosialisasi), bibit sahang, pupuk dan pendampingan dari dinas terkait.

Antonius Jati : Kapan program tersebut akan dilaksanakan ?

PLN UPP 2 : Rencana di Bulan Agustus 2019 program tersebut, nantinya semua penerima bantuan akan diberi pelatihan sebelum menerima bantuan sahang.

Camat Balai : Di beberapa desa kami sudah pernah menerima bantuan bibit sahang dan mayoritas penerimaannya gagal, apakah program mesin bisa diubah agar tetap bibit sahang ?

PLN UPP 2	: Untuk perubahan program kami harus mengusulkan terlebih dahulu kepada PLN UIP Kabagbar.
Kades Keadu	: Menanggapi pak Camat, memang sebaiknya program Bantuan Bibit Sahang diganti dengan bantuan yang lainnya. Saya mengusulkan untuk menggantinya dengan bantuan Ternak Ikan Nila jika bapak/ibu penerima bersedia karena manfaatnya lebih besar.
Lian	: Saya mengusulkan bantuan sapi saja pak.
PLN UPP 2	: Untuk bantuannya penerima individu pak, mohon maaf untuk bapak Lian seperti nya kita tidak dapat mengakomodir dikarenakan terlalu besar dari segi biayanya.
Apdi	: Untuk bantuan penerimanya kelompok atau individu?
Roma	: Jika bantuan untuk individu saya mengusulkan Bantuan Lela saja karena lebih mudah perawatannya.
PLN UPP 2	: Dari hasil diskusi jika akan dilakukan perubahan Ada 2 pilihan yaitu, Ternak Ikan Nila atau Ternak Ikan lele. Namun itu jika akan dilakukan perubahan, jika bapak/ibu tetap dengan Bantuan Budidaya Sahang dapat disampaikan.
Kunot	: Jika ternak ikan nila lebih sulit dibandingkan ternak ikan lele karena ikan nila perlu air yang mengalir dan selalu mengganti air secara berkala. Saya lebih setuju diganti dengan bantuan ternak ikan lele saja.
Gunik	: Saya setuju dengan bantuan ikan lele.
Petrus	: Saya sependapat dengan pak kunot karena perawatan ikan lele lebih mudah dibandingkan dengan ikan nila.
Rigu	: Saya setuju dengan bantuan ternak lele, karena sebelumnya sudah pernah melakukan dan ada sedikit pengalaman.
Camat Balal	: Bagaimana bapak/ibu setuju dengan Perubahan Program dari Bantuan Bibit Sahang menjadi bantuan Ternak Lela? Jika ada pendapat lain dapat disampaikan disini. Sekiranya tidak ada saya putuskan bahwa Warga Kecamatan Balal sepakat untuk berubah dari bantuan sahang menjadi bantuan ternak lele.
Pihak PLN	: Terima kasih bapak/ibu, hasil dari pertemuan hari ini akan kami sampaikan ke PLN UIP Kabagbar.

Kesimpulan

Masyarakat Desa Maklawine, Temiang Mali, Miri, Keadu, Sanyabeng, dan Temiang Taba sepakat memilih budidaya ikan lele untuk program CSR.

Proses CSR lebih lanjut akan dilaksanakan dengan mengundang Camat dan Kades

NOTULEN

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI RENCANA CSR
KECAMATAN BALAI, KABUPATEN SANGGAU

HARI / TANGGAL : Jumat, 14 Juni 2019
 WAKTU : 14.00 WIB s/d Selesai
 TEMPAT : Aula Kecamatan Balai

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M-PAUji	elali Raya	Kadast	1. 
2	Petrus Kema	Sempabang	Kadus	2. 
3	LIUN	D. Sotilit	Tani	3. 
4	ZULKIFLI	OSAN. HILIR	KADUS	4. 
5	ANTONIUS M. ruda	DSM. Pahunan	TANI	5. 
6	ANTONIUS Joti	-	-	6. 
7	ARPIN	Desa. Temiang madi	KADES	7. 
8	Cenghin	DS kebathu	KADES	8. 
9	Yulius	DS. Makkawing	KADES	9. 
10	L. Apoi	DS. Pevntu		10. 
11	H. Juhur	Desa Nungabang	Tani	11. 
12	Kuncit	DS Temiangmati	Tani	12. 
13	Gurik	DS tamiam lba	TANI	13. 
14	Johannes James	DS. Boetiei	Tani	14. 
15	PETRUS. AMAK	DS. BAEL	TANI	15. 

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
16	Sukardi B.	Dusun URit	Melayan	16.
17	WISONO	Dusun URIT	Masyrakat	17.
18	Rupinus Tulun	Dusun KEBADU	masyarakat	18.
19	Anggas Iyan	Ds. Kelah	Masyrakat	19.
20	Karlina Sari	Ds. Kelah	Masyrakat	20.
21	Maria Mina	Ds. Kelah	Masyrakat	21.
22	Yoyuk	Dsn. URIT		22.
23	R Kusn	Suryabong	— 1 —	23.
24	Jurimin	Suryabong	— 1 —	24.
25	Loutan	Suryabong	Petani	25.
26	Kjater))))	26.
27	Rigo	URIT	1	27.
28	Beljeng	Idar		28.
29	Romas	DSN Tameng	Petani	29.
30	A. Andi	DSN Tameng	Petani	30.
31	MORU	P. Kelah	P. Kelah	31.
32	Nikolas	Ds. Suryabong	Masyrakat	32.
33	Aoni	DS. Prampung	Petani	33.
34	Kiyatig	DS. T. DADA	KADES	34.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
35	Tomotius Times	Pering Toba	Petani	35. 	
36	Kecuaig	Tali	petani		36. 
37	Stepanus Kema	Sembayang	Petani	37. 	
38	DARTO Sukananaka	Des. Periang Toba	Petani		38. 
39	LOVIANUSA	Des. Sapan M. Klock	Cow	39. 	
40					40.
41				41.	
42					42.
43				43.	
44					44.
45				45.	
46					46.
47				47.	
48					48.
49				49.	
50					50.
51				51.	
52					52.

Minutes of Meeting

Date	14 Juni 2025
Time	09.00 - Selesai
Place	Kantor Kecamatan Tayan Hilir
Attendance list attached	

Minutes

Agenda	Rapat Koordinasi Rencana Program CSR Kecamatan Tayan Hilir	Presenter	1. PLN UPP 2 2. Baglan Ekbang Tayan Hilir 3. Warga Kecamatan Tayan Hilir
--------	--	-----------	--

Disposisi:

Pembukaan

Rapat dibuka oleh Kasli Ekbang Kecamatan Tayan Hilir berdasarkan Undangan Rapat PLN UPP Kiring KBB 2 Nomor 386/STH.02.09/UPP.KALBAGBAR_2/2019 tanggal 12 Juni 2019, dengan pembahasan sebagai berikut:

Dikawal

PLN UPP Kiring KBB 2 menyampaikan:

1. Rencana Program CSR yang di sampaikan, merupakan program CSR dari PLN UPP Kalbagbar melalui PLN UPP Kiring KBB 2 Sintang.
2. Program CSR di targetkan kepada beberapa warga pemilik tanah yang tanahnya dilewati Jalur SUTT 150kV Tayan-Sanggau khususnya di Kecamatan Tayan Hilir dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Desa Kawat 1 orang
 - b. Desa Cempedak 12 orang
 - c. Desa Teang Benus 5 orangTotal rencana penerima bantuan di Kecamatan Tayan Hilir sebanyak 18 orang
3. Rencana bentuk bantuan yang akan disampaikan berupa pemberian bibit sahang dan penanaman sahang.
4. Selanjutnya PLN UPP Kiring KBB 2 membuka sesi tanya jawab dan diskusi.

Sesi tanya jawab dan diskusi sebagai berikut:

- Kasli Ekbang : Pemberian bantuan sahang mencakup apa saja?
- PLN UPP 2 : Pemberian bantuan berupa bibit sahang dan penanaman sahang termasuk pembekalan dari dinas terkait.
- Pak Zul : Apakah CSR diserahkan dalam bentuk kelompok atau individu?
- PLN UPP 2 : Bantuan CSR akan diberikan per individu.
- Pak Zul : Walaupun CSR nantinya dalam pengelolaan bersifat individu, namun diperlukan manajemen (payung) yang bersifat kelompok. Perlu adanya kajian tentang variasi usaha lain, selain itu pendampingan dalam menjalankan program CSR dari awal proses usaha hingga pemasaran.

Kasi Ekbang	: Menyampaikan bahwa untuk penanaman sahang resiko gagal lebih tinggi dan mengusulkan kepada PLN untuk mengganti program tersebut dengan budidaya ikan lele karena bisa dilaksanakan setiap individu sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan. Lele dapat dipanen selama 1 bulan setengah berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Dengan catatan panen dilakukan secara selektif. Adapun dalam pengelolannya lebih mudah dibandingkan dengan ikan benjang lain salah satu contohnya adalah dalam pengelolaan air pada kolam yang tidak perlu dilakukan karena lele berdaya tahan tubuh kuat. Dan dengan adanya budidaya lele akan menambah nilai konstabilitas Desa Ini terutama desa kawat dan tebang benoa yang sangat manim mengkonsumsi ikan.
Ibrahim Sulaiman	: Sependapat dengan bapak Kasi bahwa ternak atau budidaya ikan lele lebih mudah dilakukan.
Gregorius K	: Saya setuju dengan pendapatnya untuk ternak ikan lele lebih mudah dilakukan dan bisa diterapkan di rumah.
Pihak PLN	: Sekiranya ada permintaan perubahan program CSR dari Bapak/Ibu sekalian, saya akan sampaikan ke PLN UIP Kalbagbar perihal perubahan ini. Saya tanyakan kembali, apakah semua Bapak/Ibu penerima bantuan CSR sepakat untuk Menubah program CSR dan Budidaya Sahang menjadi Budidaya/Ternak Lele?
Acom	: Saya masih setuju dengan bantuan berupa budidaya sahang.
Pihak PLN	: Baik terima kasih bapak Acom, untuk Bapak/Ibu yang lain bagaimana?
Awil	: Saya pilih Bantuan Budidaya Ikan Lele
Muni	: Saya setuju jika program dirubah menjadi Budidaya Ikan Lele
Zulkarnain	: Jika program diubah menjadi Budidaya Ikan Lele, bantuan seperti apa yang kita dapatkan?
Pihak PLN	: Untuk hal tersebut akan saya sampaikan ke PLN UIP Kalbagbar, sekiranya untuk bantuan yang didapatkan kurang lebihnya hampir sama dengan Program Bantuan Sahang, namun akan diganti dengan Bibit Lele, Pelatihan dan dinas terkait dan bahan perawatan.
Kades Tebang Benoa	: Masyarakat belum memiliki pengalaman, namun ini bisa menjadi potensi untuk kita belajar, Desa Tebang Benoa menerima program CSR dengan catatan adanya benjang dari pihak terkait.
Zulkarnain	: Baik, saya setuju dengan program Ternak Lele
Musi	: Saya setuju dengan perubahan program menjadi ternak lele
Acom	: Bagaimana jika program bantuan ini gagal dilaksanakan oleh masyarakat?
Pihak PLN	: Untuk risiko kegagalan akan kita mitigasi dengan Pelatihan serta pendampingan tenaga ahli dibidang terkait sehingga diharapkan program ini akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi penerimanya.
Yoyan	: Saya setuju dengan program Ternak Lele
Kasi Ekbang	: Bagaimana dengan bapak Acom tetap dengan pendapat awalnya atau berubah ke ternak lele?

Acom : Saya setuju dengan perubahan program menjadi Ternak Lala.
Kasi Ekbang : Baik pak, dan bapak/ibu yang lain bagaimana pendapatnya?
Kades Desa Kawat : Saya kira masyarakat Kecamatan Tayan Hilir sudah sepakat dengan perubahan Program CSR menjadi Ternak Lala
PIhak PLN : Baik Bapak/Ibu yang sudah menghadiri kegiatan ini, saya simpulkan bahwa Bapak/Ibu penerima di Kecamatan Tayan Hilir sepakat Usulan Program CSR diubah menjadi Ternak Lala. Saya akan usulkan ke PLU UIP Kalbagbar perihal permohonan perubahan ini.

Kesimpulan

Masyarakat Desa Cempedak, Desa Kawat dan Desa Tebang Benua sepakat memilih budidaya ikan lala untuk program CSR.

Proses CSR lebih lanjut akan dilaksanakan dengan mengundang Camat dan Kades

MOTIVASI

Appendix 22 Acknowledgement of Catfish Farming

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN DANA CSR PT PLN (PERSERO)

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-------|-----------------------|--|
| I. | Vidy Andrias | : PLH Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 2 (PIHAK PERTAMA) |
| II. | Lovianus Anus | : Camat Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau |
| III. | Yulus | : Kepala Desa Mak Kawing Kecamatan Balai |
| IV. | Arpin | : Kepala Desa Temiang Mali Kecamatan Balai |
| V. | Ashadi Cahyadi | : Kepala Desa Hilir Kecamatan Balai |
| VI. | Cenghin | : Kepala Desa Keadu Kecamatan Balai |
| VII. | Modestus | : PJ Kepala Desa Senyabang Kecamatan Balai |
| VIII. | Kiyang | : Kepala Desa Temiang Taba Kecamatan Balai |
| IX. | Wiaatmana Detius Ivan | : Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau |
| X. | Albert Hutton Sinaga | : Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau |
| XI. | Terlampir | : Penerima Bantuan (PIHAK KEDUA) |

Telah dilakukan serah terima bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 367.450.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Serah Terima ini akan menggunakan dana tersebut untuk Pelatihan Budidaya Lele, Biaya Operasional Pelatihan Budidaya Lele, Pembelian Bibit Lele, Pembelian Pakan Lele, Pembelian Kolam Ikan Lele, Pembelian Pertengkapan Budidaya Lele dan Pembuatan Berang Cetakan dengan Logo PLN di:

- Desa Mak Kawing Kecamatan Balai
- Desa Temiang Mali Kecamatan Balai
- Desa Hilir Kecamatan Balai
- Desa Keadu Kecamatan Balai
- Desa Senyabang Kecamatan Balai
- Desa Temiang Taba Kecamatan Balai

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk:

1. Mendapat pengetahuan bagaimana merawat dan mengembangkan lele
2. Mendapat lapangan pekerjaan baru berupa peternak lele
3. Mendapatkan penghasilan dari berternak lele
4. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkai (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



I. PIHAK PERTAMA

1. VIDY ANDRIAS : 1.....
PLH Manager PT PLN (Persero) UPP Kalbagbar 2

II. PIHAK KEDUA

1. SELIPANG : 1.....
Penerima Bantuan



2. ROMANIUS ROMA : 2.....
Penerima Bantuan



3. ANTONIUS ANDI : 3.....
Penerima Bantuan



4. MATIUS PALJI : 4.....
Penerima Bantuan



5. KLINCIT : 5.....
Penerima Bantuan



6. LIUN : 6.....
Penerima Bantuan



7. AGNES IYAM : 7.....
Penerima Bantuan



K. of R

8. KRISTINA SERIMI
Penerima Bantuan

: 8



9. MARINA MINA
Penerima Bantuan

: 9



10. ANTONIUS JATI
Penerima Bantuan

: 10



11. ANTONIUS MINAR TULAI
Penerima Bantuan

: 11



12. YOHANES JAMES
Penerima Bantuan

: 12



13. RUPINUS TULUI
Penerima Bantuan

: 13



14. LEONARDUS APOI
Penerima Bantuan

: 14



15. EVARDUS KLINGANG
Penerima Bantuan

: 15



16. SABINUS KANCUNG
Penerima Bantuan

: 16.....



17. PETRUS AMAK
Penerima Bantuan

: 17.....



18. TONO
Penerima Bantuan

: 18.....



19. HERKULANUS LUKO
Penerima Bantuan

: 19.....



20. KANISIUS JAHER
Penerima Bantuan

: 20.....



21. STEFANUS KENEN
Penerima Bantuan

: 21.....



22. SUKIMIN
Penerima Bantuan

: 22.....



23. EMILIA LINDA
Penerima Bantuan

: 23.....



24. NIKOLAS
Penerima Bantuan

: 24



25. ROMANUS KUSA
Penerima Bantuan

: 25



26. PETRUS ACAN
Penerima Bantuan

: 26



27. DARTO
Penerima Bantuan

: 27



28. GUNIK
Penerima Bantuan

: 28



29. ADRIANUS YAYUK
Penerima Bantuan

: 29



30. WISONO
Penerima Bantuan

: 30



31. SUKARDI B
Penerima Bantuan

: 31



A small, handwritten mark or signature in blue ink located at the bottom right corner of the page.

32. RUDIYANTO
Penerima Bantuan

: 32



33. SUKIRMAN
Penerima Bantuan

: 33



III. SAKSI

1. LOVIANUS ANUS
Camat Kecamatan Balai

: 1



2. YULIUS
Kepala Desa Makkawing

: 2



3. ARPIN
Kepala Desa Temiang Mali

: 3




4. ASHADI CAHYADI
Kepala Desa Hilir

: 4



5. CENGHIN
Kepala Desa Keadu

: 5



6. MODESTUS
PJ Kepala Desa Senyabang

: 6



7. KIYANG
Kepala Desa Temiang Taba

: 7



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN DANA CSR PT PLN (PERSERO)

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| I. | Vidy Andrias | : PLH Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 2 (PIHAK PERTAMA) |
| II. | Ade Wawan J | : PLT Camat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau |
| III. | Kilung | : Kepala Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir |
| IV. | Nadi | : Kepala Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir |
| V. | Wilaatmana Datus Ivan | : Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau |
| VI. | Albert Hulton Sinaga | : Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman, Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau |
| VII. | Terlampir | : Penerima Bantuan (PIHAK KEDUA) |

Telah dilakukan serah terima bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 274.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Serah Terima ini akan menggunakan dana tersebut untuk Pelatihan Budidaya Lele, Biaya Operasional Pelatihan Budidaya Lele, Pembelian Bibit Lele, Pembelian Pakan Lele, Pembelian Kolam Ikan Lele, Pembelian Perlengkapan Budidaya Lele dan Pembuatan Barang Cetak dengan Logo PLN di:

- Desa Cempedak Kecamatan Tayan Hilir
- Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir

Manfaat bantuan tersebut adalah untuk:

1. Mendapat pengetahuan bagaimana merawat dan mengembangkan lele
2. Mendapat lapangan pekerjaan baru berupa peternak lele
3. Mendapatkan penghasilan dari berternak lele
4. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

I. PIHAK PERTAMA

1. Vidy Andrias
PLH Manager PT PLN (Persero) UPP Kalbag



47

II. PIHAK KEDUA

1. ASRIADY EKA PUTRA
Penerima Bantuan

:1.



2. DARIUS
Penerima Bantuan

:2.



3. YEYEN
Penerima Bantuan

:3.



4. JAHER
Penerima Bantuan

:4.



5. AKUANG
Penerima Bantuan

:5.



6. GEBE
Penerima Bantuan

:6.



7. ALIMIN
Penerima Bantuan

:7.



8. AWI
Penerima Bantuan

:8.



9. SUMIATI
Penerima Bantuan



10. MUNI TATAK
Penerima Bantuan



11. ASONG
Penerima Bantuan



12. NAMSUN
Penerima Bantuan



13. DERON
Penerima Bantuan



14. YOSAFAT SAMI
Penerima Bantuan



15. DUYUT (LUSIUS ONG)
Penerima Bantuan



16. SILVANUS ACOM
Penerima Bantuan



17. SUHARYADI
Penerima Bantuan

: 17



18. HASNADI
Penerima Bantuan Kantor Kecamatan Tayan Hilir

: 18



III. SAKSI

1. ADE WAWAN, J
PLT Camat Kecamatan Tayan Hilir

2. KILUNG
Kepala Desa Cempedak

3. NADI
Kepala Desa Tebang Benua

4. WILAATMANA DETIUS IVAN
NIP. 197809232006041010

5. ALBERT HUTTON SINAGA

: 2

: 3

: 4

: 5



**DAFTAR HADIR PESERTA
DALAM RANGKA KEGIATAN PELAKSANAAN CSR PLN UIP KALBAGBAR
BANTUAN BIBIT DAN BUDDAYA LELE
KECAMATAN BALAI, KABUPATEN SANGGAU**

HARI/TANGGAL : Rabu/16 Oktober 2019
WAKTU : 09.00 - Selesai
TEMPAT : Gedung Balai Penyuluhan Pertanian

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANDATANGAN	
1	SILFANO	PRIA	1	
2	IRMANEUS ROMA	PRIA		2 
3	ANTONIUS ANDI	PRIA	3	
4	MATRIS PALDI	PRIA		4 
5	KUNCI	PRIA	5	
6	LEON	PRIA		6 
7	AGNES TEAM	WANITA	7	
8	KRISTINA SERIMI	WANITA		8 
9	MARINA MINA	WANITA		9 
10	ANTONIUS ANTI	PRIA		10 
11	ANTONIS MINAR TILAI	PRIA	11	
12	YOHANES JAMES	PRIA		12 
13	RUMBUS TILAI	PRIA	13	
14	LEONARDO APCK	PRIA		14 
15	EDWARDIS RUMANG	PRIA	15	
16	SABINUS KANTORI	PRIA		16 
17	PETRIUS AMAK	PRIA	17	
18	TONO	PRIA		18 
19	BERNARDUS LUSO	PRIA	19	
20	KANISIN JALDI	PRIA		20 
21	STEFANUS KONOR	PRIA	21	

**DAFTAR HADIR PESERTA
DALAM RANGKA KEGIATAN PELAKSANAAN CSR PLN UIP KALIBAGBAR
BANTUAN BIRIT DAN HUIDAYA LELE
KECAMATAN BALAL KABUPATEN SANGGAU**

HARI/TANGGAL : Rabu/16 Oktober 2019
WAKTU : 09:00 - Selesai
TEMPAT : Gedung Balai Penyuluhan Pertanian

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANDATANGAN
22	SUKIMIN -	PRIA	22 
27	EMILIA LIBIDA -	WANITA	27 
24	NIKKAN -	PRIA	24 
25	ROMANUS KUSA -	PRIA	25 
26	PETRUS ACAN -	PRIA	26 
27	DARTO -	PRIA	27 
28	STANIL -	WANITA	28 
29	ADRIANUS VAYUK -	PRIA	29 
30	WIBONO -	PRIA	30 
31	WIKARDI H -	PRIA	31 
32	HUDIYANTO -	PRIA	32 
33	SUKMAN -	PRIA	33 

DAFTAR HADIR
DALAM RANGKA KEGIATAN PELAKSANAAN CSR PLN UIP KALBAGBAR
BANTUAN BIHIT DAN BUDIDAYA LELE
KECAMATAN BALAL KABUPATEN SANGGAU

HARI/TANGGAL : Rabu/16 Oktober 2019
 WAKTU : 09.00 - Selesai
 TEMPAT : Gedung Balai Penyuluhan Pertanian

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	LOVIANUS.A.	Camda	1 
2	MUNESWA	Pj. Kades	2 
3	ARPIN	KADES TAN. MALI	3 
4	Ashadi Cahyadi	KADES. HILISE	4 
5	ofine	PPL	5 
6	Kiyang	KADES.	6 
7	Yulius	Kades	7 
8	CENGHUA	Kades	8 
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN BALAI

JALAN ANGKASA PURI NO. 1 BATANG TARANG

Nomor : 671/El-Bang
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Set
Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan CSR

Batas, 30 Oktober 2019

Kepada
Yth. MANAGER PT PLN (Persero)
UPP KALBAGBAR2

di-
Tempat

Selubungan dengan telah terlaksana CSR PT PLN (Persero) Kalbagbar2 Dengan Program " Bantuan Bibit dan Budidaya Ikan Lele " di Kecamatan Balai, dengan ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.

CAMAT
KECAMATAN BALAI



LOYAN ANUS
090511001

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BIBIT DAN BUDIDAYA LELE

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan demi kepentingan bersama merupakan tugas penting yang diemban oleh unit-unit PLN yang tersebar di setiap daerah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali bagi PT PLN (Persero) PLN UIP Kalimantan Bagian Barat (PLN UIP Kalbagbar). Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150kV (SUTT), Gardu Induk 150kV (GI), dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sebagian wujud nyata upaya PLN dalam melistriki negeri.

Dalam mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat, PLN UIP Kalbagbar melaksanakan program CSR pada tahun 2019 ini yaitu program Bantuan Bibit dan Budidaya Lele merupakan upaya PLN UIP Kalbagbar untuk warga yang terdampak pembangunan dari Proyek SUTT 150kV Tayan – Sanggau.

Bantuan ini diharapkan akan mampu dimanfaatkan oleh para penerima bantuan dalam meningkatkan pendapatan. Selain itu diharapkan dengan bantuan ini, dukungan masyarakat dapat diperoleh dan juga meningkatkan rasa memiliki yang pada akhirnya meningkatkan keamanan proyek infrastruktur ketenagalistrikan.

1.2 NAMA PROGRAM

Bantuan Bibit dan Budidaya Lele

1.3 TUJUAN

Program CSR ini disusun sebagai bagian dari upaya PLN UIP Kalbagbar untuk menjaga kelancaran dan keamanan proses pembangunan Gardu Induk 150kV Tayan Ext dan SUTT 150kV Tayan - Sanggau serta memberikan tambahan ketrampilan bagi penerimanya.

1.4 SASARAN

Sasaran dalam pelaksanaan program CSR ini adalah warga yang terdampak secara langsung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlokasi pada ring 1 proyek SUTT 150kV Tayan – Sanggau.

1.5 MANFAAT

1.5.1 MANFAAT BAGI PLN

- Mencegah terjadinya benturan kepentingan antara perusahaan dengan lingkungan/masyarakat sekitar proyek dengan menjalin hubungan baik antara keduanya;
- Mencegah terjadinya *social cost* yang tinggi, yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan mengganggu kinerja perusahaan;
- Menciptakan citra PLN yang lebih baik yaitu peduli kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- Menjaga kelancaran proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dari kemungkinan gangguan keamanan yang ditimbulkan dari pemuda sekitar yang belum memiliki pekerjaan;
- Menjaga keamanan proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan karena rasa memiliki yang muncul dari masyarakat.

1.5.2 MANFAAT BAGI MASYARAKAT

- Menjadi tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta pelatihan;
- Ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat digunakan sebagai modal menciptakan lapangan pekerjaan bagi para peserta pelatihan;
- Peralatan yang diperoleh peserta dapat digunakan sebagai salah satu tambahan penghasilan di kemudian hari;
- Mendorong potensi penerima dalam bidang pengelolaan ikan lele.

2. PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 ANGGARAN

Adapun total anggaran yang disetujui oleh PLN Pusat untuk kegiatan Bantuan Bibit dan Budidaya Lele ini adalah sebesar Rp 367.450.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

2.2 REALISASI PELAKSANAAN

- o Lokasi Pelatihan : Aula Kantor Balai Penyuluh Pertanian Batang Tarung
- o Peserta : 35 Penerima
- o Durasi Pelatihan : 1 hari
- o Pelaksanaan :
 - Distribusi Bantuan : Tanggal 25 September 2019 – 15 Oktober 2019
 - Pelatihan : 16 Oktober 2019
- o Rincian Realisasi Anggaran :

Tabel 1. Rincian Realisasi Anggaran

No	Deskripsi	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Biaya Pelatihan	1	LS	11.950.000	11.950.000
2	Jenis Bantuan :				
	- Kolam Ikan & Atap Kolam	35	Unit	Rp 6.500.000	Rp 227.500.000
	- Bibit Ikan Lele	28000	Ekor	Rp 700	Rp 19.600.000
	- Pakan Ikan F99	56	Karung	Rp 200.000	Rp 11.200.000
	- Pakan Ikan F781-2	56	Karung	Rp 365.000	Rp 20.440.000
	- Pakan Ikan F781	112	Karung	Rp 355.000	Rp 39.760.000
	- Airator	35	Unit	Rp 800.000	Rp 28.000.000
3	Biaya Monitoring	1	LS	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
Jumlah					Rp 367.450.000

2.3 MONITORING PROGRAM

Pelaksanaan monitoring rencana dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 – Desember 2019 oleh Petugas Penyuluh Perikanan Kecamatan Balai.

3. EVALUASI

3.1 PENGUKURAN KEBERHASILAN

Tabel 2. Hasil Pengukuran Keberhasilan

No	Indikator	Formula	Bobot	Target	Realisasi	Nilai Keberhasilan
1	Peserta hadir dalam pelatihan	Hadir dalam pelatihan	30	100%	100%	30
2	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele diterima dan digunakan oleh penerima bantuan	Pengguna Sarana dan Prasarana	40	100%	100%	40
3	Tidak ada gangguan dari pihak eksternal dalam pembangunan proyek SUTT 150kV Tayan-Sanggau	Jumlah gangguan eksternal	30	0	0	30
Total			100			100

3.2 PENGUKURAN KEBERLANJUTAN

Tabel 3. Hasil Pengukuran Keberlanjutan

No	Indikator	5	4	3	2	1
1	Partisipasi aktif peserta pelatihan		v			
2	Ada kelembagaan yang mengelola program	v				

Catatan:

Skala 5: Sangat Tinggi

Skala 4: Tinggi

Skala 3: Sedang

Skala 2: Kurang

Skala 1: Sangat Kurang

4. DOKUMENTASI







5. DOKUMENTASI PENDUKUNG LAINNYA

Sumber : <https://pontianak.tribunnews.com/2019/10/22/pln-peduli-berikan-51-ribu-bibit-lele-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-warga>



Sumber : <https://sarapemredkalbar.com/berita/adveitorial/2019/10/17/pln-peduli-berikan-51000-bibit-lele-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-warga>

PLN Peduli Berikan 51.000 Bibit Lele untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Warta - 10 Oktober

Warta - 10 Oktober 2019 11:43:00 WIB - | Permalink: 04



6. PENUTUP

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami susun sebagai laporan pelaksanaan program CSR PLN Peduli Bantuan Bibit dan Budidaya Lela. Kami selaku penanggungjawab mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian dari PLN. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima bantuan.

Sanggau, 30 Oktober 2019

Camat
Kecamatan Balai



Appendix 23 Inventory of Loses in packages 1 – 7

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 1: 275 KV BENGKAYANG-JAGOIBABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE AMOUNT		
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE		S	B	Pro
1	T. B	HARDIANTO	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	279	3		
	T. B	RUDIS	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	346	16		
2	T.C	JUWITA	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	19	-	32
3	T.D	ACHMAD	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	15		28
4	T.07	MUSLINI NAPIS	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	1600	-	-	1,602
5	T.08	H. SLAMET PRIANGGODO	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	20	-	20
6	T.09	MIAN	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	-		625
7	T.10	RUSNI	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	-	1	57
8	T.11	ISTRA TAYO	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	30.25	2	12	1
	T.11	AHENG	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	594.75	3	49	
9	T.12	MARDIANA SADUT	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	100			100
	T.12	AKUI	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	1500			1,500
10	T.13	SONO	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625	1	-	1
11	T.14	AHENG	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625	-	-	-
12	T.15	APOLONIUS	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	1524	16	136	1
	T.15	YOSEP WILOPO	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	50	6	4	-
	T.15	ALAN	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	26	-	-	-
13	T.16	ESIDORUS	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625	15	-	-
14	T.17	F.KUMAS	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625	-	1	-
15	T.18	MARLINA	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	1600			
16	T.19	RUDI	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	900			
17	T.20	AHON	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625			
18	T.21	KINDONG	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	375	11	6	
	T.21	SITANG	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	250	11		
19	T.22	LINTU	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625		9	
20	T.23	ALO	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	582.1			57
	T.23	MAD RIDUAN (ACON) / HERLI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	42.9			
21	T.24	SUJEN	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	360.75			76
	T.24	DEDENG	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	264.25			34
22	T.25	YUPENSIUS AKUI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625			
23	T.26	MARIAM MAGDALENA	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625			
24	T.27	LORENSIUS SANYO	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625	6		
25	T.28	RACHIMING	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	1600	6		
26	T.29	YOPINUS ATUI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625			625
27	T.30	YUPENSIUS AKUI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625		10	
28	T.31	YUPENSIUS AKUI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625			625
29	T.32	ANDI GEORGE RUDY	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	312.5	1		24
	T.32	ATUK	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	312.5	-	-	2
30	T.33	A.J. ATIAM	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625	-	-	15
31	T.34	LASIUS	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625	-	-	-
32	T.35	HERMANUS NAMJUN	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625	-	-	-
33	T.36	ASANG	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	625	-	-	-
34	T.37	PAULUS GARANSE	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	625	-	-	625
35	T.38	PAULUS GARANSE	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	625	-	64	20
36	T.39	ANYUN	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	1000	-	10	-
	T.39	SIMAH	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	600	-	-	-
37	T.40	MATSAM	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	1600	-	10	-
38	T.41	ALEXSANDER	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	625	-	16	-
39	T.42	JUMADI	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	525.8		10	
	T.42	SAMSIAR	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	99.2			
40	T.43	YOSEP BUYUK	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	312.5		51	
	T.43	DIONG	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	114.4		7	
	T.43	RAFAEL YEREMIAS, A.Ma. Pd	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	198.1	38	46	-
41	T.44	NURSIH	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	312.5	-	-	23
	T.44	ASIU	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	312.5			
42	T.45	AGUS	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	1600			
43	T.46	SANTULIT	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	1600			
44	T.47	TIAM	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	392.2			
	T.47	MAGDALENA YOPITA	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	519.8			
	T.47	SIMON SUMAN	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	688			
45	T.48	PAULUS	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	107.5		30	
	T.48	YORIS RUPERTUS	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	465.75		45	
	T.48	NGAOK	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	51.75			
46	T.49	TANDE	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	125	5		
	T.49	ATIK	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	500	10		
47	T.51	TAMPUAK	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625		3	3
48	T.52	LUKANUS LUKAS PASALIMA	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625			15
49	T.53	PATE	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	72.5		1	26
	T.53	JAKARIA	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	552.5		11	101
50	T.54	NAWI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625		18	12
51	T.55	GILO	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	160.25	8	12	11
	T.55	BENEDIKTUS EPENDI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	322.5	15	8	9
	T.55	SUDIYONO	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	142.25	25		25
52	T.56	BENEDIKTUS EPENDI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625	21	51	41
53	T.57	P BUSRI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	1144.3125	-	14	131
	T.57	ADI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	217.1875	-	5	12
54	T.58	AHENG	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625	-	-	78
55	T.59	SIDOL	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625	-	13	90
56	T.60	ALEXANDER AL	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625	-	-	38

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 1: 275 KV BENGKAYANG-JAGOIBABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE AMOUNT		
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE		S	B	Pro
57	T.61	M. SIDIK DERAHMAN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	1	15	13
58	T.62	M. SIDIK DERAHMAN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	16	-	20
59	T.63	SOLEHA	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	36	23	31
60	T.64	RAMLI BUSRI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	26	23
61	T.65	H.HENDRI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	65	8
62	T.66	PARONI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	2	2	11
63	T.67	M. SIDIK DERAHMAN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	1600	44	52	84
64	T.68	MARJONO	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	2	-	14
65	T.69	LIMIN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	-	11
66	T.70	BUNGA	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	15	11	21
67	T.71	AKAI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	58	9	55
68	T.72	TIUS DAVID YUSMAN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	16	8
69	T.73	ANITA	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	43	1	15
70	T.74	NURLAILA	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	35	35
71	T.75	HAMIDUN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	160	-	-	39
	T.75	SURIPTO	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	1440	51	-	16
72	T.76	ALI SUMARDI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	25	30	85
73	T.76A	MATJUNI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	53	2	48
74	T.77	MATJUNI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	104.525	11	-	18
	T.77	RAHAYU	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	520.475	42	-	32
75	T.78	M. KAWI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	33	25
76	T.79	SUNTORO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	1600	-	-	-
77	T.80	ALIMIUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	16	13	44
78	T.81	SUDARMI A.R	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	1	15	-
79	T.82	ANTONIUS MANTUK	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	-	14	-
80	T.83	ACHMAD RUSMAN	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	-	13	-
81	T.84	IYUN	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	50	1	83
82	T.85	DIKON	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	930	60	94	21
	T.85	RONI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	670	-	8	11
83	T.86	PAULUS B.SAPUTRA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	1300	12	-	23
84	T.86	DINARTO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	300	-	-	30
85	T.87	TIJO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	312.5	1	19	2
	T.87	SIMON PETRUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	312.5	2	7	7
86	T.88	SIMON PETRUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	-	8	4
87	T.89	KORNIA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	44	-	20
88	T.90	YUDAS GUNAWAN	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	-	-	-
89	T.91	LASE. G	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	331.25	26	-	-
	T.91	LUKIUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	293.75	-	17	24
90	T.92	BENYAMIN YB	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	12	64	15
91	T.93	JERARI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	1	3	6
92	T.94	BETI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	18	-	-	-
	T.94	LIAH	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	607	-	-	-
93	T.95	SAKIM	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	-	-	-
94	T.96	SULIYEM	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	-	-	-
95	T.97	MUNTARI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	97.5	-	-	-
	T.97	RIBUT LESTARI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	527.5	-	-	-
96	T.98	SUPARDI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	254	-	-	-
	T.98	SAKIM	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	371	-	-	-
97	T.99	SUMARNI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	17	12	-
98	T.99A	AGUS SUGITO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	35	12	28
99	T.100	HASAN K	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	17	17	-
100	T.101	ISMANTO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	1600	-	-	-
101	T.102	RAHMAT	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
102	T.103	BAMBANG ARIANTO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
103	T.104	BASTIANA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	42	131	10
104	T.105	BASTIANA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	17	38
105	T.107	RANJO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	312.5	-	-	-
	T.107	M. NANJU	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	312.5	-	-	-
106	T.106	AGUS SURYADI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
107	T.108	DOMINIKUS ELIAS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
108	T.109	IGNASIUS KASIONO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
109	T.110	NIUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
110	T.110 A	N.H UKIL	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	245	-	-	-
	T.110 A	MARIA CORY	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	380	-	-	-
111	T.111	YOHANES	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	332	-	-	-
	T.111	LUTHERIUS SUNAY	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	1268	-	-	-
112	T.112	DOLOP	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
113	T.113	SIMA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
114	T.114	PURWANTO APANG	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	69	-	-	-
	T.114	LAZARUS INA KASONG	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	455	-	-	-
	T.114	YOHANES TOTO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	101	-	-	-
115	T.115	BANANG	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
116	T.116	JURIAH	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
117	T.117	LUSIANA	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-
118	T.118	LUKAS KATEK	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-
119	T.119	A. MANTODANG	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-
120	T.120	YULIUS AJON	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	316.65	-	-	-
	T.120	IYUS M	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	228.35	-	-	-
	T.120	BARNABAS BUDIN	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	80	-	-	-
121	T.121	KRISTIANUS SULUNG	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-
122	T.122	ASTERIA TIMEN	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 1: 275 KV BENGKAYANG-JAGOIBABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE AMOUNT		
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE		S	B	Pro
123	T.123	BENGKALAS	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625			
124	T.124	ALIPIUS UPUNG	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	314.88			
	T.124	LUSIANUS TINUS	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	1285.12			
125	T.125	EKA SURYATI	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	136.15			
	T.125	FX. MOSES	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	175.49			
	T.125	ABU MARJANI	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	313.36			
126	T.126	KIUN	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625			
127	T.127	PETRUS	BENGKAYANG	Seluas	SAHAN	72.4			1
	T.127	PAULUS BARING	BENGKAYANG	Seluas	SAHAN	438	29		43
	T.127	YOHANES	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	114.6	-	-	-
128	T.128	DAMIANUS ANIS	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	160	59	48
129	T.129	BENEDIKTUS BASUNI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	1600	-	-	171
130	T.130	PARUDIMAN	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	151	29	19
131	T.131	BUNYI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	45	54	16
132	T.132	SIKIN	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	200	-	233
133	T.133	AREP	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	-	43	19
134	T.134	PILIH	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	1600	-	56	94
135	T.135	HASAN	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	1	66	358
136	T.136	ZAKARIA SIDOKSI DOOK	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	64	4	149
137	T.137	ATAP	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	600.91		122	44
	T.137	LUSIANA JANA	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	24.09	1	5	3
138	T.138	ALEX	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	1	11	77
139	T.139	ATOK	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	1	72	16
140	T.140	RITA NOPIANTI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	156.25		25	
	T.140	HERLINA DAYANG	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	468.75		78	21
141	T.141	TOLE	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	2	63	17
142	T.142	NILAWATI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625		49	
143	T.143	KORNELIUS	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	230	24	103	291
	T.143	BUNYI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	125	1		3
	T.143	JUHET	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	270			
144	T.144	KARDI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	-	48	203
145	T.145	KAREM	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	0	-	51	1,432
	T.145	HARIYANTO	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	-	-	-
146	T.146	AEN	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	1	61	1
147	T.147	JOHAR	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	1056		33	46
	T.147	MUSTAPA	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	544		10	15
148	T.148	IYOT	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	145		1	
	T.148	SUHARDI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	480	71	76	
149	T.150	AREP	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	130	123	-
150	T.151	BATU	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	-	5	68
151	T.152	WINARDI KALEPI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	-	-	-
152	T.153	GRAMA	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	35	102	-
153	T.154	TAYEN	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	1600	42	45	-
154	T.155	LIAN	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625			
155	T.156	JONO	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625			
156	T.157	MARADONA	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625		105	
157	T.158	TUNANG	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625			
158	T.158A	KARSONO	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	468.75			128
159	T.158A	JONGI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	156.25	30	-	156
160	T.159	ASY	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	276.7	176	11	35
	T.159	ISMET	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	312.2	147	2	24
	T.159	ANDREAS	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	1011.1	714	16	88
161	T.160	KARTINI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	93	132	14
162	T.161	ABDUL MAJID	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	90	2	-
163	T.162	JOHARDI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	99	6	624
164	T.163	AKOY	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	44	33	5
165	T.164	MUIN	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	285	39	50
166	T.165	FIRDAUS R	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	54	91	11
167	T.166	LOPU	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	1600	63	104	15
168	T.167	JULIA	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	-	-	18
169	T.168	JONI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	200	-	-
170	T.169	AHMAT LABEH	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	15	4	19
171	T.170	KUSTAMAN	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	312.5	114	105	11
	T.170	NOKIA	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	312.5	47	74	8
172	T.171	YESINUS SUWI	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	63	126	7
173	T.173	SALLIS	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625			13
174	T.174	SALLIS	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625			
175	T.176	MARKUS MIJEM	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	63	48	31
176	T.177	AKON	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	-	40	5
177	T.183	ANTONIUS ATONG N	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	8	-	16
178	T.185	JIMUA DINGOK	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	-	21	-
179	T.186	NYOHIAG KIBUAK	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	7	80	-
180	T.187	ATHEL	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	-	104	-
181	T.188	ANTONI	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	281.2	33	31	3
	T.188	LIPIN	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	334	-	36	-
	T.188	NYABU KISUAG	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	9.8	1	1	-
182	T.189	ABDULLAH BIN ATIN	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	396.6	16	40	13
	T.189	VIKTORIANUS JONDIAU	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	228.4	14	21	5
183	T.190	DARMADI	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	-	33	-

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 1: 275 KV BENGKAYANG-JAGOIBABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE AMOUNT		
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE		S	B	Pro
184	T.191	ANTONIA JOAIS	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	31	12	39
185	T.192	JITOM GODEW	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	312.5	50	-	313
	T.192	AKO	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	312.5	20	-	313
186	T.193	MAHUT NYANDAU	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	1253		34	29
	T.193	JONDEH	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	347		55	8
187	T.194	NOYAB	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	343.2			
	T.194	ERYANTI LIDER	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	170			
188	T.195	WARSON ELMION	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625			
189	T.196	NOGIAN NYABEG	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	35.28			
	T.196	AGUS NYOEK	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	589.72			
190	T.197	NOGIAN NYABEG	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	127.5			
	T.197	JIMOU MONYIAS	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	139.1			
	T.197	NOYAB	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	358.4			
191	T.198	BUDIONO	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	1600			
192	T.199	ANTONI	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	1600			
TOTAL						145,974.70	4,444	4,238	13,052

**INVENTORY OF LOSES FOR LAND
PACKAGE 2: 275 kV BENGKAYANG SUBSTATION**

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land Holding (ha)	Affected (ha)	Name	Total	Unit
	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA		66.087			
	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA		688			
Total					754.087			

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
1	T.01A	DOMINIKA, A.Md.	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	400.00
2	T.02A	MANISEM	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	400.00
3	T.03A	IR. ROBINSON PINEM	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	400.00
4	T.04A	IR. ROBINSON PINEM	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	225.00
5	T.05A	ABDUL AJIS	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	82.50
	T.05A	SUPARMAN	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	142.50
6	T.06A	JAHANAT	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	112.50
	T.06A	THEN KIUUK LAN	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	112.50
7	T.07A	ARDIYANTO ALONG	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	400.00
8	T.04	DAWAWI	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	230.00
	T.04	THEN KIUUK LAN	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	170.00
9	T.005	PONIRAH	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	27.00
	T.005	BERNADETA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	198.00
10	T.006	AMIN	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	140.60
	T.006	ALON	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	84.40
11	T.007	ATAK	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	60.00
	T.007	AJE	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	165.00
12	T.008	INSON	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
13	T.009	YUSTINUS BOYON	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	400.00
14	T.010	ROSITA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
15	T.011	ATUK	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	82.50
	T.011	ROSITA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	142.50
16	T.012	TANAH PEMDA/SEKOLAH	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
17	T.013	IBRAHIM	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
18	T.014	TANAH PEMDA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
19	T.015	PAULINA DAYANG	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	400.00
20	T.016	YULIUS	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	400.00
21	T.017	KASIUS	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
22	T.018	KASIUS	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
23	T.019	SANSIBUT	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
24	T.020	SANSIBUT	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
25	T.021	SANSIBUT	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
26	T.022	BUNTUN	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	64.50
	T.022	PURANTO	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	160.50
27	T.023	PANYA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	400.00
28	T.024	THOMAS TINGGI	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	225.00
29	T.024 A	KUBIA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	225.00
30	T.025	KARDINAN	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	225.00
31	T.026	LIU	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	225.00
32	T.27	BUYUNG	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
33	T.28	SUNGGUT	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
34	T.29	ALAI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
35	T.30	ALEXSANDER ASUN	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
36	T.31	KUWAI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	37.50
	T.31	ZAM'ON	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	112.50
	T.31	URAY	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	75.00
37	T.32	SELIUS SINAM	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
38	T.33	SELIUS SINAM	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
39	T.34	THERESIA	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	6.45
	T.34	BANCEK	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	218.55
40	T.35	JULIANA	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	225.00
41	T.36	BAMBANG	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	225.00
42	T.37	ALVIAN SAHPUTRA	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	400.00
43	T.38	SINYUH	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	400.00
44	T.39	PADAH	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	200.00
	T.39	SINYUH	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	200.00
45	T.40	PINUS	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	225.00
46	T.41	TOYON	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	225.00
47	T.42	ONDOI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	225.00
48	T.43	UJI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	400.00
49	T.44	IKUT	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	320.00
	T.44	UJANG MULYADI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	80.00
50	T.45	YOHANES LAGU	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	400.00
51	T.46	MARUNI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	400.00
52	T.47	KARENGKENG	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	225.00
53	T.48	TAYEP	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	400.00

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
54	T.49	FIRMINUS LIHONG	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	225.00
55	T.50	DUMBEN	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	400.00
56	T.51	PAULUS AKAI	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	225.00
57	T.52	RAJIM	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	225.00
58	T.53	LION	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	400.00
59	T.54	GAMBENG	BENGKAYANG	TERIAK	TERIAK	225.00
60	T.55	GAMBENG	BENGKAYANG	TERIAK	TERIAK	225.00
61	T.56	ANDAS	BENGKAYANG	TERIAK	LULANG	400.00
62	T.57	K. KATAI	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	225.00
63	T.58	K. KATAI	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	400.00
64	T.59	FLORENSIUS SAPEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	160.00
	T.59	GANIPO	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	240.00
65	T.60	JEFRI ARE	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	79.00
	T.60	YOHANA SINAH	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	146.00
66	T.61	LOBEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	225.00
67	T.62	MIUN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	60.00
	T.62	UNUS	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	165.00
68	T.63	LOBEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	400.00
69	T.64	SEKEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	112.50
	T.64	PL KAPAI	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	112.50
70	T.65	ABU OSET	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	112.50
	T.65	SIPON	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	112.50
71	T.66	SEKEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	225.00
72	T.67	OMAS	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	80.00
	T.67	LOBEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	320.00
73	T.68	BALOTON	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
74	T.69	MAWAN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
75	T.70	ASUN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	112.50
	T.70	MIMBIT	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	112.50
76	T.71	OLO	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
77	T.72	DAMIANUS MOTOK	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
78	T.73	GABAI	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
79	T.74	GABAI	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	400.00
80	T.75	ERDINO	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
81	T.76	BURING	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
82	T.77	ERAN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
83	T.78	FRANSISKUS SUDIRHONO	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
84	T.79	LUHAK	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
85	T.80	AKIN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
86	T.81	SURIA	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
87	T.82	SALVIUS	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
88	T.83	TOYOTOMY	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
89	T.84	MARITIN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
90	T.85	HERKULANA BUTEN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
91	T.86	ASIN	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	400.00
92	T.87	MARKI	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
93	T.88	OGET	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
94	T.89	NYAMPO	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
95	T.90	IJING	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
96	T.91	HENDRIKUS ADOK	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
97	T.92	ANDI	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	112.50
	T.92	THOMAS	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	112.50
98	T.93	MASIR	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
99	T.94	UNDOT	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
100	T.95	ALEN	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
101	T.96	SINU	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	112.50
	T.96	ABEN	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	112.50
102	T.97	IMUS	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	400.00
103	T.98	STEPANUS ASONG	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	400.00
104	T.99	ABEN	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
105	T.100	LOHAI	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	39.00
	T.100	HENDRIKUS ERIK	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	161.00
	T.100	F.X SORA	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	200.00
106	T.101	M. ANEM	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
107	T.102	BUKU	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	112.50
	T.102	LIBERTUS	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	112.50

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
108	T.103	MUNGKIN	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
109	T.104	NINJO	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
110	T.105	PETERUS MAINI	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
111	T.106	SAMEO	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	120.00
	T.106	ADO	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	105.00
112	T.107	ABSENTEN	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
113	T.108	LIUS	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
114	T.109	SUMARDI	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	400.00
115	T.110	MARSIANA	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
116	T.111	LIJUN	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
117	T.112	CUNGKIN	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
118	T.113	MARONAS	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
119	T.114	TORINO	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	112.50
	T.114	ALOYSIUS BAAT	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	112.50
120	T.115	MULIADI	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
121	T.116	LUTER	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
122	T.117	HERMAN TOPO	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
123	T.118	JUANIS	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
124	T.119	IRON	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
125	T.120	SURYANI	LANDAK	MENYUKE	ANSANG	225.00
126	T.121	YOHANA BIO	LANDAK	MENYUKE	ANSANG	400.00
127	T.122	NETTY	LANDAK	MENYUKE	ANSANG	400.00
128	T.123	ANOS	LANDAK	MENYUKE	ANSANG	225.00
129	T.124	LONGKIAT	LANDAK	MENYUKE	DARIT	225.00
130	T.125	YAK RAJIMIN	LANDAK	MENYUKE	DARIT	225.00
131	T.126	RAPA'I	LANDAK	MENYUKE	DARIT	400.00
132	T.127	RAPA'I	LANDAK	MENYUKE	DARIT	401.00
133	T.128	BUJANG KARIMAN	LANDAK	MENYUKE	DARIT	225.00
134	T.129	HADIAH	LANDAK	MENYUKE	DARIT	225.00
135	T.130	MULYADI	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
136	T.131	ERNAWATI	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
137	T.132	PAKUM	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
138	T.133	LIBERTUS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
139	T.134	LIBERTUS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	180.00
	T.134	FIRMINIUS PIUS LEO S.Pd	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	45.00
140	T.135	SIPI BIN PUTU	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
141	T.136	SUPARMAN	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
142	T.137	JEJE SUPARJE	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	114.00
	T.137	LOSAWATI	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	286.00
143	T.138	JEJE SUPARJE	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	112.50
	T.138	AJINIS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	112.50
144	T.139	TONO	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
145	T.140	JONGSEN	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
146	T.141	NOREN ASIP	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	250.00
	T.141	SUPARTO	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	150.00
147	T.142	ALIAS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	72.00
	T.142	SALIA	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	153.00
148	T.143	ALIAS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
149	T.144	UCEK	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
150	T.145	MIRIN	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
151	T.146	KAMIS SIONG	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
152	T.147	IWAN	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	33.75
	T.147	FIRMATUS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	191.25
153	T.148	RADINUS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
154	T.149	ATIP	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
155	T.150	LAHONG	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	400.00
156	T.151	ABONG	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
157	T.152	ADONISIUS	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	160.50
	T.152	MULIADI	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	64.50
158	T.153	JUNGKIN	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
159	T.154	ASOI	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
160	T.155	PETRUS	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
161	T.156	HARTATO	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
162	T.157	KUTING	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	400.00
163	T.158	HERMINUS CAMIN	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	400.00
164	T.159	AYUNI	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	400.00

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
165	T.160	ALIAT	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
166	T.161	KUTING	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
167	T.162	KUTING	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
168	T.163	TJAMIN	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	400.00
169	T.164	DONATUS	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
170	T.165	ARJONI	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
171	T.166	AJIS BANDAR	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
172	T.167	SUNTET	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
173	T.168	MARSUDI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
174	T.169	SARINA	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
175	T.170	NI'I	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
176	T.171	SOLEMAN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
177	T.172	SOMANTRI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
178	T.173	SUPARDI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	400.00
179	T.174	LUGEN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
180	T.175	PONI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
181	T.176	YONAS	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
182	T.177	SONTAT	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
183	T.178	SAEBAR	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
184	T.179	JAMEN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
185	T.180	NORHEN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
186	T.181	AMIO	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
187	T.182	SUKUR	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
188	T.183	LEDENG	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	112.50
	T.183	BAJIADI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	112.50
189	T.184	SALMAN ALIN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
190	T.185	SUKUR	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
191	T.186	YUSMAN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
192	T.187	MARSUDI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
193	T.188	AENG	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
194	T.189	GATOT	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
195	T.190	GATOT	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
196	T.191	FEBRINA WINDY HARIANJA	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
197	T.192	ENDANG	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
198	T.193	CUNGHIN	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
199	T.194	SUHERMAN	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
200	T.195	SIANA	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	112.50
	T.195	TOTON CIPUTRA	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	112.50
201	T.196	ARSITA	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
202	T.197	SANTI	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
203	T.198	HERCHOLANUS TAYAM	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
204	T.199	TERTULIANUS ABANG	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
205	T.200	LIMAN	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	400.00
206	T.201	ANSELMUS	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
207	T.202	DOYAN	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
208	T.203	TETLI	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
209	T.204	TETLI	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
210	T.205	TETLI	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
211	T.206	ANTONIUS	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
212	T.207	INDAS	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
213	T.208	SIMBO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
214	T.209	SAIYAH	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
215	T.210	YULIANUS SUPANDI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
216	T.211	USENLI BIN UNAN	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	112.50
	T.211	NUSI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	112.50
217	T.212	SAINAN	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	400.00
218	T.213	BRUNO SUPANDI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
219	T.214	MATIUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	150.00
	T.214	PHILIPUS APU	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	75.00
220	T.215	DALENA	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
221	T.216	PULIN	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
222	T.217	HERIANTO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
223	T.218	HERMAN PLASNUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
224	T.219	FRANSISKUS BONCANIUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
225	T.220	EDY TARMJI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
226	T.221	TECONG BINGKAI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	400.00

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
227	T.222	VINSENSIUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
228	T.223	VINSENSIUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
229	T.224	ITUS BOLO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
230	T.225	Z. MATURUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
231	T.226	HERMAN UNANG	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	400.00
232	T.227	HERMAN UNANG	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
233	T.228	YANTO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
234	T.229	YANTO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
235	T.230	OTAL	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
235	T.231	AMET	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
236	T.232	SUNARDI	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
237	T.233	JAPRI	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
238	T.234	ADENG	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
239	T.235	MARSIANUS SARIMIN	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
240	T.236	KAMISRAN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
241	T.237	YANTI	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
242	T.238	SUMARNI	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
243	T.239	BUJANG BORNEO	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	400.00
244	T.240	YA' UMARYADI	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	400.00
245	T.241	GUSTI BASRUN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	400.00
246	T.242	SAHDEMEN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	175.00
	T.242	YA' RAMLAN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	50.00
247	T.243	SAHDEMEN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
248	T.244	YA' RAHIMAN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	400.00
249	T.245	YON KELANA	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
250	T.246	NURAINI	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
251	T.247	MISBAH	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
252	T.248	ERNAWATI	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
253	T.249	ERNAWATI	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
254	T.250	MISBAH	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
255	T.251	EMAWATI	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
256	T.252	SRIWATI	LANDAK	NGABANG	RAJA	400.00
257	T.253	ABDUL WIRI	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
258	T.254	AIY AHMAD NAPI	LANDAK	NGABANG	RAJA	81.00
	T.254	TAIRAN	LANDAK	NGABANG	RAJA	144.00
259	T.255	KARIANTO	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
260	T.256	M. SIMBOLON	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
261	T.257	ANSELMUS ASOL	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
262	T.258	EHAT	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
263	T.259	SRIYONO	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
264	T.260	JEFRI	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	400.00
265	T.261	SUPARMIN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
266	T.262	SUPARMIN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
267	T.128A/263	KIAN MIN Als. MULYADI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
268	T.127A/264	YA' HERMANSYAH	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
269	T.126A/265	F. SATIUR	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
270	T.125A/266	SUDIRMAN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
271	T.124A/267	NGAENG	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	101.20
	T.124A/268	ATTA	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	123.80
272	T.123A/268	YUSUF BIN KAY	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
273	T.122A/269	MURTINAH	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
274	T.121A/270	MURTINAH	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
275	T.120A/271	ACIT BINTI TAGAL	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
276	T.119A/272	THAMRIN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
277	T.118A/273	UDO	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
278	T.117A/274	DRS. YOHANESS METER	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
279	T.116/275	SUPARJUS	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
280	T.116A/276	ABAS TINUS	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
281	T.116B/277	WANDI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
282	T.1A	RIDUAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
283	T.1B	HAJI MUHAMMAD YUSUF	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
284	T.1C	IR. B. RACHMAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
285	T.1C/1	IR. B. RACHMAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	172.50
	T.1C/1	SUDIRMANTO	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	52.50
286	T.1D	DALMASIUS DJANIAN TO	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
287	1D/1	SUJAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
288	T.1E	SUJAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
289	T.1F	OKOM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
290	T.1G	RAMLI APUNG	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
291	T.2	SARUM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
292	T.3	NUPI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
293	T.4	SOLEMAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
294	T.4A	TIMI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
295	T.5	SITI KHALIJAH	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
296	T.6	LIPA	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	80.00
	T.6	ALENG	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	320.00
297	T.7	INUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
298	T.8	YUSNI DOEN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
299	T.9	ANES	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
300	T.10	KASEM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
301	T.11	MARSIANUS LONGGON	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
302	T.12	MINGGU	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
303	T.13	SITER	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
304	T.14	MARSIANA SEPI	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
305	T.15	MAS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
306	T.16	MAS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	26.70
	T.16	LOLANG	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	198.30
307	T.17	MASWANI	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	400.00
308	T.18	NAMHENG	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
309	T.19	PUNJIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
310	T.20	JABAR	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	400.00
311	T.21	VLAPIANUS SALEM	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
312	T.22	VINSENSIUS JANEN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	400.00
313	T.23	YUVENSIUS OPOR	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	17.80
	T.23	YAKOBUS NAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	54.00
	T.23	SIMON PETRUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	86.50
	T.23	ONCET	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	66.70
314	T.24	YANUARIUS YANSIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
315	T.25	ANUGRAH SUGIHARTO	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	400.00
316	T.26	SARSA	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
317	T.27	ANIUS BEBE	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
318	T.28	PUKMIN	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
319	T.29	ACUNG	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
320	T.30	APIN AYAI S.Pd	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
321	T.31	ASUN	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
322	T.32	TORAN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
323	T.33	SIJON	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	37.50
	T.33	JAWADI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	33.00
	T.33	AYAI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	327.50
324	T.34	DONATA	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
325	T.35	ANGGEK	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
326	T.36	L. NADIN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
327	T.37	ANYI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
328	T.38	PENDI KINYOK	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.00
329	T.39	DARIUS COS	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.00
330	T.40	BUNCANG	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.00
331	T.41	YOHANES ANJUI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	388.60
	T.41	HERKULANUS KASEM	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	11.40
332	T.42	SELIMIN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.00
333	T.43	SEKIUS ADIS	SANGGAU	BALAI	TAE	400.00
334	T.44	EKO	SANGGAU	BALAI	TAE	225.00
335	T.45	DESMAS EDES	SANGGAU	BALAI	TAE	225.00
336	T.46	MASTERPIN	SANGGAU	BALAI	TAE	225.00
337	T.47	SWANTONIUS MUNING	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	225.00
338	T.48	ENENG	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	225.00
339	T.49	PAULUS SUMADI	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	225.00
340	T.50	YULIANUS LAMIT	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	225.00
341	T.51	YULISUS ABONG	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
342	T.52	YULISUS ABONG	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	134.40
	T.52	IYUS	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	265.40

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
343	T.53	YOSEF ANYO	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
344	T.54	ALOISIUS	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
345	T.55	AWIS	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
346	T.56	UHIK	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
347	T.57	ANDRI ANUN	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
348	T.58	IGNASIUS INTEI	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
349	T.59	MARTINUS ADO	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
350	T.60	MARTINUS ADO	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
351	T.61	BUJANG BASRI	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
352	T.62	YUS	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
353	T.63	LANDON	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
354	T.64	LORENSIUS LAMAT	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
355	T.65	SUPRIKUS SULAP	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
356	T.66	KUER	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
357	T.67	DIRU	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
358	T.68	ANTONIUS LIMAT	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
359	T.69	BUJANG BASRI	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
360	T.70	ISAI	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
361	T.71	TANGGO	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
362	T.72	HERKULANUS ADUNIUS	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
363	T.73	MARIA NINIK	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
364	T.73/1	F. SIDOL	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
365	T.74	AUNG	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
366	T.75	BUJANG BASRI	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
367	T.76	CAK	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
368	T.77	HERKOLANUS RONJOK	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
369	T.78	SIMONG	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
370	T.79	FULGENSIUS SIMPE	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
371	T.80	UNANG	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
372	T.81	NASARIANTO	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
373	T.82	ALENG	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	37.50
	T.82	ANGONG	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	112.50
	T.82	THOMAS A.	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	75.00
374	T.83	ILAS	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
375	T.84	THOMAS A.	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	400.00
376	T.85	MARTONO AMIAU	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
377	T.86	DERIS	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
378	T.87	JAPIANUS	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
379	T.88	SUDIN	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
380	T.89	IBEN S	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
381	T.90	ADRIANO RIDHO	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
382	T.91	SURONO (PT. BUKIT AKAMAYO)	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
383	T.92	SURONO (PT. BUKIT AKAMAYO)	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
384	T.93	SURONO (PT. BUKIT AKAMAYO)	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
385	T.94	SURONO (PT. BUKIT AKAMAYO)	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
386	T.95	SURIADI	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	400.00
387	T.96	AMUD	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
388	T.97	KARDIANUS KIMAT	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
389	T.98	JUHIN	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
390	T.99	ASEK	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
391	T.100	HIDAYAT	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
392	T.101	PIYUS TABONG	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
393	T.102	TENGGEL	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	195.00
	T.102	IHANG	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	30.00
394	T.103	KAREM	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
395	T.104	KUMPANG	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	112.50
	T.104	MOLYADI	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	112.50
396	T.105	LONDOK	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
397	T.106	MURAT	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
398	T.107	APEK PARMAN	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
399	T.108	MURAT	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
400	T.109	BAET	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
401	T.110	BIJO	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
402	T.111	ACOK	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
403	T.112	YULIANA YORDAN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
404	T.113	FIKTORIANUS WAHDI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
405	T.114	WANDI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
406	T.114A	EDI SWADESI, SH	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
407	T.114B	DONATUS TUMAT	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
408	T.114C	WANDI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
TOTAL						112,148.80

**INVENTORY OF LOSES FOR LAND
PACKAGE 4: 150 kV NGABANG SUBSTATION**

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land Holding (ha)	Affected (ha)	Name	Total	Unit
	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK		9875			

**INVENTORY OF LOSSES FOR LAND
PACKAGE 5: 150 kV SANGGAU AND SEKADAU SUBSTATIONS**

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land	Affected (ha)	Name	Total	Unit
Yulia Ani	SANGGAU	KAPUAS	SEI MAWANG	1.1795	1.061	Rubber	1140	Trees
						Cerucuk	14	Trees
						Durian	1	Trees
						Star Fruit	3	Trees
						Medang	41	Trees
						Kampas	25	Trees
						Leban	15	Trees
						Ubah	28	Trees
						Bamboo	3	Trees
						Mentawak	2	Trees
						Rambutan	22	Trees
						Pinang	1	Trees
						Palm Oil	3	Trees
						Asam Kalimantan	11	Trees
						Cempedak	24	Trees
						Bitter Bean	2	Trees
						Gaharu	2	Trees
						Snake Fruit	2	Trees
						Chocolate	6	Trees
						Nyatoh	29	Trees
						Asam Kendis	1	Trees
						Kayu Malam	1	Trees
						Tengkawang	3	Trees
Pekawai	1	Trees						
Mahang	124	Trees						
Guava	10	Trees						
Pulai	29	Trees						
Alisius	SANGGAU	KAPUAS	SEI MAWANG	1.2188	0.828	Rubber	697	Trees
						Tengkawang	3	Trees
						Mahang	35	Trees
						Nyatoh	9	Trees
						Cempedak	10	Trees
						Pulai	1	Trees
						Durian	3	Trees
						Leban	26	Trees
						Kapuak	3	Trees
						Cerucuk	16	Trees
Bamboo	6	Trees						

INVENTORY OF LOSES FOR LAND
PACKAGE 5: 150 kV SANGGAU AND SEKADAU SUBSTATIONS

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land	Affected (ha)	Name	Total	Unit
						Rambutan	8	Trees
						Palm Oil	41	Trees
						Medang	3	Trees
						Sago Palm	2	Trees
						Longan	2	Trees
						Bitter bean	22	Trees
						Peluntan	2	Trees
						Embaong	4	Trees
						Tekan	1	Trees
						Local Wood	8	Trees
Solisman	SANGGAU	KAPUAS	SEI MAWANG	1.3468	0.3414	Rubber	5	Trees
						Cerucuk	1	Trees
						Leban	2	Trees
Amount							8	Trees
Sanggau Substation					2.2304		2453	Trees
Sungai Kuring Village Sekadau Hilir Subdistrict, Sekadau District								
Abang Mokmen	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI KUNYIT	1.3203	1.3203	Rubber	2032	Trees
						Leban	14	Trees
						Meranti	47	Trees
						Jengkol	11	Trees
						Cempedak	55	Trees
						Durian	179	Trees
						Mentawak	14	Trees
						Rambutan,	20	Trees
						Pelantan	3	Trees
						Setopong	1	Trees
						Entawak	1	Trees
						Mango	5	Trees
						Kepuak	2	Trees
						Palm Oil	1	Trees
						Pinang	3	Trees
Amount							2388	Trees
Hj. Setiban	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI KUNYIT	1.3397	0.9271	Rubber	887	Trees
						Cempedak	31	Trees
						Mentawak	5	Trees
						Durian	33	Trees

**INVENTORY OF LOSSES FOR LAND
PACKAGE 5: 150 kV SANGGAU AND SEKADAU SUBSTATIONS**

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land	Affected (ha)	Name	Total	Unit
						Bamboo	3	Trees
						Pelaik	35	Trees
						Jengkol (jengkol)	13	Trees
						Longan	2	Trees
						Rambutan	18	Trees
						Local Wood	57	Trees
						Halaban	7	Trees
						Asam bawang	2	Trees
						Bitter bean	2	Trees
						Mango	20	Trees
Amount						1115		Trees
Sekadau Substation					2.2474		5956	Trees

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE	AMOUNT			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE			TYPE	S	B	Pro
1	T.01A	M. YUNUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	KAWAT	400.0	RUBBER CERUCUK PELAIK LEBAN JENGKOL	2 - - - -	1 - 1 3 -	- 2 - 5 2	
2	T.02A	SAMSUL KAMAR	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.0	PALM OIL	-	-	4	
3	T.03A	PLTBM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	CEMPEDAK PULAI CERUCUK	- - -	- 1 4	2 - -	
4	T.04A	H. MUHAMMAD YUSUF	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	PALM OIL	5	-	-	
5	T.05A	DARIUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400	PALM OIL CEMPEDAK RUBBER	6 6 1	- 1 -	- - -	
6	T.06A	DWINA SEJUM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225	RUBBER CERUCUK MEDANG UBAH	- - - 9	- - 2 2	16 4 - -	
7	T.07A	SUPIANA ROSMATI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	116.0	BAMBOO UBAH CEMPEDAK PELAIK RUBBER	- - - - 1	3 2 1 3 -	- 1 - - -	
	T.07B	RITA LASTRININGSIH	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	284.0	CERUCUK LEBAN JENGKOL PELAIK ASAM KANDIS CEMPEDAK	- - 2 3 4 6	7 9 2 3 4 1	- 5 9 - - -	
8	T.08A	YULITA LIDIA	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.0	CERUCUK LEBAN UBAH JENGKOL RUBBER ASAM KANDIS MERANTI LEBAN	- - - - - - 5	14 8 - 1 1 21	17 8 5 2 - - 8	
9	T.02	SARUM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	SAGO	-	10	-	
10	T.03	YEYEN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	ASAM KANDIS UBAH RUBBER TAMAU KEMAYAU	1 - 1 3	- 6 1 -	- - 3 -	
11	T.04A	AKIANG	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	112.5	BAMBOO RUBBER UBAH	9 1	- -	4 -	
	T.04B	SITI NURLIANA	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	112.5	RUBBER BAMBOO PELAIK SUNGKAI	4 - - 1	9 - - 1	3 3 1 -	
12	T.05	JAHER	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	ASAM KANDIS UBAH JENGKOL GAHARU	- - - 1	27	5 4 1	
13	T.06	JIHON	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH JENGKOL MEDANG TAMAU PELAIK RUBBER	- 2 3 - - -	5 - - - - -	1 1 - 1 1 3	
14	T.07	BAMBANG TWINARTO	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	BAMBOO RUBBER UBAH AREN	7 2 1	- - -	8 - -	
15	T.08	CIOK	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	RAMBUTAN TAMAU UBAH RUBBER	- - - -	4	1 1 5	
16	T.09	GEBE	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	RUBBER BAMBOO PETAI UBAH	- - - 10	1	22 1	
17	T.10	ALIMIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH	-	3	-	
18	T.11	AWI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH PELAIK	15	-	1	
19	T.12	BURHAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH MEDANG PULAI TEKAM	31 - - 35	38 1 1	3 1 1	
20	T.13	HERMAN E	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.0	PADI	1	-	-	
21	T.14	IBRAHIM SULAIMAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	RUBBER SOTOL KEMENYAN UBAH SAGO CEMPEDAK LENGKENG	7 - - - 5 - -	- - - - - - -	6 2 1 2 8 1 1	

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE	AMOUNT			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE			TYPE	S	B	Pro
22	T.15	SONGLI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH RUBBER CEMPEDAK SOTOL NANAS	9		9 6 2 2 40	
23	T.16	SALPINUS SANGKIAT	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	RUBBER UBAH TAMAU BENTAGOR	4		4 4 8	
24	T.17	NAMSUN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	MELABAN RUBBER	15	5	1	
25	T.18	DINI HANDAYANI A. P.	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER TAMAU MAMAH MERANTI TEKAM	5 9 1	2 5	9 1 1	
26	T.19	DERON	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER BAMBOO PELAIK MERANTI NYATU	15 2	8	8 6 1	
27	T.20	EPIANUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER JENGKOL	12 8		18	
28	T.21	UKA	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER UBAH PELAIK TEKAM JENGKOL LEBAN MERANTI	25 12	1	29 3 3 3 3	
29	T.22	VALERIA MOI	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	400.0					
30	T.23	YOSAFAT SAMI	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	PADI			1	
31	T.24	LUSIUS ONG	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER BAMBOO LANGSAT MENTAWAK RAMBUTAN MERANTI PELUNTAN TENGGAWANG GAHARU RAMBAI	2 3 2 1 1 2	10 2 2	5 2	
32	T.25	SILVANUS ACOM	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER DURIAN BAMBOO LANGSAT ASAM KANDIS RAMBAI MENTAWAK PELUNTAN MERANTI ENAU	10 1 2 1	2 2 3 2 1 3 2	4	
33	T.26	AMBOS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0					
34	T.27	MARTIUS SECIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER JENGKOL PETAI UBAH MERANTI BAMBOO	7 2	2 2 3 4	5	
35	T.27	KASIANUS TUTIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER UBAH MERANTI ROTAN MEDANG CEMPEDAK GAHARU ENAU LANGSAT	35 15 2 7 2 2 2	1	3 7	
36	T.29	SALIM	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER TEMAU PELAIK UBAH	12 1	4 4 5	7	
37	T.30	TONI	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	PALM OIL JENGKOL RUBBER KAYU LOKAL	10 9 5		6	
38	T.31	SIKIM	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER PELUNTAN CEMPEDAK UBAH ASAM KANDIS RAMBUTAN NANAS BAMBOO	41 7 1 5 1	15 4 4	6	

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
39	T.32	SELIPANG	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER UBAH CEMPEDAK ASAM KANDIS	27 16 1	10	
40	T.33	BETALONIUS	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	400.0	RUBBER BAMBOO KEMENYAN PALM OIL	27 4		5 1 2
41	T.34	ROMANIUS ROMA	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER UBAH JAMBU MONYET JENGKOL	42 7 1	13 2	2
42	T.35	ANTONIUS ANDI	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	DURIAN LANGSAT RAMBAI GARU RUBBER ASAM KANDIS ROTAN PELUNTAN KAYU LOKAL RAMBUTAN JAMBU JAMBU MONYET ENAU/AREN	2 10 2 3 9 1 14 17	1 2 4 1	2 6 3 1 1 2 1
43	T.36	UMMI SALAMAH	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER UBAH BAMBOO	8 12 1	1	4
44	T.37	TINUS ANEM	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.0	BAMBOO RUBBER PELAIK CEMPEDAK KEMENYAN	15 1 10	1	15 6 4
45	T.38	TORAN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	RUBBER BAMBOO JENGKOL PELAIK JAMBU MONYET MENTAWAK DURIAN	10 3 2		10 13 2 1 1
46	T39	MATIUS PAUJI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	BAMBOO RUBBER LANGSAT MENTAWAK JENGKOL DURIAN	20 1 1 1		12 1 1
47	T.40	KUNCIT	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	RUBBER PELAIK	40 1		5
48	T.41	MARTINUS JABOT	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	RUBBER MENTAWAK DURIAN LANGSAT RAMBAI KOPI	6 1 2 15		6 1 1
49	T.42	JINUS	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	RUBBER JENGKOL	11 9		7
50	T.43	MARSELUS PANGKI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	MENTAWAK RUBBER RAMBUTAN	1 2 1		
51	T.44	TONI ADI SAPUTRO	SANGGAU	BALAI	TAYAN HILIR		RUBBER JAMBU MONYET	35 14		30
52	T.45	KECIK	SANGGAU	BALAI	TAYAN HILIR	225.0	-			
53	T.46	ARIS SATRIANTO	SANGGAU	BALAI	TAYAN HILIR	400.0	RUBBER UBAH SIBAU JAMBU MONYET RAMBUTAN ASAM KANDIS TENGGAWANG	35 1 2 2 2 1		17 2 1 1
54	T.47	ADI DARMAWAN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	BAMBOO KEMENYAN MENTAWAK RUBBER KAYU LOKAL	- - - -	1 1 1 5	- - - -
55	T.48	ADI DARMAWAN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	BAMBOO RUBBER		3	3
56	T.49	MOSES	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER KAYU LOKAL LEBAN		3 5 1	
57	T.50	LEONARDUS	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	1		
58	T.51	PAEL	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	1		
59	T.52	KRISTINA SERIMI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0		-	-	-

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
60	T.53	MARIA MINA	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	-	7
61	T.54	GH GUENG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0		-	-	-
62	T.55	ANTONIUS JATI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	-	15
63	T.56	ANARIAS ATEK	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0		-	-	-
64	T.57	ANTONIUS MINAR TULAI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	15	5
							KAYU LOKAL	-	2	-
							CEMPEDAK	-	-	1
65	T.58	YOHANES JAMES	SANGGAU	BALAI	KEBADU	400.0	CEMPEDAK	1	-	-
							KAYU LOKAL	-	2	-
							RUBBER	-	2	7
							PELAIK	-	1	-
							BAMBOO	-	-	4
66	T.59	RUPINUS TULUI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	ASAM KANDIS	-	-	1
							KEMENYAN	-	1	-
							PELAIK	-	1	-
							CEMPEDAK	-	-	1
							RUBBER	-	-	5
							KAYU LOKAL	-	5	-
							MANGGIS	-	1	-
							MEDANG	-	1	-
							ASAM BACANG	-	1	-
							ASAM GANDARIA	-	1	-
							BAMBOO	-	-	5
67	T.60	LEONARDUS APOY	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	1	-	-
68	T.61	LEONARDUS APOY	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0		-	-	-
69	T.62	EDVARDUS KUNCANG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	4	-	-
							BAMBOO	-	-	5
							JENKOL	-	1	-
							PELAIK	1	-	-
70	T.63	KAREM	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	-	5
							TEMAU	-	8	-
71	T.64	SABINUS KANCUNG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	-	6
							JENKOL	-	2	-
72	T.65	PETRUS AMAK	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	KAYU LOKAL	-	-	10
73	T.66	SUHARDI CICI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	-	-	1
74	T.67	SIMPA	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	-	-	1
75	T.68	ANTON	SANGGAU	BALAI	KEBADU	400.0	RUBBER	11	-	10
							TEMAU	-	5	-
							KAYU LOKAL	-	3	-
76	T.69	NYAEN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	180.0	RUBBER	10	2	12
							CEMPEDAK	4	-	-
77	T.69	HERKULANUS LUKU	SANGGAU	BALAI	KEBADU	45.0	BAMBOO	-	1	-
							RUBBER	5	-	5
78	T.70	RUPINUS RANGKENG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	190.6	RUBBER	14	5	1
							CEMPEDAK	2	-	1
							KAYU LOKAL	-	1	-
							MEDANG	-	3	-
79	T.71	KANISIUS JAHER	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	1	1	7
							ASAM KANDIS	-	-	1
							CERUCUK	-	-	7
80	T.72	STEFANUS KENEN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	-	-	1
81	T.73A	BAMBANG IRAWAN/ FALIAANT	SANGGAU	BALAI	KEBADU	216.8	RUBBER	39	19	11
							KAYU LOKAL	-	1	-
							UBAH	-	1	-
							JAMBU MONYET	-	-	3
	T.73B	BAMBANG IRAWAN/ FALIAANT	SANGGAU	BALAI	KEBADU	8.3	RUBBER	-	-	1
82	T.74	SUKIMIN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	400.0	PADI	-	1	-
							PALM OIL	-	-	1
83	T.75	A'ON	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	BAMBOO	-	2	-
							PALM OIL	-	-	1
							RUBBER	16	-	2
							CEMPEDAK	1	-	-
							KAYU LOKAL	-	4	-
							KEMENYAN	1	-	-
84	T.76	FIRMINUS SIONG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PALM OIL	-	-	3
85	T.77	LANTANG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	KAYU LOKAL	-	4	-
							UBAH	42	-	-
							RUBBER	12	-	-
							JENKOL	3	-	-
							KELENGKENG	-	-	4
86	T.78	ROMANUS KUSA	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	BAMBOO	3	1	-
							LEBAN	5	-	-
							PALM OIL	1	-	-
							RUBBER	3	-	-
							KAYU LOKAL	-	1	-

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
87	T.79	PETRUS ACAN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	-	1	-
88	T.80	DARTO SUKANYANGKO	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	225.0	RUBBER BENTANGOR	8	14	9
89	T.81	YOHANES ASE	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	225.0	RUBBER BENTANGOR UBAH	8	50	
90	T.82	GUNIK	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	225.0	RUBBER KELANDAN/MEDANG BENTANGOR	10	10	2
91	T.83A	HERKUNALANUS UJI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	202.5	RUBBER CEMPEDAK	-	-	1
	T.83B	ADRIANUS YAYUK	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	22.5	RUBBER MENTAWAK	6	3	1
92	T.84	ANDRIANUS YAYUK	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	225.0	RUBBER	23	24	8
							TENGKAWANG	1	-	-
93	T.85	PIUS PIANTO JAWI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	225.0	MEDANG	12	-	-
							BAMBOO	-	4	-
							ENAU	5	-	-
							RUBBER	2	2	2
							PETAJ	1	-	-
							PELUNTAN	-	2	-
							CEMPEDAK	-	-	1
							KAYU LOKAL	-	3	-
							BAMBOO	12	-	1
							ROTAN	-	-	1
94	T.86	RIGU	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	225.0	JAMBU MONYET	2	-	-
							RUBBER	19	10	-
							BAMBOO	5	-	-
							KAYU LOKAL	-	3	-
95	T.87	YULIUS	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	225.0	JENGKOL	-	5	-
							LEBAN	-	24	-
							RUBBER	8	-	-
96	T.88	ALISIUS ENYER	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	400.0	BAMBOO	30	-	-
							JAMBU MONYET	2	-	-
97	T.89	SUKARDI B	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	225.0	RUBBER	9	-	-
							BAMBOO	10	-	-
98	T.90A	CINIYUS	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	200.0	JENGKOL	12	-	-
	T.90B	YAKOBUS ACUN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG TABA	200.0	RUBBER	9	7	7
99	T.91	BASUKI	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	KAYU LOKAL	-	1	1
							UBAH	-	-	-
100	T.92	SELENG	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	LEBAN	-	1	-
							ROTAN	-	-	7
101	T.93	KALISTUS LANDONG	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	BAMBOO	5	-	-
							BAMBOO	5	7	-
102	T.94	SURIADI LITU	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	UBAH	-	-	2
							LEBAN	-	1	-
103	T.95	SURIADI LITU	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	ROTAN	-	-	7
							PALM OIL	-	-	6
104	T.96	NIMROT SIMANUNGKALIT	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	CERUCUK	-	-	30
							RUBBER	-	-	15
105	T.97	NIMROT SIMANUNGKALIT	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	PALM OIL	-	-	6
							BAMBOO	-	-	5
106	T.98	LATEN	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	CERUCUK	-	-	30
							RUBBER	-	-	15
107	T.99	ABIN	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	PALM OIL	-	-	6
							RUBBER	1	-	1
108	T.99	ABIN	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	TAMAU	-	-	1
							CERUCUK	-	-	9
109	T.99	ABIN	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	BAMBOO	-	-	2
							BAMBOO	-	-	2

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
108	T.100	STIYO BUDI	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	400.0	RUBBER	-	-	22
							CERUCUK	-	-	15
							BAMBOO	-	-	12
							TAMAU	-	-	1
							ASAM KANDIS	-	-	1
							PELUNTAN	-	-	1
109	T.101	LING LISMAN	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	PADI	-	-	1
	T.102	ANES	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	RUBBER	-	-	3
							BAMBOO	-	-	5
							CERUCUK	-	-	5
110	T.103	SIMSON	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	PALM OIL	-	-	5
111	T.104	ANES	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	CERUCUK	-	-	28
							MENTAWAK	-	-	1
							TAMAU	-	-	1
112	T.105	AJINIMIN	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	CERUCUK	-	-	14
							BAMBOO	-	-	3
							RUBBER	-	-	16
							MEDANG	-	-	1
113	T.106	TONO	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	PALM OIL	-	-	4
114	T.107	STEPANUS APUK	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	400.0	RUBBER	-	-	11
115	T.108	PT EVITA AGRO LESTARI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	11
116	T.109	PT EVITA AGRO LESTARI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	11
117	T.110	PT EVITA AGRO LESTARI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	3
118	T.111	DEDY CANDRA ALENGSIUS	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	RUBBER	-	2	10
							BENTANGOR	-	-	1
119	T.112	ASENG	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	400.0	RUBBER	-	-	30
							PETAJ	3	-	-
120	T.113	NIKODEMUS JUIN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PADI	-	-	1
121	T.114	LINDUNG PARULIAN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	2	-
							JENKOL	1	-	-
122	T.115	KIT SEN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	5	-
							ASAM BACANG	-	-	4
							RAMBUTAN	-	-	4
							PELUNTAN	-	2	-
							DURIAN	-	1	1
123	T.116	JAU JAN SEN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	400.0	PALM OIL	-	4	-
							RUBBER	-	3	-
124	T.117	HIU ON KIM	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	RUBBER	-	-	10
							MEDANG	-	10	-
							PALM OIL	-	-	1
125	T.118	STEVANUS MARTADI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	8
126	T.119	YA'SABIRIN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	400.0	RUBBER	5	7	9
							POHON HUTAN	-	-	3
							MERANTI	5	1	-
							ASAM KANDIS	-	3	2
							Leban	-	-	-
							MEDANG	1	-	-
							UBAH	1	-	-
							RAMBUTAN	-	1	-
127	T.120	TAM MISBAR	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	RUBBER	-	-	15
							CERUCUK	-	-	20
128	T.121	TANAH PEMDA SANGGAU	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	-	-	-	-
129	T.122	RUSMAYADI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	4
130	T.123A	ROSDIANA	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	62.3	RUBBER	2	6	2
							PINANG	-	-	1
	T.123B	MARIA SEPVILANA	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	162.8	PALM OIL	-	-	2
131	T.124A	JAMIAN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	155.3	RUBBER	5	5	10
							DURIAN	-	1	-
							PELAIK	-	-	1
	T.124B	ZULKIFLI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	69.8	RUBBER	6	-	2
							DURIAN	-	1	-
132	T.125	ADRIANUS PEKMENG	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	SAGO	-	-	10
133	T.126A	YOHANES ENGGO	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	112.5	Leban	-	-	10
							CERUCUK	-	37	-
							UBAH	6	-	-
	T.126B	M.B GINING	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	112.5	RUBBER	2	4	1
134	T.27A	SITUNG	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	204.0	RUBBER	6	-	-
	127B	TIMON	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	21.0	RUBBER	4	-	3
							MEDANG	-	-	1
135	T.128	SULAH	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	RUBBER	-	6	11
							MEDANG	-	-	3
							PELUNTAN	-	-	4
							CERUCUK	-	-	15
136	T.129	RUPINA TUI	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	400.0	RUBBER	-	-	4
							MEDANG	-	-	5
							PELUNTAN	-	-	7
							CERUCUK	-	-	9

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
137	T.130	SURATNO	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	JENGKOL CERUCUK PALM OIL			1 15 -
138	T.131	AHUI	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	DURIAN RUBBER	1 6	- -	- 6
139	T.132	MARTHA LINA	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	RUBBER CERUCUK	8 -	- -	1 20
140	T.133	MARTINUS SINDENG	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	RUBBER CERUCUK	- -	- -	4 20
141	T.134	PAULUS SANDING	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	PALM OIL	-	-	3
142	T.135A	CAHAYA	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	120.6	DURIAN RUBBER CEMPEDAK NYATU GAHARU	1 3 3 1	3 12 1 -	6 1 - -
	135B	ASTARIUS SARIMIN	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	104.4	PADI	-	-	1
143	T.136	PETRUS DANI	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	CERUCUK	-	-	30
144	T.137	VINSESNIUS SOKIN	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	CERUCUK	-	-	37
145	T.138	YOHANES ANES	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	RUBBER CERUCUK	- -	- -	16 22
146	T.139	PTPN XIII	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	400.0	PALM OIL	-	-	9
147	T.140	PTPN XIII	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	PALM OIL	-	-	4
148	T.141	BUDI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	6
149	T.142	STEFANUS ANYAM	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	6
150	T.143	STANILAUS ATUI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	RUBBER PALM OIL BAMBOO	- 2 -	- -	2 - 3
151	T.144	TUI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	4	-	-
152	T.145	KALISTANIK	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	RUBBER TENGKAWANG NYATU RAMBAI ASAM KANDIS	- - - - -	1 8 1 1 1	3 - - - -
153	T.146	MATIUS AGU	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	6
154	T.147	STANILAUS ATUI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0		-	-	-
155	T.148	BRUNO	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	400.0	PALM OIL	-	-	9
156	T.149	YULIA WIDYAWATI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI		JENGKOL	-	-	1
157	T.150	YULIA WIDYAWATI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	4
158	T.151	ELISABET NILA	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0 225.0	RUBBER RUBBER MEDANG	8 -	- 1 -	- 1 1
159	T.152	ELISABET NILA	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	RUBBER	-	-	9
160	T.153	ELISABET ELIS	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	SAGO	-	-	1
161	T.154	ROSA	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0		-	-	-
162	T.155	LUSIA	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	5
163	T.156	JHON BERNADUS BUNGKUI	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	PELUNTAN BAMBOO	- -	- 2	6 -
164	T.157	PARIS ARIS	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	RUBBER PELUNTAN	- -	- 2	14 -
165	T.158	HERKULANUS MOSES	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	MEDANG	-	-	3
166	T.159	PETRUS PULEN	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	400.0	PALM OIL	4	-	-
167	T.160	BERNADUS KOPUT	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	BAMBOO	-	-	5
168	T.161	BERNADUS KOPUT	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	KEMENYAN KEMPAS RUBBER	- - -	- 2 -	- - 4
169	T.162	SABINUS AHI	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	TEKAM PUDU RUBBER MEDANG	- - - -	- 3 6 -	1 - - 1
170	T.163	RITA ROSANTI	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	JELUTUNG SAGO	- -	- 1	- -
171	T.164	MARTA	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0		-	-	-
172	T.165	ADRIYANUS SUDI	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0		-	-	-
173	T.166	SIMPLISIANUS	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	400.0	PALM OIL	-	-	5
174	T.167	NIKOLAUS MARDIUS UCOK	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	RUBBER	-	-	9
175	T.168	DOMINIKUS	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0		-	-	-
176	T.169	DARWIN LUKAS	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	PADI	-	-	1
177	T.170	DONATUS DONY	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	PALM OIL	-	-	9
178	T.171	CION ALEXANDER SH	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	PALM OIL	-	-	6
179	T.172	MUSA SUBERKAH/ROSA	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	RUBBER UBAH MEDANG PELUNTAN CERUCUK	77 8 1 -	13 2 - 2 -	17 - - - 2
180	T.173	IGNASIUS	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	LEBAN UBAH CERUCUK	- - -	- 7 7	4 - -
181	T.174	VERONIKA	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	4
182	T.175	SERATINA SIMAH	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	4

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE	AMOUNT			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE			TYPE	S	B	Pro
183	T.176A	ROYMUNDUS RONI	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	200.0	PALM OIL	-	1	-	2
	T.176B	SIMON	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	200.0	PALM OIL	-	-	-	4
184	T.177	R. AMS. ASIU KS	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	400.0	PALM OIL	-	-	-	5
185	T.178	THERESIA AROL	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	400.0	PALM OIL	-	-	-	5
186	T.179A	YULIA SIAT TJU	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	192.0	PALM OIL	-	-	-	4
	T.179B	THOMAS TINJAU	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	33.0	PALM OIL UBAH	-	1	-	-
187	T.180A	SABINUS SUDIN	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	112.5	PALM OIL	-	-	-	3
	T.180B	JULIANUS PAUL	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	112.5	PALM OIL	-	-	-	3
188	T.181	SERENUS	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PADI JAGUNG PALM OIL	1 1 2	- - -	- - -	- - -
189	T.182	YAKOBUS	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	RUBBER	20	-	15	10
							MEDANG	1	-	-	1
							CEMPEDAK	2	-	-	3
							UBAH	3	-	1	-
							LEBAN	-	-	5	-
							CERUCUK	-	-	17	-
PELUNTAN	6	-	1	-							
190	T.183	HIYASINTUS INJIN	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	5	-	-	4
							PELAIK	1	-	-	-
191	T.184	MARSELANUS RUBIN	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL MEDANG	- 1	- -	- -	5
192	T.185	YULIUS S.Sos	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	TENGKAWANG	-	1	-	-
193	T.186	DANIEL BUNGSU	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	400.0	PALM OIL	-	-	-	5
194	T.187	FRANS WELLI GUNTUR	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
195	T.188	PRIYANTO YULIANUS SANDR	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL BAMBOO	- 2	- -	- -	11
196	T.189	BUDI MULYADI	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
197	T.190	PETRONILA	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
198	T.191	KURBINUS PRASELLA	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	BAMBOO	-	-	-	4
							JAMBU MONYET	1	-	-	-
							MERANTI	2	-	2	-
							UBAH	3	-	-	1
							CERUCUK	-	-	-	12
							KAYU LOKAL	-	-	2	-
							PINANG	-	-	-	4
							RUBBER	5	-	3	-
							ASAM KANDIS	1	-	-	-
							MENTAWAK	-	-	1	-
199	T.192	DENI SISWANTO	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	CEMPEDAK	-	-	-	1
200	T.193	PETRUS SUNAR	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	RUBBER	-	-	10	-
201	T.194	AGUS PE	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	RUBBER	-	-	16	-
202	T.195	STEPHANUS ATANG	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	RUBBER	22	-	6	10
							UBAH	9	-	-	-
							PELAIK	1	-	-	-
							MENTAWAK	1	-	-	-
							CERUCUK	-	-	-	1
203	T.196	SABINUS BUNG	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	PALM OIL	-	-	-	7
204	T.197	BAMBANG	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
205	T.198	BUDI MULYADI	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	PALM OIL	-	-	-	4
206	T.199	YULIANUS ANUS	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	MENTAWAK	-	-	-	1
207	T.200	TANAH ADAT (A.N AMON)	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	400.0	KAYU LOKAL	-	-	-	17
208	T.201	TANAH ADAT (A.N AMON)	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	PADI	-	-	-	1
209	T.202	ANASTASIA SAJE	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	RUBBER	-	-	-	18
210	T.203	YOHANES LION.CB	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	RUBBER	-	-	-	20
211	T.204	PAULA DOLEN	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	RUBBER	15	-	-	10
							ASAM KANDIS	-	-	-	3
							ASAM GANDARIA	-	-	-	1
							KERANJI	-	-	-	1
							PELUNTAN	-	-	-	1
							ROTAN MARAU	-	-	-	1
212	T.205	GADUS	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	400.0	BAMBOO	-	-	-	5
							PEKAWAI	-	-	-	3
							RUBBER	20	-	2	10
							UBAH	-	-	-	3
							DURIAN	-	-	-	1
213	T.206	SOFIA LILIS	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	-	-	-	-	
214	T.207	LUSIA	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	RUBBER	15	-	-	9
215	T.208	PT AGRISENTRA LESTARI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
216	T.209	SABRADUS IDUS	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	BAMBOO	-	-	-	2
							RUBBER	-	-	-	7
							DURIAN	2	-	-	-
							UBAH	10	-	-	-
							MELABAN	-	-	1	-

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE	AMOUNT			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE			TYPE	S	B	Pro
217	T.210	MARKUS	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	JENGKOL BAMBOO PELUNTAN RUBBER	- - 1 3	2 - - 2	- 2 2	
218	T.211	PT AGRISENTRA LESTARI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE		PALM OIL			5	
219	T.212	HERMANUS HERI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	BAMBOO RUBBER	- 10	- -	- 8	
220	T.213	SUSANA NETI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	BAMBOO RUBBER	- 15	- -	12 3	
221	T.214	PT AGRISENTRA LESTARI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE		PALM OIL			4	
222	T.215	BASIR AHMAD	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	PALM OIL	-	-	2	
223	T.216R	AKI	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	400.0	TENGKAWANG CEMPEDAK RAMBUTAN LEBAN BAMBOO RUBBER CERUCUK	- - - - - - -	- - - - - - -	4 5 2 1 1 10 20	
224	T.04R	EDY SETIAWAN	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	RUBBER	4	-	20	
225	T.05R	ELIANA MARIA	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	RUBBER JELUTUNG PALM OIL DURIAN	- - 4 -	- - - -	1 - - 4	
226	T.06	P.SIMON	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	UBAH KERANJIK NYATU PINGAN CERUCUK	- - - - -	- - - - 15	1 1 7 1 -	
227	T.07	SUBARDI	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	LANGSAT MENTAWAK RUBBER TAMPUI CERUCUK	- - - - -	- - - - -	5 1 9 1 10	
228	T.08	NASARIUS YUS	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	PALM OIL	-	-	7	
229	T.09	KONSINYASI	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	-	-	-	-	
230	T.10	AMI	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	400.0	RUBBER	1	11	-	
231	T.11	KOTIJAN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	PALM OIL			5	
232	T.12	LAUDIS LAUS	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-				
233	T.13	MARIEL MARBUN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	AKASIA	5	5		
234	T.13	H. RACHMAD HADI SISWANTO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	-				
235	T.14 R	RUDI SUSANTO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	-				
236	T.14AR	ALISIUS	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	PALM OIL RUBBER	5 2	- -	- -	
237	T.14R/ T.15	LIDIA LENI	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	RUBBER TENGKAWANG EMPIANG KAYU REDAN KAYU REMBULAN	25 - - - -	- - - 1 1	22 2 2 - -	
TOTAL						59,090.63		1,814	1,063	2,041	

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 7: TL 150 kV SANGGAU - SEKADAU**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
1	T.16AR	SOLISMAN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	182.0	CERUCUK	21	-	-
	T.16AR	TONEL	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	218.0	RUBBER	8	-	2
2	T.16R/ T.16	RUSANDI JANG	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	13	-	10
							RAMBUTAN	-	-	1
3	T.17	DISON	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	5	-	5
4	T.18	S.SUKAMTO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-
5	T.19	KARONO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	-	-	15
6	T.20	ANTYMUS NASIR	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-
7	T.21	SURYANSAH	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-
8	T.22	SAMUEL MARWAN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-
9	T.23	ATMAH	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-
10	T.24	Drs SOSIMUS YUTO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	-	-	7
							PETAJ	-	-	1
							MANGGA	-	-	2
							KEMIRI	-	-	1
11	T.25	SAMEON MARDY	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	RUBBER	5	-	-
12	T.26	LUKAS GUNAWAN	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	RUBBER	-	7	8
							UBAH	5	-	-
							JENGKOL	-	-	1
13	T.27	WELLEM SUHERMAN	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	CEMPEDAK	-	-	1
							RAMBUTAN	2	-	-
							UBAH	-	1	-
							POHON HUTAN	-	5	-
							PINGGAN	-	1	-
14	T.28	M. SAIDI	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	RUBBER	-	20	16
							UBAH	-	-	1
15	T.29	ARIESTONNEDY	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	ARANG	-	-	25
16	T.30	BONG KUNG SONG	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	KAYU HUTAN	-	5	-
17	T.31	BONG KUNG SONG	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	POHON NYANYUK	5	-	6
							CERUCUK	-	10	-
18	T.32	KADERI	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	RUBBER	25	-	3
							GAHARU	-	-	2
							POHON NYANYUK	-	-	2
							PETAJ	-	-	2
19	T.33	JUBAIDAH	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	-	-	5
20	T.34A	HERMAN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	112.5	RUBBER	-	-	7
	T.34B	AHMAD DAPID	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	112.5	RUBBER	-	-	7
21	T.35	BUDI	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-
22	T.36	BUDI	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	KAYU HUTAN	-	-	10
23	T.37	ACHYAR	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	10	-	-
24	T.38	DENI	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	225.0	PALM OIL	-	-	3
25	T.39	LUKAS GUNAWAN	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	225.0	PALM OIL	-	-	3
26	T.40	LUKAS GUNAWAN	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	400.0	PALM OIL	-	-	3
27	T.41	LUKAS GUNAWAN	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	225.0	PALM OIL	-	-	4
28	T.42	MISLI	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	225.0	PALM OIL	-	-	3
29	T.43	ALIMAN LORINA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	3
30	T.44	ALIYAS	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	3
31	T.45	BUDI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	3
32	T.46	PAUJAN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	8	-
							PALM OIL	-	-	1
33	T.47	RATENA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	4
							JENGKOL	-	-	1
34	T.48A	HASBAR	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	112.5	PALM OIL	-	-	2
	T.48B	SAMSI AH	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	112.5	RUBBER	-	14	-
							CEMPEDAK	-	-	1
35	T.49	BAHTIAR	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	UBAH	-	-	2
							NYATOK	3	-	-
							RUBBER	-	6	1
							TENGKAWANG	-	-	1
36	T.50	ZAINUDIN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	2	-	2
37	T.51	CINTA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	2
38	T.52	ABANG TIYA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	400.0	PALM OIL	-	-	2
39	T.53	ACENG MUSTOLIH	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	4
	T.53	JUNAIDI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	112.5	-	-	-	-
40	T.54	ZULKARNAIN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	18	-
							UBAH	-	-	2
41	T.55	AMINAH	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	2	-	4
							RAMBAL	-	2	-
42	T.56	RAJELI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	13	9
							RAMBAL	-	-	2
							UBAH	-	-	3
43	T.57	JAENUDIN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	-	2
44	T.58	LIM LINA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	4	3
45	T.59	SUSANTO	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PISANG	-	-	23
							COKLAT	-	-	1
46	T.60	DEKON PRISNADI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	-	-	-	-
47	T.61	MUHJIZIN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	2
48	T.62	KONSINYASI/SAHBRI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	400.0	PALM OIL	-	3	-
							RUBBER	-	-	14
49	T.63	JONI	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	-	-	-	-
50	T.64	SUPRIYADI	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	TAMAU	-	5	-
							CERUCUK	-	5	-
							KAJANG	-	2	-
							MALABIDAN	-	2	-
							RUBBER	1	-	1

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 7: TL 150 KV SANGGAU - SEKADAU**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE				
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT			
								S	B	Pro	
51	T.65	AGUSYANTO	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	PELAIK RUBBER GAHARU CEMPEDAK DURIAN NYATOK	- - 2 - - 3	1 - 1 - - -	- - - 1 1 -	31
52	T.66	ANONG	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	MERANTI RUBBER UBAH LENGKENG COKLAT MANGGIS	- 3 - - - -	- - 2 4 - 8 -	- - - - - - 1	2 5 5 1 - 1
53	T.67	AYUP	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	PALM OIL RUBBER RAMBAI	- - 1	- - 5	- - -	5
54	T.68	SUPRAYETNO	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	RAMBAI RUBBER	- -	- 3	- -	1 7
55	T.69	AYUP	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	MEDANG RUBBER	- -	1 3	- -	-
56	T.70	LILI SURAINI	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	RUBBER KEMENYAN UBAH MEDANG	- - - -	- 1 2 1	- - - -	15
57	T.71	ABAN SUNARTO	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	KEMINTING	-	-	-	1
58	T.72	PERAYITNO	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	400.0	PALM OIL	-	-	-	4
59	T.73	JAWI	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	PALM OIL RUBBER	- 18	- -	- -	5
60	T.74	PT MPE	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	RUBBER PALM OIL	- -	- 20	- -	5
61	T.75	PT MPE	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
62	T.76	PT MPE	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
63	T.77	PT MPE	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	7
64	T.78	RUPINA NA	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	400.0	-	-	-	-	-
65	T.79	ANTONIUS ANYIU HARDI	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	RUBBER LEBAN PELAIK	- - -	3 - 2	7 2 -	4
66	T.80	ANTONIUS ANYIU HARDI	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	-	-	-	-	-
67	T.81	MARO LIKAS SIMO	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
	T.82	KRISTINA SUYAH	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	RUBBER MEDANG CERUCUK BINGIR	- - - -	3 - 7 5	4 1 - -	2
68	T.83	MIKAEL AHEN	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	7
69	T.84	APUI.Y	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	RUBBER UBAH	- -	- 2	- 5	-
70	T.85	ALAUZIUS ASIP	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	RUBBER	-	5	-	1
71	T.86	RUPINA NA	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	-	-	-	-	-
72	T.87	ABANG JAPAR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	-	-	-	-	-
73	T.88	RAPEAH	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	400.0	RUBBER	5	12	5	5
74	T.89	DAYANG SA'DAH	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	3	4	12	12
75	T.90	AB RAMSYAH	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	6	-	-	6
76	T.91	WAHAB	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER PELAIK	1 1	- -	- -	-
77	T.92	AB SABRAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	-	-	-	-	-
78	T.93	ABANG AHMADI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	2	6	2	2
79	T.94	FEDERIKA FENNY ERLIANTI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER PELAIK	- -	1 4	- -	-
80	T.95	HERMAN SALEH	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	400.0	RUBBER RAMBUTAN DURIAN LEBAN	- - 1 -	- 2 - 5	- 3 - -	3
81	T.96	ABANG AYANDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	5	7	13	13
82	T.97	APUK	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	-	5	7	7
83	T.98	APUK	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
84	T.99	HORAS PARNINGOTAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	PALM OIL	-	-	-	10
85	T.101	JAHRA	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	5	-	7	7
86	T.102	SYAIDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	-	-	-	-	-
87	T.103	PETRUS AJIU	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	-	-	-	-	-
88	T.104	SAHSUBARMAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	10	2	4	4
89	T.105	SIMON PETRUS	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	400.0	-	-	-	-	-
90	T.106	SIMON PETRUS	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RAMBUTAN PELAIK CERUCUK	- 5 -	8 2 3	- - -	-
91	T.107	AGUSTINUS ALAK	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	-	-	-	-	-
92	T.108	VICENSIVS DEDI SETIAWAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	RUBBER	-	-	-	20
93	T.109	FX MARSUDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	RUBBER	-	-	-	20
94	T.110	DIDIMUS	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	PALM OIL	6	-	-	-
95	T.111	SANUSI M. TARMO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	PALM OIL	8	10	-	-
96	T.112A	TJIN MIN ON	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	93.0	GAHARU	-	14	-	-
	T.112B	ANTONIUS	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	307.0	PALM OIL	4	-	-	-
97	T.113	YUSTINUS LITEN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	RUBBER	-	-	-	20
98	T.114	LUCIA GABRIELLA	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	RUBBER CERUCUK MEDANG	- - -	1 - -	- - -	10 10
99	T.115	PETRUS AKEP	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	PALM OIL	-	-	-	8
100	T.116	AGUSTINUS DOLAR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	PALM OIL	4	-	-	-
101	T.117	AB. BAHTIAR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	RUBBER	-	4	-	-

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 7: TL 150 KV SANGGAU - SEKADAU**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
102	T.118	JUNAIDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	PALM OIL	-	-	3
103	T.119	EPENIUS JELIO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	RUBBER	-	10	-
104	T.120	SANUSI M. TARMO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	PALM OIL	-	-	4
105	T.121	SANUSI M. TARMO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	PALM OIL	2	-	-
106	T.131 R A	FINCENCIUS HARDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	196.0	CEMPEDAK	3	-	-
							LEBAN	10	3	-
							MAHANG	2	1	-
							CERUCUK	10	-	-
							RUBBER	5	-	-
	T.131 R B	YACOBUS SUMADI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	29.0	LEBAN	1	-	-
107	T.132 R	TOSIUS SATOR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	-	-	-	-
108	T.133R	KRISTINA KAMELIA	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	RUBBER	2	7	9
							KAYU LOKAL	-	-	6
							LEBAN	-	-	2
							RAMBUTAN	1	-	-
109	T.135R	ABANG ARIFIN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	RUBBER	16	5	-
							KAYU LOKAL	-	8	1
							JENGKOL	-	-	1
							CERUCUK	2	-	-
110	T.138R	MASSOOD	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	-	-	-	-
111	T.140R	TJAU PO PIN AL SUKIANTO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	225.0	BAMBOO	1	-	-
							LEBAN	4	-	-
112	T.141R	AKUP	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	400.0	LEBAN	-	2	-
							RUBBER	43	-	6
							KAYU LOKAL	-	6	3
							CERUCUK	3	-	-
							MAHANG	-	1	-
113	T.142R	INTAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	225.0	RUBBER	54	10	10
							PELAIK	2	-	-
							KAYU LOKAL	-	8	-
114	T.143R A	THOMASDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	174.0	RUBBER	5	2	-
							PELAIK	4	-	-
							CERUCUK	-	7	-
							KAYU LOKAL	-	17	1
	T.143R B	RAMLI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	51.0	RUBBER	3	11	-
							KAYU LOKAL	-	9	-
							MAHANG	4	-	-
							PELAIK	1	-	-
115	T.144R	SANI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	225.0	RUBBER	-	-	1
							DURIAN	-	1	-
							RAMBUTAN	-	-	1
116	T.145R	H MASRAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	400.0	RUBBER	42	9	7
							CERUCUK	20	7	-
							MEDANG	-	-	2
							KAYU LOKAL	3	6	2
117	T.146R	DAYANG ROSMINI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	225.0	CERUCUK	47	-	-
							PELAIK	9	-	-
118	T.147R	ABANG RAMLI II	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	75.0	LEBAN	2	-	-
							PELAIK	1	-	-
							CERUCUK	-	13	-
119	T.147R	HERMANTO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	37.5	-	-	-	-
	T.147R	ABANG ZUBIR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	112.5	-	-	-	-
TOTAL						29162.5		511	456	607

Appendix 24 Ngudas ceremony Documentations

Documentation of Indigenous People Customary Activities (*Ngudas Ceremony*)

A. Sanggau District

Makkawing Village



Kebadu Village



Cempedak Village



Tebang Benua Village



Sei Mawang Village



Menyabo Village



Senyabang Village



Sosok Village



Sebara Village



Temiang Taba Village



Lape Village



Pusat Damai Village



Suka Gerundi Village



Sebara Village



Pusat Damai Village



Recently Ngudas held at Sanggau District

Sungai Mawang Village, August 2019



Kawat Village, October 2019



Sebbara, December 2019



B. Sekadau District

Ensalang Village



Peniti Village

